

I 14 ANNI DEL
PIANO
INACASA

APRILE 1949-MARZO 1963

I 14 ANNI DEL PIANO INACASA

APRILE 1949-MARZO 1963

QUESTO libro è inviato in omaggio dagli Organi deliberanti del Piano INACASA, i quali hanno ritenuto di presentarlo senza citare nel testo i nomi dei componenti il Comitato di attuazione ed il Consiglio direttivo, e di quanti altri ebbero il compito di realizzare il grande programma; e ciò perché il Piano è un'opera alla quale hanno concorso non solo i lavoratori ed i datori di lavoro col loro contributo, ma un grande numero di Enti nazionali e locali, di Amministrazioni, di tecnici, Uffici, Commissioni ed organismi periferici, che ricevevano dal centro stimolo e direttive, ed a loro volta fornivano il contributo correttivo della propria continua esperienza. Perciò i risultati del FINACASA sono opera di tutti, ed il merito del successo del Piano dev'essere attribuito a tutti coloro che vi hanno fattivamente collaborato.

PRIMA ancora di valutarne i risultati pratici e di misurare vantaggi individuali e collettivi da esso conseguiti, il Piano dev'essere ricordato per il suo spirito informatore e, per il significato del suo intervento nella società attuale, per quell'ideale di umana solidarietà e di sociale giustizia dal quale discendono le sue disposizioni fondamentali. Il lavoratore occupato ed il datore di lavoro sono infatti tassati a favore del disoccupato, ed il complesso di tali proventi, col

COMITATO CENTRALE
PROGRAMMA DECENNALE
CASE LAVORATORI

Prof. Arch. RAFFAELLO PAGNONI
Via Marsilio Ficino, 19

FIRENZE

I 14 ANNI DEL PIANO INACASA

a cura di Luigi Beretta Anguissola

STADERINI EDITORE • ROMA

PAG.	XI	Premessa: profilo di un Piano Sociale
------	----	--

La macchina del Piano

1	1. Gli obiettivi
10	2. La struttura organizzativa
21	3. Caratteri della programmazione
29	4. I risultati

La costruzione degli alloggi e dei complessi edilizi

55	1. I criteri di costruzione
69	2. Scelta e acquisizione delle aree
79	3. La progettazione
87	4. I costi

I diretti beneficiari del Piano

105	1. Sviluppo dei metodi per l'assegnazione degli alloggi
112	2. Un nuovo tipo di amministrazione degli alloggi
118	3. I problemi delle nuove comunità e il Servizio Sociale

L'INACASA in cifre

V	139	Dai programmi all'attuazione dei piani
---	-----	--

Il volto delle nuove case

Documentazione sulla progettazione architettonica ed urbanistica dell'INACASA

PAG. 169	1. Presentazione
172	2. Esempi di complessi residenziali
286	3. Esempi di unità di abitazione
350	4. Esempi di nuclei ed unità edilizie

Modalità, procedure ed organizzazione dell'INACASA

PAG. 399	1. I piani tecnico-finanziari dei due Settenni e i piani annuali di ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale
402	2. Analisi dei compiti esecutivi e del relativo grado di decentramento
406	3. Disposizioni relative ai criteri di costruzione e ai costi massimi per vano; schemi e suggerimenti per la progettazione
415	4. Modalità relative alla fase di costruzione
419	5. Le costruzioni aziendali
421	6. Il piano Aggiuntivo
423	7. Modalità seguite per l'assegnazione degli alloggi
429	8. Modalità relative all'amministrazione degli alloggi; ricorsi degli assegnatari al Comitato
439	9. Elementi sul fabbisogno di servizi collettivi nei quartieri residenziali
451	10. L'organizzazione del Servizio Sociale

VI

PAG. 455

Fonti legislative

Leggi:

28 febbraio 1949, n. 43 (G.U. n. 54 del 7 marzo 1949)
25 luglio 1952, n. 949 art. 74 (G.U. 174 del 29 luglio 1952)
2 agosto 1952, n. 1084 (G.U. n. 194 del 22 agosto 1952)
26 novembre 1955, n. 1148 (G.U. n. 284 del 10 dicembre 1955)
24 gennaio 1958, n. 19 (G.U. n. 39 del 14 febbraio 1958)

Norme integrative:

D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340 (G.U. n. 150 del 4 luglio 1949)
D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265 (G.U. n. 295 del 21 novembre 1956)
D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (G.U. n. 38 del 14 febbraio 1959)

Decreti e Regolamenti:

Decreto ministeriale 18 marzo 1949 (G.U. n. 67 del 23 marzo 1949)
D.P.R. 4 luglio 1949, n. 436 (G.U. n. 169 del 26 luglio 1949)
D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1089 (G.U. n. 247 del 26 ottobre 1951)
D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1333 (G.U. n. 22 del 27 gennaio 1958)

PAG. 503

Nota bibliografica

PAG. 507

Appendice

Legge 14 febbraio 1963, n. 60 (G.U. n. 44 del 16 febbraio 1963)

VII

Grafici

PAG.	16	Sviluppo delle entrate nel Primo e nel Secondo Settennio
	17	Importanza delle varie fonti di entrate nel Primo e nel Secondo Settennio
	34	Decentramento attuato nelle varie fasi di attività del Piano
	66	Ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale: 354.781 alloggi in 5.036 Comuni
	90	Risultati di una programmazione anticipata al massimo nelle varie fasi

Tavole

PAG.	39	Tav. 1 - Disponibilità finanziarie del Piano INACASA nei due Settenni
	40	Tav. 2 - Programmi economici e finanziari del Primo e del Secondo Settennio
	41	Tav. 3 - Situazione patrimoniale dell'INACASA al 30 giugno 1956 e al 30 giugno 1962
	42	Tav. 4 - Incremento patrimoniale degli immobili INACASA nei diversi esercizi
	43	Tav. 5 - Ripartizione per regioni delle costruzioni INACASA del Primo Settennio e confronto con alcuni indici
	44	Tav. 6 - Ripartizione per regioni delle costruzioni INACASA del Secondo Settennio e confronto con alcuni indici
	45	Tav. 7 - Abitazioni costruite in Italia nei singoli anni dal 1950 al 1960 e incidenza del Piano INACASA
	46	Tav. 8 - Incidenza delle costruzioni INACASA sull'incremento delle abitazioni verificate fra i censimenti del 1951 e del 1961
	47	Tav. 9 - Occupazione operaia nei cantieri dell'INACASA per regione a tutto il 31 dicembre 1962
	47	Tav. 10 - Occupazione operaia nelle opere pubbliche: in complesso, nella costruzione di abitazioni e nei cantieri dell'INACASA, dal 1953 al 1960
	11	Tav. 11 - Occupazione operaia nelle opere pubbliche per la costruzione di abitazioni, nel periodo 1953-1958
	50	Tav. 12 - Abitanti per stanza secondo i censimenti del 1881, 1931 e 1951

PAG.	51	Tav. 13 - Popolazione residente, abitazioni, stanze e affollamento medio nelle varie regioni (situazione al 4 novembre 1951)
	52	Tav. 14 - Popolazione residente, abitazioni, stanze e affollamento medio nelle varie regioni (situazione al 15 ottobre 1961)
	53	Tav. 15 - Incremento della popolazione residente, delle abitazioni e delle stanze fra i due censimenti del 4 novembre 1951 e del 15 ottobre 1961

PAG.	96	Tav. 16 - Attuazione del Piano INACASA (Primo e Secondo Settennio) nelle varie fasi al 30 giugno di ciascun anno
	97	Tav. 17 - Partecipazione dell'INACASA ai programmi C.E.P.
	100	Tav. 18 - Alcune caratteristiche degli alloggi INACASA costruiti nel Secondo Settennio
	101	Tav. 19 - Indice del costo di costruzione di una casa di civile abitazione
	102	Tav. 20 - Composizione percentuale del costo di costruzione di una casa di civile abitazione
	103	Tav. 21 - Costi massimi a vano per le costruzioni dell'INACASA nel marzo 1963

PAG.	133	Tav. 22 - Canoni mensili per un alloggio INACASA di 5 vani legali
	134	Tav. 23 - Famiglie assegnatarie di alloggi nei complessi INACASA: composizione per provenienza e categoria professionale
	135	Tav. 24 - Ripartizione per numero di componenti delle famiglie assegnatarie di alloggi nei complessi INACASA
	136	Tav. 25 - Numero degli assegnatari INACASA che hanno ottenuto il cambio da locazione a riscatto e viceversa a tutto il 31 dicembre 1962
	137	Tav. 26 - Sviluppo del Servizio Sociale dell'INACASA dal 1955 al 1962

PAG.	159	Tav. 27 - Costruzioni programmate nei due Settenni, per provincia
	160	Tav. 28 - Numero dei Comuni inclusi nei piani del Primo e del Secondo Settennio per provincia
	165	Tav. 29 - Attuazione del programma del Secondo Settennio nelle varie fasi, per provincia, al 31 dicembre 1962
	167	Tav. 30 - Costruzioni aziendali del Primo Settennio e del Secondo Settennio e costruzioni del piano Aggiuntivo. Stanziamenti al 31 dicembre 1962

Premessa: profilo di un Piano sociale

Il nome di « Piano Fanfani » oggi è legato a un panorama di case, ai nitidi quartieri periferici che hanno arricchito la cerchia antica di tante nostre città e tracciato un'impronta caratteristica e durevole sul volto del Paese. Questa realtà, che rappresenta il risultato ultimo del Piano, ha lasciato un po' nell'ombra il suo scopo originario, che era quello di combattere la disoccupazione operaia. E il lavoro compiuto in quattordici anni è stato in qualche modo coperto dalla generale rinascita economica italiana, che esso contribuì per la sua parte a promuovere. Potrà giovare, al termine del ciclo, risalire all'origine di quell'organismo caratteristico che fu l'INACASA, rivedere come venne pensato, in circostanze storiche diverse da quelle di oggi, e come si modificò col mutar dei tempi. Quale fu l'effettivo valore del Piano come esperienza di programmazione statale, in un settore delimitato? E gli Organi che la Legge istituì per realizzarlo si sono dimostrati efficienti, hanno saputo adeguarsi al mutar della situazione, e dimostrare una loro vitalità, anche al di fuori del momento in cui furono concepiti?

Nascita e scopi del Piano

Sarà forse opportuno rievocare le circostanze storiche ed economiche in cui sorse il Piano. Terzo anno del dopoguerra, quarto Ministero De Gasperi, nato dalla consultazione elettorale del 18 aprile 1948. Arrestata finalmente la spinta all'inflazione e ferma restando la difesa della lira, urgeva però imprimere all'attività economica del Paese un impulso brusco ed efficace, occorreva dar respiro, con un lavoro effettivo, alla disoccupazione e alla pseudo-occupazione che gravava sulle industrie, costrette ormai per sopravvivere e riprendere energia a ridimensionare la propria attività, riducendo in primo luogo il numero dei dipendenti che era cresciuto oltre il fabbisogno negli anni della guerra e del primo dopoguerra.

Si profila a questo punto la necessità di un intervento statale per favorire, in uno dei settori più adatti, la ripresa dell'economia nazionale. Un piano, cioè la volontà di introdurre un ordine nel gioco delle forze economiche, in un momento difficile, in vista di un fine sociale. Ma un piano che

eviterà interferenze o costrizioni all'iniziativa privata nel campo edilizio e si proporrà soltanto di coordinare un gran numero di sforzi per realizzare una maggiore utilizzazione delle forze economiche nel settore delle case popolari.

Nel corso della vita politica italiana dal dopoguerra a oggi si è registrato più di un progetto di programmazione pluricennale per settori e per zone. Fra essi il Piano INACASA, qualunque sia il giudizio che, a esperimento concluso, si potrà dare sui risultati conseguiti, rimane senza dubbio uno dei più vicini a un piano integrale, in quanto interviene in tutte le fasi, dalla programmazione alla consegna del prodotto.

Il Piano si proponeva di esercitare la funzione di un valvola nella ripresa delle attività economiche, provocando un riassorbimento della disoccupazione in un settore, come quello edilizio, particolarmente adatto per più ragioni (fabbisogno urgente per le distruzioni belliche e il crescere della popolazione; materie prime relativamente poco costose e reperibili in gran parte sul luogo o comunque in Italia; possibilità di occupare mano d'opera anche non qualificata, facile a trovarsi nei centri minori; risorse di lavoro offerte anche a molte industrie collaterali, e all'artigianato locale).

Il Piano, senza precedenti in Italia per le sue dimensioni, la sua diffusione capillare sull'intero territorio nazionale, la sua urgenza, si proponeva di concentrare l'aiuto, con uno sforzo energico e rapido, sui casi di maggior bisogno, sulle famiglie prive di casa, promuovendo a loro favore un atto di solidarietà da parte dell'intera comunità dei lavoratori. Questa doveva compiere, tutta insieme, un sacrificio per dar lavoro ai disoccupati, e per aiutare i più bisognosi tra i lavoratori a procurarsi una casa a condizioni di estremo favore, pagando solo una parte del prezzo di costo (un costo rigorosamente contenuto) e diluendo il pagamento in molti anni, senza corrispondere interessi di sorta. Al sacrificio dei lavoratori doveva unirsi l'aiuto dei datori di lavoro e dello Stato, che avrebbe anticipato una parte dei contributi per agevolare l'avvio della macchina del Piano, senza però assumersene l'onere totale, in considerazione della sua politica generale di difesa della moneta. Qualcuno ha potuto interpretare il Piano come un grande esperimento mutualistico.

Non si trattava però di uno sforzo a fondo perduto. L'originalità del Piano era in ciò, che esso, rompendo l'inerzia della vita economica, creava un moto perenne. Convertiti cioè i contributi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dello Stato in produzione di beni. Le quote di riscatto e di fido dei nuovi alloggi avrebbero restituito man mano il capitale e consentito di costruire altre case per altri lavoratori, producendo nuove quote di riscatto, e così via, in una spirale sempre più vasta anno per anno e teoricamente infinita.

Il Piano, che attuava gli articoli 41 e 47 della Costituzione, va collocato tra i vari modi di intervento dello Stato rivolti nel dopoguerra ad agevolare l'edilizia popolare (dai contributi ai finanziamenti a basso interesse) ma fra essi fu senza dubbio uno dei più caratteristici. È da osservare peraltro che lungo il combattuto « iter » parlamentare il disegno originario del Piano fu trasformato profondamente. Nell'idea prima, esso faceva perno sul risparmio obbligatorio, al termine di ogni anno, di una parte della 13^a mensilità; le trattenute non erano versate a fondo perduto, ma venivano trasformate in buoni-cassa commerciabili e riscattabili. Il Parlamento preferì, per semplicità, trasformare il contributo dei lavoratori in una trattenuta mensile. Rimase vivo peraltro un nucleo importante del concetto primitivo di ricorso al risparmio dei lavoratori, poiché un quarto degli investimenti del Piano (si tratta di veri e propri investimenti produttivi) era assicurato attraverso le trattenute sui salari settimanali e sugli stipendi mensili.

Una trasformazione profonda subisce il Piano con la Legge che avvia il Secondo Settennio di attività dell'INACASA. Il programma normale, che già prevede di per sé stanziamenti più vasti del primo periodo, viene inoltre integrato da un « piano Aggiuntivo ». L'art. 8 della nuova Legge prevede infatti che i lavoratori e le Cooperative di lavoratori, che dispongano di qualche risparmio, o di redditi più consistenti, possano inserirsi di loro libera volontà nel Piano, e prenotare alloggi, anticipando una parte del prezzo e riscattando il resto in dieci, o quindici anni, anziché in ventisei.

La nuova Legge segna una svolta nella strada del Piano INACASA. Esso non è più rivolto soltanto ai diseredati. Tutta una nuova categoria di lavoratori potrà beneficiarne d'ora in poi: i piccoli risparmiatori. Il Piano non si fonderà più soltanto sui contributi obbligatori, ma farà appello anche al

risparmio spontaneamente offerto. In un certo senso, si potrebbe sostenere che ci si sta nuovamente ispirando al principio del risparmio che era alla base del Piano originario. Questo però è un risparmio libero: il lavoratore concorre, di sua iniziativa, con il suo sacrificio, all'acquisto della sua casa. Lo Stato incoraggia questo risparmio e integra l'iniziativa privata con il denaro della comunità. La solidarietà di tutti con il singolo (che rimane l'idea madre del Piano) avvantaggia in ultima analisi anche la comunità, perché il beneficiario collabora con i suoi risparmi ad arricchire il fondo comune, e quindi a stimolare ulteriormente la costruzione di altre abitazioni anche per quelli più poveri di lui, che non hanno risparmi da anticipare.

Un organismo agile

Mentre le Camere discutevano il Piano Fanfani, un settimanale di opposizione pubblicò un disegno in cui apparivano, l'uno a fianco dell'altra, un enorme palazzo destinato agli uffici del futuro Ente e una minuscola casetta, unico frutto della sua attività.

Il pericolo era per l'appunto di creare un nuovo organismo mastodontico, accanto ai numerosi già esistenti, con un nuovo esercito di burocrati che assorbisse gran parte delle entrate. La Legge mirò ad evitare questo pericolo e a conti fatti sembra che ci sia riuscita. Basterà citare un dato: nei due Settenni, le spese generali hanno avuto una incidenza di circa il 2,50 per cento sul totale.

La Legge prevede a questo fine una struttura di grande semplicità e snellazza. Al centro, un nucleo raso di propulsione, coordinamento e controllo. Per tutte le altre funzioni, ricorso all'attrezzatura e all'esperienza di Istituti già esistenti. Il nucleo centrale comprendeva due organismi, secondo il principio di una distinzione netta dei compiti e delle responsabilità: il Comitato, organo normativo e deliberante, e il Consiglio Direttivo della Gestione, che aveva l'incarico di presiedere alle varie operazioni tecniche e amministrative e di regolare e controllare l'operato degli Enti periferici; (dell'uno e dell'altro organismo facevano far parte anche rappresentanti di quei lavoratori il cui denaro avrebbe contribuito a finanziare le future costruzioni).

Il Comitato di Attuazione, per la natura delle sue funzioni, era da considerare un Organo dello Stato, dotato di autonomia e responsabilità molto ampia, perché faceva capo direttamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Gestione, dal canto suo, fu istituita come un Ente autonomo fornito di personalità giuridica. I bilanci annuali del Piano erano sottoposti al Ministero del Tesoro.

Come si vede, nell'impostazione del Piano INACASA si aveva da un lato una programmazione rigorosa, ma dall'altro lato il caratteristico proposito di decentrare alla periferia le varie funzioni, allo scopo di valorizzare al massimo le energie e le iniziative locali, limitandosi a intervenire per stimolarle e controllarle.

Dopo due anni avverrà un'ulteriore semplificazione. Le Stazioni appellanti saranno ridotti di numero, ma i loro compiti ampliati. La Gestione si limiterà ad agevolare il loro lavoro con ipotesi tecniche (solo la formazione dell'albo dei progettisti, l'appreziazione dei progetti e il collaudo rimarranno centralizzati, per l'esigenza di conciliare un ritmo celere di lavoro col valore dei risultati costruttivi). Naturalmente, questa politica del decentrare quanto più è possibile porta con sé gravi e complessi problemi di coordinamento.

Il contatto quotidiano con la periferia, cioè con la realtà concreta del lavoro, sarà di stimolo a una revisione e a un aggiornamento continuo delle norme generali, contro ogni ossessione prassi burocratica. Il Consiglio Direttivo della Gestione dovrà assumere il compito di rappresentare al Comitato le esigenze e le difficoltà via via insorgenti, sollecitando il contributo della periferia in un dialogo continuo, forse senza precedenti.

Grazie a questa impostazione, anche in presenza di difficoltà impreviste, gli Organi del Piano avranno la possibilità di adeguare direttive e norme al mutare delle situazioni concrete, mantenendo nel groviglio dei problemi e delle difficoltà quotidiane una capacità di autoritica e di revisione, e anzi suggerendo così alcuni al legislatore eventuali modifiche alle varie norme. Il fatto che accompagnò, incontestabilmente, per via il pubblico l'INACASA, fu dai primi mesi di vita, venne da attribuirsi soprattutto all'agilità e rapidità con cui l'Ente poteva agire, libero dalle tradizionali

pastoie. Occorreva far presto, se si voleva contribuire effettivamente a rompere l'inerzia di una certa situazione economica, facendo leva su un settore con tutte le energie. È noto che i primi cantieri sorsero quando ancora si preparavano i regolamenti per applicare la Legge.

Il nocciolo del problema dell'INACASA (come ebbe a scrivere uno dei suoi maggiori responsabili) era qui: mettere quanta più legna era possibile al fuoco, badando però che la parte effettivamente bruciata corrispondesse all'afflusso di combustibile in magazzino. Non tesaurizzare cioè i fondi che pervenivano, ma reinvestirli immediatamente per creare altra ricchezza, in modo che il valore delle case costruite e pagate li assorbisse allo stesso ritmo con cui affluivano. I cantieri non dovevano fermarsi, anche quando il programma iniziale era esaurito. La programmazione doveva essere sempre in fortissimo anticipo rispetto agli stanziamenti e ai contributi; (non si dimentichi che il fine primo del Piano era di combattere la disoccupazione operaia, contribuendo a rimettere in moto la macchina economica).

Il mantenimento di questo equilibrio dinamico comportava una politica del rischio calcolato, fino al punto di affrontare in certi frangenti il pericolo di spendere in misura superiore all'ammontare dei contributi al momento disponibili, e di dover ricorrere quindi a finanziamenti esterni, pur di non interrompere il ritmo del lavoro e della occupazione.

Lo stile delle case

Percorrendo la periferia di qualsiasi città italiana, è facile distinguere i quartieri dell'INACASA, divenuti ormai un elemento caratteristico del paesaggio. Ampi spazi intorno agli edifici, colori gai, balconi prominenti. Nessuna casa identica all'altra, ogni quartiere con una sua caratteristica inconfondibile, armonizzata con la struttura del nucleo storico cittadino.

Per molto tempo, edilizia popolare non aveva significato altro che costruzione in economia. Economia di spazio, di luce, di fantasia, non soltanto di materiali: enormi cubi identici, senza balconi, serrati l'uno all'altro. Si era convinti che la casa popolare non richiedesse speciali ricerche all'architetto.

Il Consiglio Direttivo della Gestione INACASA si sforzò di impostare la sua opera secondo il principio esattamente opposto: che per l'appunto le case economiche esigono dall'architetto un impegno tutto particolare. È incontestabile, oggi, che il Piano INACASA ha segnato un capitolo nuovo nell'edilizia popolare: un esempio caratteristico d'incontro fra esigenze sociali e architettura.

Le norme legislative prescrivevano tassativamente che il costo per vano non dovesse superare un certo limite, prevedevano una gamma di alloggi da 1 a 5 vani più i servizi, e raccomandavano di tener presente nella scelta dei tipi la necessità di ottenere il maggior numero di alloggi al minor costo.

Spettava agli Organi del Piano interpretare, nel quadro di queste norme di economicità, lo spirito della Legge: l'atto di solidarietà della comunità dei lavoratori verso i più bisognosi doveva essere pieno, e quindi rispettoso della loro dignità di persone. Niente case-ricovero costruite in serie. La pianificazione doveva rispettare l'individualità, perché ciascun assegnatario fosse in grado di riconoscere da lontano, fra tutte le altre, la propria casa, ed entrandovi si trovasse a suo agio, in un ambiente adatto alle sue esigenze, e vi acquistasse il gusto delle cose ben fatte e la gioia di vivere in famiglia.

Conciliare costo, e quindi quantità di alloggi, con qualità, sarà lo sforzo costante (e spesso drammatico) della Gestione. Le norme emanate dal Comitato nel 1949, fin dall'inizio del Piano, sono molto esplicite: si richiedono solidità, razionale distribuzione degli ambienti, cura delle rifiniture, aria, luce, spazi verdi, anziché gli squallidi cortili interni. E ogni casa dovrà essere adatta alle tradizioni e al modo di vita della regione in cui sorge.

L'impostazione iniziale, anche in questo campo, fu confrontata, appena possibile, con la realtà dei fatti e in particolare con le esperienze degli stessi beneficiari. Un questionario da essi riempito mise in luce le loro preferenze per modi di vita sempre più civili; se ne tenne conto nelle nuove costruzioni.

La strada scelta dal Comitato e dalla Gestione sembrava sfruttare scarsamente le possibilità moderne di costruzione industrializzata, in serie e in elementi prefabbricati, e questo poteva apparire una mancata applicazione di alcuni indirizzi e suggerimenti della Legge. Ma si tenga presente, di

frante a ciò, che il primo scopo del Piano era l'assorbimento della manodopera e delle risorse di materiali locali, che le costruzioni perciò furono affidate in gran parte a medie e piccole imprese; d'altra parte la Gestione si era impegnata a difendere anzitutto, in un Paese di nobili tradizioni architettoniche come l'Italia, il concetto della casa come opera quanto più possibile individuale. Più di un terzo degli architetti italiani, scelti dalla Gestione in seguito a concorsi, hanno lavorato nelle costruzioni dell'INACASA: liberi professionisti inseriti senza impacci burocratici nella catena dell'industria edilizia. Si può dire che questa esperienza ha influenzato profondamente la formazione di una generazione di architetti contemporanei.

Ma col mutare della situazione di mercato, anche in dipendenza di eventi internazionali, si faceva sempre più difficile la lotta per comprimere i costi salvando la qualità: occorreva ormai ricercare le aree a prezzo accessibile in periferia, o addirittura al di fuori dell'abitato cittadino. D'altra parte la rapida crescita del Piano costringeva ormai a passare dalla produzione di case singole, o in piccoli nuclei, alla impostazione ex-novo di interi quartieri in zone extraurbane.

La costruzione dei quartieri segna una svolta fondamentale nella storia del Piano. Il problema non era solo urbanistico e architettonico. Era necessario anche coordinare una quantità di interventi che assicurasse ai nuovi abitanti i servizi indispensabili alla vita. Questo problema non era mai stato affrontato in Italia in modo organico, ed era complicato per giunta da una legislazione quanto mai insufficiente. Nei nuovi bandi la Gestione chiamò a raccolta non più architetti singoli, ma gruppi spontaneamente costituiti, forniti di esperienze complementari. Si voleva assicurare ai nuovi quartieri un'armonia architettonica che fosse nuova, ma al tempo stesso coerente con i centri storici, che sono il tessuto prezioso della nostra civiltà.

Giustizia matematica

Per la prima volta in Italia un bene come la casa popolare doveva venire assegnato per legge con una giustizia distributiva ferrea, in base a una scala di titoli racchiusa in una formula matematica. L'unico criterio di preferenza, il bisogno più grave. Non si cercarono garanzie preventive sulle possi-

bilità di pagamento degli aspiranti assegnatari, ma si valutò unicamente la misura delle loro necessità, con un'analisi minuziosa che fu fatalmente lenta, e poté sembrare rigida, complicata e persino pedante; ma era forse l'unica garanzia piena che le costruzioni fossero distribuite equamente in tutte le parti del territorio nazionale, e le assegnazioni avvenissero in base a una valutazione obiettiva dei titoli di preferenza, alla luce del sole, al riparo da qualsiasi pressione. Ogni lavoratore, obbligato a contribuire al Piano con i suoi denari, doveva però essere assolutamente convinto che prima di lui veniva accontentato solo chi avesse un bisogno maggiore di lui.

Fu il Regolamento a stabilire questi rigidi criteri di scelta, ripartendo i bisogni, almeno all'inizio, in sette classi e assegnando, nell'ambito di ciascuna classe, una scala di punteggio in base a elementi obiettivi e incontestabili.

La Legge decise inoltre che la responsabilità di assegnare nuovi alloggi fosse anch'essa decentrata, a Commissioni provinciali presiedute da un Magistrato; (è importante sottolineare che ogni Commissione doveva comprendere i rappresentanti delle categorie interessate del luogo).

Gli Organi del Piano si limitavano a stabilire la procedura da seguire nella presentazione delle domande, i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali, ecc. e applicavano tale procedura con una minuziosità intransigente, resistendo a tutte le pressioni che tentavano di rendere più elastici i criteri di scelta. Non doveva essere lasciato nessun margine all'opinabilità, e ai favoritismi che ne sarebbero derivati inevitabilmente.

È fenomeno comune che l'edilizia popolare si concentri nelle zone più industriali e nei capoluoghi di provincia. Ma in questo caso, per assicurare l'adempimento delle finalità del Piano, cioè l'incremento generale dell'occupazione operaia, era necessario che i benefici della Legge fossero estesi al maggior numero possibile di località. Si doveva inoltre tener conto delle distruzioni prodotte dalla guerra, disseminate sia nei grandi che nei piccoli centri.

Anche per la distribuzione dei cantieri tra le varie province, la Legge tenne conto sperimentalmente del bisogno. Il Piano di ripartizione doveva basarsi sul grado di affollamento nelle abitazioni

sulle distruzioni causate dalla guerra; il risultato doveva venir rapportato direttamente al numero dei contribuenti del luogo. I fondi raccolti col sacrificio dei lavoratori d'una certa provincia non dovevano essere gettati in una massa anonima, ma concorrere invece a stabilire l'entità del beneficio di cui quella provincia doveva godere. Tuttavia, a favore del Sud e delle Isole, la Legge prescrisse che venisse assegnata una cifra non inferiore a un terzo del totale; (questa percentuale sarà costantemente superata, in sede di realizzazione del Piano). Alla fine del Secondo Settennio ben 5.036 comuni, su un complesso di 7.995, avranno avuto costruzioni dell'INACASA. Non era stata mai raggiunta una disseminazione così vasta dei benefici di una legge edilizia.

La mutata situazione storica ed economica del Paese si riflette chiaramente sulle modifiche introdotte dalla Legge nei criteri di assegnazione per il Secondo Settennio. Tra i criteri di ripartizione delle costruzioni viene meno quello delle distruzioni belliche, sostituito dalla entità della disoccupazione; fra i criteri di assegnazione sparisce la ferrea distinzione in classi degli aspiranti beneficiari. Si aggiunge invece ai titoli di preferenza quello dell'anzianità di lavoro sul luogo, ad evitare l'ingiustizia che i più recenti immigrati ricevano la casa a preferenza dei lavoratori anziani della città. Inoltre, sanzionando un'iniziativa presa dal Comitato, la Legge ammise formalmente, fra le Aziende che avevano diritto a costruire direttamente case per i propri dipendenti, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici.

Un segno evidente del miglioramento della situazione generale si scorge anche nella nuova disposizione per cui il numero degli alloggi da assegnare in proprietà è salito dalla metà ai due terzi del totale.

Ma soprattutto, una nuova schiera di candidati assegnatari si aggiunge all'antica: quella, di cui si è detto, dei piccoli risparmiatori, che spontaneamente, disponendo di qualche reddito più consistente, chiedono di prenotarsi per un alloggio, anticipando in parte il costo della costruzione. Si inserisce nella vita del Piano il criterio della libera scelta, almeno per l'area, da parte di coloro che vogliono costruirsi una casa.

La vita nelle nuove case

Chi erano gli assegnatari dell'INACASA? Dopo aver portato a compimento il ciclo così complesso delle sue operazioni, dall'acquisto del terreno all'appalto, alla costruzione, all'assegnazione, il Piano si trovò davanti a una realtà nuova, a migliaia di uomini, di donne, di bambini che nelle sue case iniziavano la loro nuova vita. Non poteva disinteressarsene, anche a costo di andare oltre i compiti assegnati in senso stretto dalla prima Legge. Si doveva affrontare questa realtà. Ciò che caratterizza un esperimento sociale, come l'INACASA, è l'obiettivo costante, il fine ultimo, che è sempre l'uomo, la difesa degli interessi della famiglia, la preoccupazione continua di assicurare ai destinatari la pienezza dei benefici.

Come erano composte le famiglie dell'INACASA? Immigrati in maggioranza (63 per cento); operai in maggioranza (62,2 per cento; gli altri erano impiegati). Famiglie numerose, al di sopra della media delle famiglie italiane. Tra esse vi era molta gente di umile condizione, di scarsa cultura e preparazione civile. Il problema era di trasformare questi nuclei eterogenei, riuniti casualmente, in comunità ordinate e civili.

Occorreva anzitutto aiutare gli assegnatari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Nei nuovi quartieri erano indispensabili negozi, spazi verdi, impianti sportivi per i giovani, luoghi di ritrovo e di vita comune. Era necessaria la Chiesa. Gli Organi del Piano misero a disposizione enti collettivi, facilitarono le iniziative tendenti a costruire locali e attrezzature per le varie attività sociali, stimolarono i Comuni perché sistemassero i servizi, anticipando, quando occorreva, i fondi. Il problema dei servizi nei nuovi nuclei cittadini fu uno dei più complicati e difficili tra quelli affrontati dall'INACASA.

Ma i servizi e i luoghi di vita comune non bastavano. Occorreva anche insegnare ai nuovi assegnatari a servirsi della casa senza sciuparla, insegnare a vivere in collettività, facilitare gli incontri. Nel 1952 il Piano decise di collocare nei nuovi complessi edilizi delle Assistenti Sociali. Due anni dopo, seguendo la caratteristica tendenza al decentramento e alla partecipazione, l'INACASA avviò la costituzione di un Istituto autonomo specializzato, che svolgeva attività di assistenza sociale.

anche alle case di altri Enti. Attraverso l'opera delle Assistenti Sociali si doveva favorire l'inserimento nell'ambiente e le iniziative individuali. L'INACASA tendeva anche a istituire fra i suoi assegnatari forme di amministrazione autonoma, in altre parole ad educare all'autogoverno. Tale linea di condotta fu decisa dalla Legge istitutiva, e presentava evidenti vantaggi economici oltre che educativi: conduceva l'assegnatario, attraverso una paziente opera d'insegnamento, dirimendo innumerevoli contrasti, ad amministrarsi da sé.

Questo tipo di rapporti, basato sulla comprensione e sulla valorizzazione della personalità degli assegnatari, doveva essere norma costante. Si prenda l'esempio caratteristico della morosità. Per combatterla bisognava cominciare con l'analizzarne e capirne le cause. Emergevano tra esse la scontentezza e l'irritazione per servizi non ricevuti; in altri casi la morosità era dovuta al reddito troppo scarso. Si scoprì anche che la morosità era inferiore negli alloggi a riscatto rispetto a quelli in locazione. Ecco un'altra strada che si apriva. Un foglietto, un dialogo di tono familiare, diffuso fra gli inquilini, illustrava con semplicità i vantaggi grandi del passaggio da un tipo all'altro di contratto. Si favorì tale passaggio con ogni sorta di facilitazioni. Si crearono dei proprietari, che godessero in proprio la gioia della casa.

I tre aspetti essenziali del Piano

Ogni organizzazione umana, anche la più complessa, presenta — come ogni persona — alcuni tratti caratteristici che ne definiscono la fisionomia e bastano ad esprimerne, in qualche modo, il significato e lo spirito.

Se a questo punto, prima di addentrarsi nell'esame particolareggiato del meccanismo dell'Ente e dei risultati raggiunti in concreto, il lettore chiedesse di indicargli quali sono, per l'INACASA, i tratti più caratteristici e più individuanti, pensiamo che si potrebbe sottolinearne tre, nei quali si traduce lo spirito con cui il Piano intendeva impostare la sua azione sociale, in una situazione storica ed economica particolarmente importante.

1) ALLEVIARE I BISOGNI PIÙ ACUTI DI LAVORO E DI CASA

Il Piano mirava a soddisfare un bisogno fondamentale dell'uomo quale è il lavoro, mediante un deciso intervento in un settore — quello della casa — dove più acuto era il disagio di molti lavoratori, specie in alcune zone.

Perciò il Piano, finanziato da tutti, si proponeva di assegnare, con giustizia matematica ai lavoratori, le case.

2) DARE AL LAVORATORE UNA CASA CIVILE, STUDIATA IN MODO CHE CIASCUNO POTESSE SENTIRLA SUA, E DOVE CIASCUNO SI SENTA CITTADINO DI UNA NUOVA COMUNITÀ

Il Piano intendeva dare ai lavoratori una casa umana e adatta a ciascuno di essi, non irreggimentarli in caserme; a questo fine procurò di inserirsi nella tradizione architettonica italiana, così ricca nella varietà della sua storia e del suo paesaggio. Non impose progetti, ma scelse progettisti, a cui indicò schemi-tipo (funzionali e di costo accessibile), che potessero essere facilmente inseriti nell'ambiente ove dovevano sorgere.

Di queste case i lavoratori avrebbero dovuto sentirsi, nella misura del possibile, proprietari. Il Piano volle perciò educare gli assegnatari ad amministrarle, responsabilmente, in modo autonomo e, con il Servizio Sociale, a trasformare le convivenze create nei nuovi quartieri in comunità serene e moderne.

3) L'INACASA, OPERA DI TUTTI

Attorno ai due Organi Centrali, con funzioni normative, di coordinamento e di controllo, le varie fasi dell'attuazione furono affidate, secondo la specifica competenza, a un gran numero di Enti, Amministrazioni, Organismi periferici, i quali ricevevano dal Centro direttive e stimolo, fornivano a loro volta il contributo della propria esperienza e del quotidiano contatto con la realtà. Tutto ciò che l'INACASA è riuscita ad attuare è perciò opera di tutti. Questa la ragione per cui in una pubblicazione documentaria come la presente, non si troveranno citati i nomi di quanti assunsero il compito di realizzare il Piano.

Problemi dell'attuazione

Questo era dunque lo stridente contrasto della Legge per la realizzazione del Piano, questa la sua problematica caratterizzata e resa intollerante l'attuazione sociale così aperta, e si correbbe dinanzi di tentare, per l'INACASA questa ancora oggi un incubo quasi inavvertito di simpatia, in che l'azione si rivolge alle sue origini. Di questo molto intuitivo di consenso andava detto, perché stava dimostrando, almeno in parte, il lungo e arduo lavoro incontrato dal Piano fin dal suo primo tentativo, tanto che oggi subito ne agisce l'immediata attuazione. Ora però, a chiusura di un bilancio di quattordici anni, vorrebbe domandarsi, alla luce di questa esperienza, come ha fatto la sua attività al bene di prima della realtà.

Il lungo dell'azione popolare che il Piano doveva affrontare era contrariamente a quanto potrebbe apparire a un osservatore, non era così complessa ed era di difficoltà di ogni genere. Per il Piano infatti, nelle varie fasi, gli Enti adeguatamente attrezzati per i nuovi compiti che sarebbero stati richiesti, e dei quali in molte occasioni gli Enti non erano mai stati chiamati, prima di allora, a svolgere con continuità e con un senso di molti anni un lavoro che permettesse loro di avere una presenza e di fornire un'attrezzatura adeguata. In molti casi le precedenti progettazioni erano state condotte. In molte zone, non si disponeva neppure di dati tecnici sulle costruzioni, e gli studi sulla situazione effettiva della popolazione, né una mai aveva compiuto un serio tentativo di valutare l'organizzazione e a un piano nazionale queste necessità.

Non basta ancora. Si trattava di contemporanee esigenze molteplici e sovente opposte; venire incontro ai bisogni dei lavoratori residenti nelle zone industriali, ma al tempo stesso non trascurare, per la prima volta, i centri, strutture in misura particolare il Sud e le Isole, contemporaneamente gli studi relativi con le esigenze concrete della produzione. Bisognava costruire molto, ma al tempo stesso costruire bene, risolvere il dilemma fra i costi da contenere ferreamente, e la qualità delle costruzioni, che si doveva alta e pienamente dimostrare.

Ognuno sa che gli Organi del Piano se ne resero conto dopo le prime esperienze — affrettate per nome del tutto nuove, come quella della realizzazione di grandi centri residenziali: problemi che portavano in sé la necessità di affrontare una quantità immensa di esigenze e difficoltà del tutto

sconosciute fino allora, e non previste neppure dalla Legge. E tuttavia la mancata soluzione di queste difficoltà si sarebbe ripercossa in uno stato di disagio degli assegnatari, così grave da compromettere in gran parte i benefici del Piano.

In qual modo il nuovo Ente, con la sua caratteristica autonomia di decisioni e snellezza di struttura concessagli dalla Legge, affrontò questa realtà così complessa e contraddittoria? Riuscì a modificare di volta in volta i suoi indirizzi e i suoi metodi, senza perdere di vista i suoi scopi fondamentali? Quali furono i problemi più importanti e più ardui, quale fu concretamente il contributo di ciascuno degli Organi del Piano — l'uno integrando, e qualche volta correggendo, gli sforzi dell'altro — all'opera comune?

Infine, come si possono valutare oggi, su un piano tecnico e architettonico da un lato, economico e sociale dall'altro, le soluzioni che l'INACASA ha dato ai principali problemi affrontati?

Questa pubblicazione non pretende assolutamente di fornire una risposta a tutte queste domande. Essa vuole offrire un'ampia documentazione e mettere a fuoco i principali problemi emersi nel periodo di attività del Piano INACASA, indicando le soluzioni di volta in volta attuate, insieme ai principali risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.

Per quanto riguarda la progettazione architettonica ed urbanistica, si offre anche una documentazione su un buon numero di realizzazioni ottenute dall'INACASA, ristretta tuttavia, per necessità di spazio, ad una parte soltanto delle opere, che avrebbero meritato di essere più adeguatamente illustrate.

All'atto in cui si chiude il periodo dei quattordici anni — perché tanto è durato il Piano INACASA — e quando ancora non sono state elaborate le risultanze dell'ultimo esercizio, è ancora presto per trarre delle conclusioni.

Ci auguriamo comunque che attraverso gli elementi offerti sia possibile a ciascuno farsi un giudizio abbastanza preciso sullo sviluppo del Piano. Esso ha consentito il formarsi di una vasta esperienza in un importante settore dell'attività nazionale, coronata dall'approvazione della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 che, all'atto stesso in cui poneva termine all'attività della Gestione INACASA, istituiva un « Piano Decennale Case per Lavoratori » di così ampia portata.

La macchina del Piano

1. Gli obiettivi

« Un piano per incrementare l'occupazione operaia, mediante la costruzione di case per lavoratori »
Questa la definizione con cui la Legge istitutiva — quattordici anni or sono — parlò dell'INACASA ai lavoratori interessati ed al pubblico.

Definizione complessa e quanto mai impegnativa. La parola « piano » ha tuttora (e forse oggi più che ieri) una sua imponenza e un suo fascino, nonostante l'uso e l'abuso che se ne è fatto, non solo in economia. Par certo, tuttavia, che il termine possa venire legittimamente applicato, in campo nazionale, solo a un'azione di sufficiente ampiezza e durata, in un settore chiave dell'economia, con obiettivi e metodi chiaramente definiti. Un'azione di questo genere si giustifica, agli occhi dell'osservatore, solo se attuata da organi pubblici, e nell'interesse comune.

In un'economia di tipo non collettivista, un « piano » si propone non già di sostituire, ma d'integrare l'iniziativa privata, nei settori in cui questa risulti comunque insufficiente, allo scopo di correggere e ridurre gli squilibri che si verificano sul mercato, o per soddisfare i bisogni urgenti delle categorie più modeste. In uno spirito di solidarietà, possono essere chiamati a concorrere, al raggiungimento di questi scopi, gli sforzi e i sacrifici dell'intera collettività.

La parola stessa di « piano » richiama l'idea di un'organizzazione strutturata con precisione in tutti i suoi aspetti e in tutte le fasi di lavoro, quasi una macchina che si valga dell'ausilio di tutte le moderne tecniche di programmazione, e funzioni con criteri sistematici e rigorosi, proporzionando gli sforzi agli scopi da raggiungere.

Infine, pare incontestabile che un piano, nell'esatto significato del termine, debba, in un'economia di mercato, conciliare due esigenze in buona misura opposte, quella di stimolare una collaborazione fervida, e quindi spontanea, e quella di incanalare l'attività, in tutte le fasi, verso obiettivi stabiliti in anticipo dal centro con norme precise e obbligatorie per tutti.

Se queste sono le caratteristiche essenziali di un moderno piano economico, rimane da esaminare se e in quale misura esse si incontrino nella struttura e nell'azione dell'INACASA.



[illegible]

... ..

... ..

...and the

...and the

100

100

Per quanto riguarda l'ampiezza e la durata, sembra che si debba rispondere subito di sì. Basteranno i dati che seguono. Istituito dalla Legge 28 febbraio 1949, n. 43, il Piano INACASA è stato chiuso dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 60, che l'ha sostituito con un nuovo Programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori. Per quattordici anni, dunque, dal 1949 al 1963, esso è intervenuto nel campo dell'economia nazionale col peso di una disponibilità complessiva di ben 930 miliardi, forniti rispettivamente, per il 25,3 per cento dai lavoratori dipendenti dei settori non agricoli, per il 39,6 per cento dai loro datori di lavoro, per il 20,3 per cento dallo Stato, e per il rimanente 14,8 per cento dai frutti stessi degli investimenti via via maturanti, in misura crescente, anno per anno (vedi pag. 140 e Grafici a pag. 16 e pag. 17).

Un piano contro la disoccupazione

L'obiettivo immediato che il Piano si proponeva era, come si è detto, d'incrementare, in un momento particolarmente delicato e difficile del dopoguerra, l'occupazione operaia sia direttamente, utilizzando nei cantieri le forze disponibili del settore edilizio, sia indirettamente, stimolando con questo nuovo intervento le altre attività di lavoro del Paese. Ai fini di questo più vasto obiettivo, la decisione di concentrare gli sforzi nel settore edile ha una sua ragione e un valore particolare. È noto infatti che esso è uno dei più sensibili alla situazione congiunturale, ed è noto su quante attività collaterali si ripercuota ogni sbalzo del mercato edilizio. Un intervento su larga scala in tale settore avrebbe prodotto presumibilmente effetti tonificanti, e non solo sull'attività edilizia vera e propria, ma sull'economia nazionale nel suo complesso.

Un piano contro la disoccupazione. Nell'immediato dopoguerra, questo fenomeno si presentava come il massimo problema di struttura di tutta la nostra economia. Le rilevazioni davano la cifra, enorme, di oltre due milioni di disoccupati. Era questa la risultante drammatica di uno squilibrio di fondo fra il rigoglioso incremento della popolazione e i

limiti dell'apparato produttivo di una economia nazionale ancor troppo scarsamente industrializzata. Il fenomeno era strettamente legato con la depressione del Mezzogiorno, vecchia piaga d'Italia più che mai lontana dalla guarigione, e con il basso livello dell'istruzione in genere e di quella professionale in particolare.

Di fronte a questa massa di due milioni di disoccupati, le sbarre di frontiera erano chiuse, o quasi: le possibilità di emigrazione sui mercati esteri erano scarsissime. La politica economica italiana era rivolta fin da quegli anni, nelle sue direttrici essenziali, a risolvere il problema della disoccupazione agendo, per quanto era possibile, alle radici, sulle sue cause profonde, mirando cioè a promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale, e a risollevare il Mezzogiorno. Nel frattempo, si tentò una serie d'interventi, volti a diminuire immediatamente il livello della disoccupazione; da una politica di opere pubbliche a un programma di corsi di addestramento professionale, dai cantieri di lavoro a quelli di rimboschimento. Il Piano INACASA nasceva in questo complesso quadro di interventi immediati e di programmi organici, con una fisionomia sua propria che lo qualificava come la massima iniziativa pubblica indirizzata ad alleviare la disoccupazione e, nello stesso tempo, soddisfare ad una delle carenze di base della nostra situazione economica e sociale: quella delle abitazioni popolari.

La scelta del settore edilizio

Esso appariva particolarmente funzionale rispetto alle due caratteristiche di base del mercato del lavoro, quale si presentava nell'immediato dopoguerra: da un lato, la presenza, in quasi ogni zona del Paese, di forze del lavoro disoccupate, o sottoccupate, o occupate solo in apparenza; dall'altro lato, la decisiva prevalenza, in questa massa di due milioni, della manodopera generica, o scarsamente qualificata, dei manovali e braccianti.

NELLA PAGINA PRECEDENTE.

Il sistema urbanistico del colore, tipico nella tradizione architettonica italiana, è consigliabile in ogni caso, ma particolarmente per i centri che sorgono fuori dai centri cittadini (da «Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione urbana», Fas. n. 2, pag. 25).
Vedere: L'arte edilizia in Fellestrina - Progettazione: arch. B. de' Scarpis.

La scelta del settore edilizio per un intervento d'urto contro la disoccupazione appariva opportuna per vari motivi. Anzitutto, perché gli investimenti in questo campo consentivano più che in ogni altro l'assorbimento immediato di manodopera. È noto che il numero delle unità di lavoro impiegate per ogni unità di spesa è, nel settore edilizio, più elevato che nella generalità degli altri settori industriali: sul costo di fabbricazione di una casa di abitazione civile, la manodopera incide in media per il 40 per cento circa, con punte anche superiori nelle zone rurali, dove si realizzano tipi di costruzioni più semplici.

Per giunta, le costruzioni edilizie permettevano un largo impiego di quella manodopera non qualificata, che costituiva il grosso dei disoccupati. Si può stimare che in media le giornate-operaio occorrenti a costruire una casa sono fornite per almeno un terzo dalla manovalanza generica. E va detto per di più che nelle costruzioni edilizie i lavoratori che provengono dalla campagna possono trovare una prima qualificazione, e quasi un tirocinio per il passaggio all'industria.

D'altra parte, l'edilizia consentiva interventi diffusi sull'intero territorio nazionale, offrendo così la possibilità di svolgere sul mercato del lavoro un'azione vivificante addirittura capillare. È noto infatti che le imprese edili, ma soprattutto i lavoratori occupati o occupabili in lavori edili, si distribuiscono in tutto il territorio nazionale in modo molto simile alla distribuzione della popolazione.

Finalmente, la costruzione di case dà luogo a una domanda di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che in buona misura possono venire forniti da aziende artigiane e da piccole industrie locali, e nella quasi totalità, dalle industrie nazionali; onde ne deriva un incremento per un'ampia serie di attività produttive, come la siderurgia, i legnami, i laterizi, gli agglomeranti, i vetri, gli impianti igienici, ecc. Lo stesso fenomeno si ritrova nel mercato del lavoro: dando lavoro al muratore, si dà lavoro, nell'atto stesso, ad una quantità di operai e artigiani, dal fabbriame all'idraulico, dall'elettricista al camionista.

Scarsità di abitazioni

Ma un piano edilizio, in un paese come l'Italia, non aveva soltanto l'obiettivo immediato di diminuire la disoccupazione operaia; esso rispondeva al tempo stesso a una carenza di abitazioni che era stata, sì, acuita drammaticamente dalla furia delle distruzioni belliche, ma che da molto tempo costituiva uno dei più gravi problemi del Paese. La scarsità di case e il sovraffollamento sono già ricordati fra i grandi problemi nazionali nei primi anni dalla raggiunta unificazione. Nel Censimento del 1881 si riscontrò che il numero medio di persone per stanza era pari ad 1,65, con punte di oltre due persone per stanza nel Meridione, e di 1,90 nelle Isole (Tav. 12).

Mezzo secolo dopo, nel Censimento del 1931, si riscontrava, sì, una diminuzione dell'indice di affollamento, passato da 1,65 a 1,36 persone per stanza, ma si era ancora molto lontani dall'aver soddisfatta la carenza di abitazioni. Inoltre sussistevano forti sperequazioni nel grado medio di affollamento degli alloggi fra le varie regioni; nella Puglia e Basilicata si riscontravano ancora oltre due abitanti per stanza, mentre in Liguria, Toscana e Piemonte, si aveva, in media, poco più di un abitante per stanza. Le case erano di solito assai piccole. La dimensione media di ogni abitazione era di 3,5-4 stanze nel Nord e di sole 2,5 stanze nel Mezzogiorno. Infine, le dotazioni di servizi igienici risultavano scarsissime.

Tra il 1931 e lo scoppio della guerra l'attività edilizia continuò a svilupparsi, ma in misura insufficiente a coprire sia le vecchie carenze, sia le nuove esigenze maturate nel frattempo. Il blocco dei fitti istituito nel 1934 contribuì non poco a rallentare il ritmo degli investimenti in questo settore da parte dell'iniziativa privata.

E poi venne la guerra. La furia dei bombardamenti e l'urto fra gli eserciti nell'intera penisola distrussero circa due milioni di vani; un milione fu gravemente danneggiato, oltre tre milioni furono lievemente danneggiati. Se oltre a ciò si considera la paralisi delle nuove costruzioni causata dalla guerra, ci si può ben rendere conto di quanto

fosse tragica la penuria di abitazioni negli anni immediatamente successivi al conflitto. Un altro fenomeno che diminuì ancora la disponibilità di alloggi fu l'accentuarsi del flusso migratorio verso i grandi Centri, che creava una forte richiesta di abitazioni urbane.

Possiamo rifarci ai dati del Censimento 1951, sebbene essi raffigurino una situazione di circa due anni successiva all'istituzione dell'Ente (lav. 12).

Anzitutto nel 1951 l'affollamento delle abitazioni occupate era superiore a quello registrato nel 1931: nel '31 si erano rilevate 1,36 persone per stanza, nel 1951 tale cifra sale a 1,39. La situazione era rimasta all'incirca invariata nel Nord (da 1,22 a 1,21 persone per stanza) ma era peggiorata nettamente nel Mezzogiorno (da 1,70 a 1,86 persone per stanza); in qualche regione, come Puglia, Basilicata e Calabria, si registravano addirittura oltre due persone per stanza, in media.

Dettenendo in base ai criteri dell'ISTAT « non affollate » le abitazioni con meno di un abitante per stanza; « affollate » quelle aventi da uno a due abitanti per stanza e « sovraffollate » quelle con oltre due abitanti per stanza, si constata che nel novembre 1951 solo il 41 per cento delle famiglie italiane viveva in case non affollate, il 37 per cento in case affollate e il restante 22 per cento in case sovraffollate. Le punte massime di affollamento si raggiungevano nel Mezzogiorno, ove ben il 43 per cento delle famiglie viveva in abitazioni sovraffollate. Per dare un'idea della gravità del fenomeno, basterà dire che nel 1951 il 20 per cento degli abitanti del Mezzogiorno viveva con un affollamento medio di sei persone per stanza. Quanto alle caratteristiche delle abitazioni, basti ricordare che ben 1.800.000 alloggi, dei quali due terzi del Mezzogiorno, erano sorniti sia di acqua potabile che di latrina. E non basta: 220.000 famiglie vivevano in abitazioni improprie e cioè in baracche, in cantine, o, addirittura, in grotte.

L'esigenza insoddisfatta di alloggi alla fine del 1951 poteva calcolarsi — secondo criteri restrittivi — intorno al milione di abitazioni: infatti, alle famiglie predette si potevano aggiungere circa 750.000 famiglie viventi in coabitazione.

Ma se poi, oltre all'esigenza minima di dare un'abitazione ad ogni famiglia, si consideravano anche le costruzioni necessarie per far scendere l'indice di affollamento medio al livello di un abitante per stanza, allora si poteva valutare il fabbisogno complessivo a circa 10 milioni di stanze, perché tanta era la differenza fra l'entità della popolazione e il numero delle stanze esistenti.

È inutile avvertire che la situazione più grave si riscontrava nel settore dell'edilizia popolare, cosicché il problema del caro-alloggi diventava ogni anno, per i lavoratori a reddito modesto, più assillante.

Non si valuta abbastanza, di solito, quanto gravi fossero le conseguenze che l'insufficienza e la scarsa abitabilità delle case popolari (tradizionalmente concepite da noi, salvo poche eccezioni, come squallidi casermoni uniformi) portava nella vita familiare, psicologica, sociale dei loro abitanti, e di rimbalzo quale danno derivasse da questo tono depresso di vita alla stessa attività di lavoro di un Paese che si stava faticosamente risolvendo dalle macerie della guerra.

Questo il quadro di profonde carenze in cui veniva ad inserirsi l'azione propulsiva dell'INACASA.

2. La struttura organizzativa

L'attività edilizia che la Legge assegnò al « Piano per l'incremento dell'occupazione operaia » non era un'industria semplice, come potrebbe far credere il fatto che in Italia si trovavano quasi dappertutto materiali da costruzione abbondanti, piccole o medie aziende edili, e manodopera largamente disponibile, se pure non specializzata.

In realtà un piano edilizio nazionale, di vastissime dimensioni, proteso ad operare in tutte le zone d'Italia, con caratteristiche mai viste in precedenza, era destinato ad incontrare una quantità di complicazioni.

Costruire è un'impresa complessa, con cicli di produzione non brevi, che richiedono una gamma di operazioni: scegliere l'area, disegnare il progetto, provvedere all'appalto, alla direzione dei lavori, al collaudo, alle sistemazioni esterne, agli allacciamenti, ecc. Se poi invece di una casa singola bisogna costruire un gruppo di case, le difficoltà si moltiplicano: la scelta dell'area diventa una operazione di grande impegno; le sistemazioni esterne e gli allacciamenti vengono ad incidere sui costi più della stessa area nuda, occorre provvedere ad una quantità di servizi collettivi di ogni genere.

Ora, l'INACASA doveva mettere in moto nel più breve termine possibile una macchina capace di costruire 25 mila alloggi l'anno in migliaia di comuni, alloggi forniti di tutti gli impianti, sistemati in aree ben servite e collegate con i centri di lavoro.

L'edilizia pubblica o sovvenzionata non contava ancora, in Italia, nemmeno venti anni di vita; e questi problemi, salvo qualche eccezione, li aveva affrontati solo su piccola scala; la stessa legislazione era impreparata ad una parte di essi.

Inoltre, l'edilizia sovvenzionata non si era mai posta prima di allora problemi così complessi per l'assegnazione degli alloggi. L'INACASA invece doveva seguire una severa e rigida procedura, da mettere in moto contemporaneamente in migliaia di località: pubblicazione del bando, formazione della graduatoria provvisoria, esame dei ricorsi,

graduatoria definitiva, assegnazione dei vari tipi di alloggi secondo certi criteri, scambi fra alloggi, passaggi da locazione a riscatto e viceversa, e così via.

Anche nel settore amministrativo, la costruzione di una casa è un fatto complesso che esige lo svolgimento di pratiche particolari come la stipula del contratto di acquisto del terreno e del contratto di appalto, la tenuta della contabilità di cantiere, la successiva definizione dei costi dopo il collaudo, la caratura, l'accatastamento, i contratti di affitto o di vendita con gli assegnatari degli alloggi, i contatti con questi ultimi, la manutenzione, ecc. Ma quando queste pratiche, ognuna delle quali esige una specifica trattazione che può presentarsi con modalità del tutto particolari, ammontano contemporaneamente a decine di migliaia, e per poterle svolgere bisogna essere presenti ed attrezzati in tutte le zone d'Italia, il problema diviene enormemente più complesso.

Abbiamo passato in rivista le varie fasi dell'attività di un Piano edilizio nazionale come quello dell'INACASA, che si raggruppano quasi automaticamente in tre grandi settori: la costruzione, l'assegnazione degli alloggi, l'amministrazione; e in quest'ultimo campo occorre aggiungere che l'INACASA doveva provvedere anche ai decreti di occupazione temporanea, agli eventuali espropri delle aree, e a una quantità di altre operazioni che non si presentano nella normale attività edilizia.

Ora, considerando il tempo occorrente per istituire i vari organi necessari a svolgere queste funzioni, se si volevano evitare forti ritardi nella realizzazione del Piano si doveva far ricorso ad attrezzature già pronte. Questa era anche l'unica strada per evitare la creazione di un nuovo e complesso organismo burocratico.

Tale esigenza fu intuita molto chiaramente dalla Legge, la quale prevede che per quasi tutte le funzioni esecutive si affidasse l'incarico a Enti Pubblici preesistenti, riservando ai due Organi centrali, il Comitato di Attuazione e la Gestione INACASA, soprattutto compiti normativi, di propulsione e di controllo.

I due Organi centrali

La ripartizione dei compiti centrali, di direzione del Piano, fra due Organi distinti, il primo deliberativo, il secondo prevalentemente esecutivo, è una delle poche norme della Legge istitutiva che siano passate senza modifica attraverso tutte le fasi del travagliato « iter » parlamentare.

La duplicità degli Organi nacque soprattutto dall'esigenza, sottolineata dalla Legge, di conferire al Piano la facoltà di darsi in forma autonoma le norme necessarie e di aggiornarle continuamente.

Ne conseguì la necessità di prevedere, accanto al Consiglio Direttivo della Gestione INACASA - Ente pubblico dotato di propria personalità giuridica ed incaricato di sovrintendere a tutte le complesse attività esecutive -, un Comitato di attuazione avente dignità di Organo dello Stato, e quindi atto a svolgere funzioni come l'emanazione di norme, la distribuzione dei fondi e degli incarichi, la vigilanza generale, che avevano tutti i caratteri delle funzioni statali.

I due Organi godevano di una larga autonomia ma erano posti considerate le strette finalità sociali del Piano, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, la cui approvazione era indispensabile per rendere esecutivi i piani di costruzione deliberati dal Comitato.

In ciascuno dei due Organi, appunto in funzione dello spirito di solidarietà sociale che animava il Piano, erano rappresentate tutte le categorie interessate alla sua attuazione: datori di lavoro, lavoratori, associazioni tecniche, Pubbliche Amministrazioni; e ciò assicurava che i criteri di attuazione fossero ispirati agli interessi e alle esigenze dei destinatari del Piano stesso.

Sulla collaborazione dei due Organi così si esprime la Relazione del Comitato sull'Esercizio 1952-1953:

Il procedere dell'attività dell'INACASA, accanto alla necessità di formulare nuove norme man mano che venivano affrontate le singole fasi operative, iniziali e finali, ha richiesto in misura sempre crescente un'ulteriore attività normativa per aggiornare ed adeguare le norme già formulate, in base ai suggerimenti della pratica applicazione.

In questo continuo processo di revisione, l'INACASA ha potuto operare con una notevole risolutezza grazie alla struttura istituzionale dei suoi Organi direttivi. Infatti la larga rappresentanza accordata alle categorie contribuenti nella composizione sia del Comitato di Attuazione che del Consiglio Direttivo della Gestione ha consentito ad entrambi — nel compito normativo del primo e nell'articolazione dell'attività esecutiva da parte del secondo — di mantenere assiduamente il contatto colle categorie interessate; e attraverso l'immediata valutazione delle conseguenze pratiche dei singoli provvedimenti l'attività normativa è venuta gradualmente completandosi, in modo che ciascuna operazione può svolgersi, sempre nel quadro della Legge, ma sui binari di una regolamentazione precisa, tale da assicurare assoluta obiettività all'azione ed unità di indirizzo ai vari Enti che collaborano, nei diversi settori, all'attuazione del Piano.

A questo proposito vale la pena di ricordare come l'adeguamento delle norme sia il risultato di un dialogo continuo fra i due Organi, dialogo attraverso il quale gli indirizzi e le norme stabiliti dal Comitato vengono attuati dalla Gestione, la quale li riporta al Comitato ogniqualvolta lo studio di provvedimenti di attuazione o lo svolgersi dell'esperienza suggeriscono aggiunte, semplificazioni o emendamenti; si perviene così, attraverso un processo continuo di limatura di orientamenti e di azioni, al consolidamento di tecniche operative appropriate per ciascun aspetto dell'attività della Gestione.

Entrambi gli Organi erano rappresentati anche nella Commissione Tecnica Consultiva che fu di volta in volta interpellata su numerose questioni (criteri di costruzione, Albo dei progettisti, adozione di particolari strutture e materiali, ecc.).

I compiti di costruzione

Ed ecco, intorno agli Organi Centrali del Piano, distendersi la larga cerchia dei collaboratori periferici. Fra essi, occorre in primo luogo ricordare le Stazioni Appaltanti, che avevano compiti essenziali nel campo delle costruzioni (come poi dell'amministrazione degli alloggi in locazione), svolgendo anche opera di coordinamento locale fra le altre attività del Piano.

Fra le Stazioni Appaltanti, la Legge istitutiva elencava l'Istituto per la Previdenza Sociale, le Amministrazioni dello Stato per i rispettivi dipendenti, l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari. A tutti questi potevano essere aggiunti altri Enti pubblici o di diritto pubblico, come l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, le Amministrazioni Comunali e Provinciali, Consorzi e Cooperative di produzione e di consumo.

In ciascun piano annuale, a partire da quello iniziale, era prescritto che il Comitato indicasse gli Enti incaricati delle costruzioni, e per ciascuno di essi il numero degli alloggi da costruire e i termini d'inizio e di ultimazione delle costruzioni.

Ogni Stazione Appaltante, non appena assicurata la disponibilità dell'area prescelta e ottenuta l'approvazione del progetto, aveva il compito di svolgere la gara di appalto e di effettuare poi la consegna dei lavori all'impresa, stipulando direttamente con essa un apposito contratto, sulla base del capitolato INACASA.

La Stazione Appaltante conservava però in ogni cantiere la direzione dei lavori e la piena responsabilità della realizzazione del progetto, sia per la parte tecnica che per la parte economica, sostituendosi dunque alla Gestione. Essa non esauriva il suo compito se non quando, ultimati i lavori ed eseguite le operazioni di collaudo, la Gestione non avesse approvato le risultanze del collaudo stesso.

Sempre in armonia con i criteri di decentramento, l'INACASA ammise la possibilità per le Stazioni Appaltanti di adottare i propri capitolati al posto del suo capitolato tipo, e per consentire alle Direzioni dei lavori di utilizzare al massimo le proprie esperienze e metodi. A tutti questi Enti il Piano assicurò un quantitativo stabile di lavoro e in virtù dei continui contatti con la Gestione, che, specie inizialmente, indirizzava in ogni fase la loro opera, li mise nelle condizioni di consolidarsi e di attrezzarsi in questo campo con una struttura tecnico-amministrativa adeguata alla nuova attività.


All'inizio il decentramento dei compiti costruttivi alle Stazioni Appaltanti fu accompagnato dal criterio del frazionamento, esteso il più possibile. Il motivo andava cercato nel desiderio di acquisire in partenza la massima collaborazione da parte delle Amministrazioni Comunali e Provinciali e di tutti gli Enti competenti. Ma si voleva anche evitare, nella fase iniziale del Piano, la concentrazione di incarichi che avrebbe potuto forse togliere agilità alla formazione e applicazione delle norme.

In un secondo tempo, la Gestione fu in grado di segnalare al Comitato le Stazioni Appaltanti che avevano dato prova di funzionare nel modo più sicuro ed efficiente, onde si poté giungere a una riduzione del loro numero e nel tempo stesso a una estensione dei compiti ad esse affidati, il che consentì di semplificare notevolmente il lavoro di controllo della Gestione INACASA. (Il numero delle Stazioni Appaltanti, che nel piano del primo anno era di 594, alla fine del Primo Settennio era sceso sotto il centinaio).


Per contro, in base ai nuovi criteri di programmazione anticipata, gli incarichi alle Stazioni Appaltanti vennero affidati, nel Secondo Settennio, in un unico blocco o al massimo in due, in modo che gli Enti potessero organizzare il loro lavoro nell'ambito della provincia, su una base poliennale.

L'effettivo decentramento di questo complesso di compiti a Enti periferici diversi fu reso possibile dalla nomina di un certo numero di Ispettori tecnici, che tennero contatti con i vari Enti allo scopo di studiare e risolvere in loco, e con contatti diretti, ogni intoppo

SVILUPPO DELLE ENTRATE NEL 1° E NEL 2° SETTENNIO IN MILIARDI DI LIRE

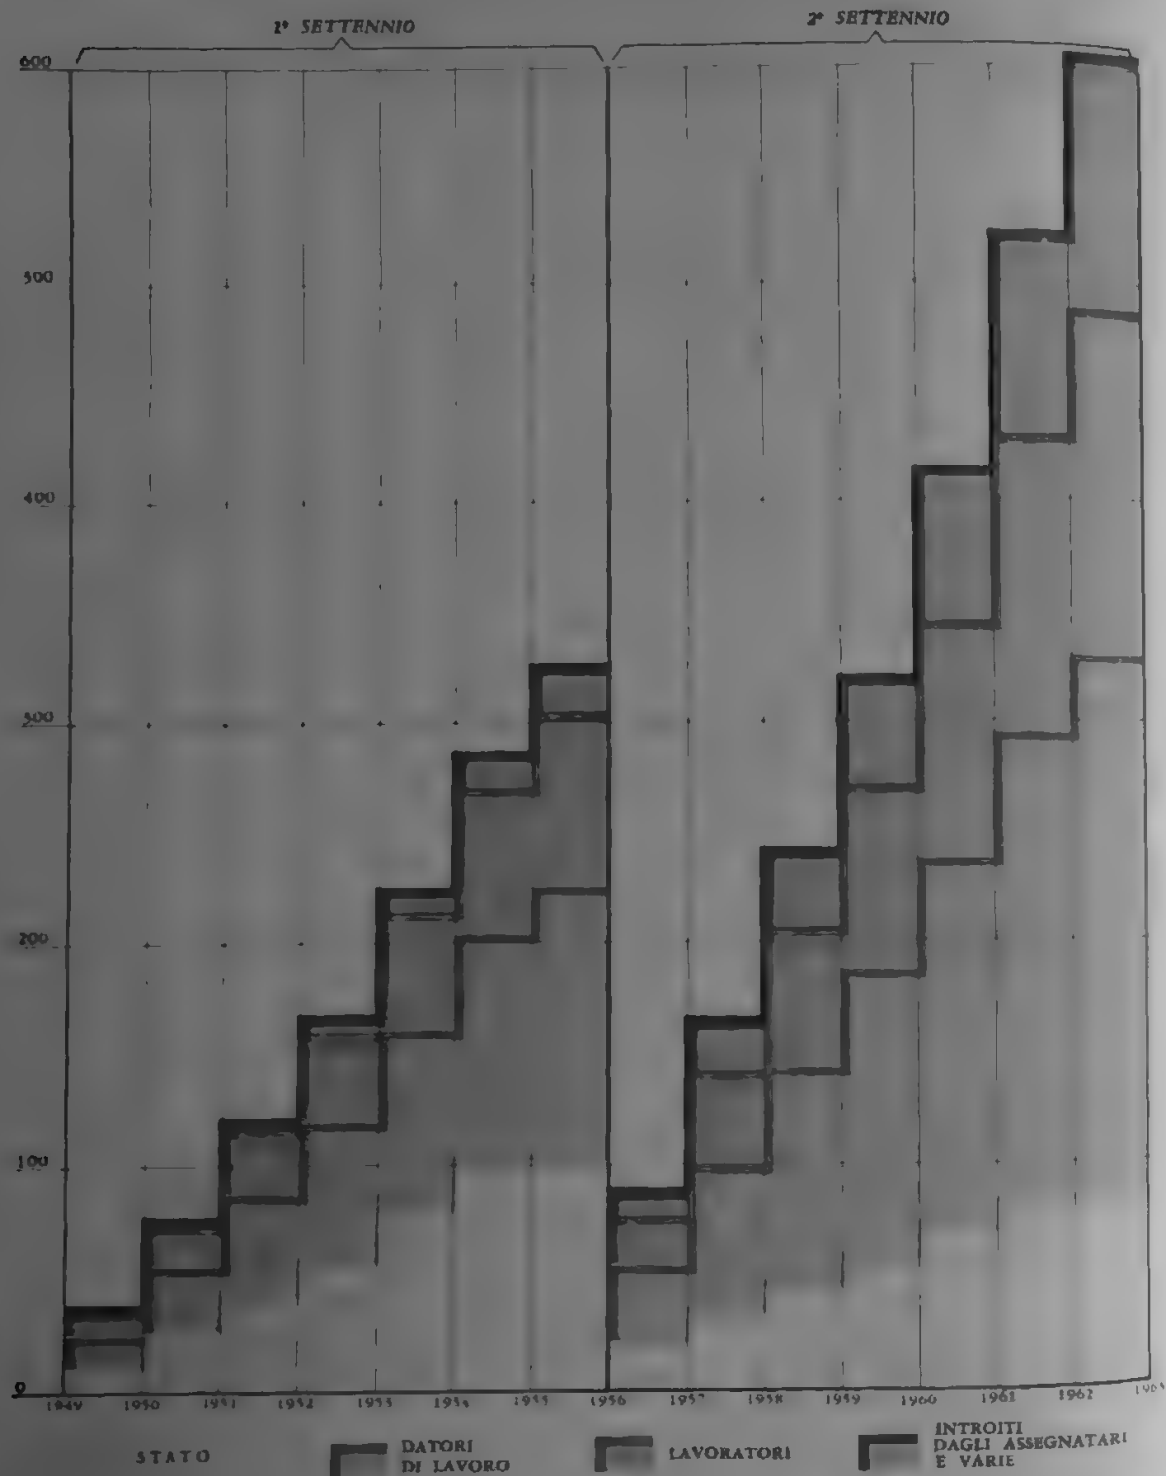

IMPORTANZA DELLE VARIE FONTI DI ENTRATE NEL 1° E NEL 2° SETTENNIO

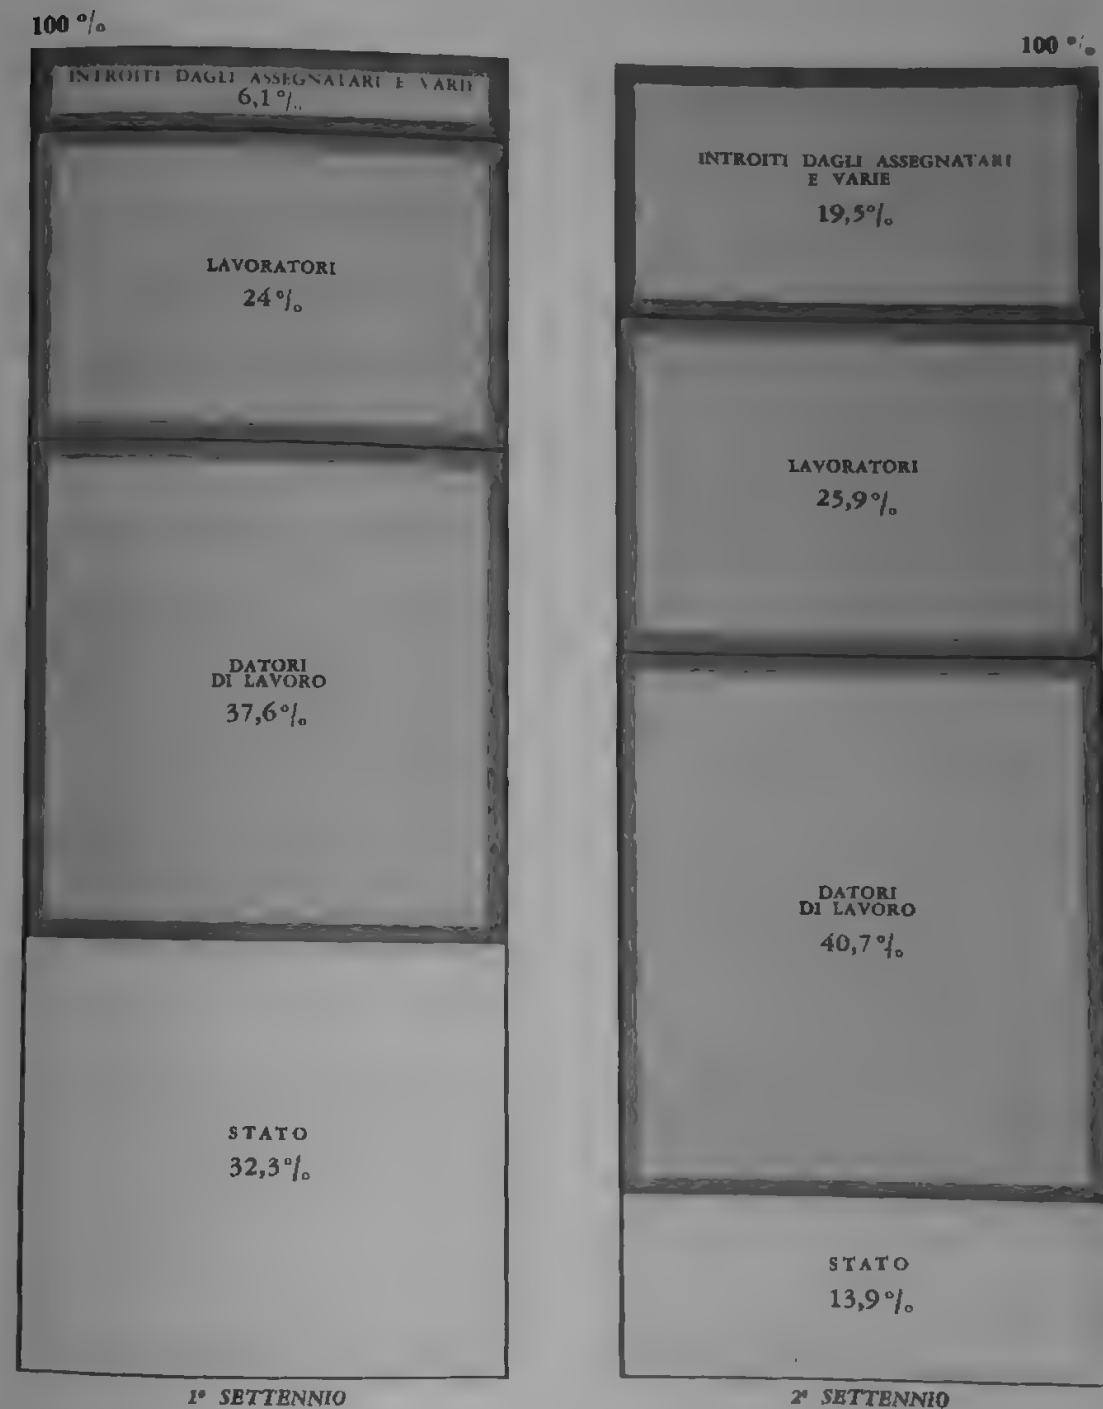

all'attuazione del Piano. L'INACASA si riservava di svolgere un controllo sulle costruzioni sia attraverso le revisioni degli stati di avanzamento, delle perizie suppletive e delle richieste di proroga, sia con ispezioni e revisioni periodiche del lavoro svolto e dell'occupazione operaia. Nell'ultima parte di questa pubblicazione, a pag. 415, si è dedicato un apposito capitolo alle « Modalità relative alla fase di costruzione » nel corso del quale si sono elencate le principali Stazioni Appaltanti precisando in dettaglio i compiti loro affidati e le relative modalità.

Agli stessi criteri di decentramento si ispirarono gli Organi del Piano per la progettazione degli edifici, come avremo occasione di dire più ampiamente negli appositi capitoli a pag. 79 e a pag. 409. Qui ci limiteremo ad accennare che l'INACASA batté una strada radicalmente nuova rispetto alle esperienze precedenti: evitando la creazione di grandi uffici tecnici centralizzati, mobilitò l'iniziativa di un notevole numero di architetti opportunamente scelti, ai quali la Gestione suggerì vari schemi di costruzione indicativi, corrispondenti alle esigenze fondamentali di alcuni tipici « modi di vivere ». Quando poi si giunse a progettare interi quartieri, si affidarono gli incarichi anche attraverso la forma degli appalti-concorso, anziché ai singoli o a gruppi di architetti già spontaneamente costituiti e forniti di esperienze fra loro complementari.

Largo decentramento

Come si è cercato di rendere visivamente nel grafico di pag. 34, il decentramento si estendeva a tutti i rami dell'attività dell'INACASA (si veda anche nell'ultima parte di questa pubblicazione, a pag. 402, un'analisi dettagliata del grado di decentramento dei compiti esecutivi).

Allo scopo di semplificare l'amministrazione e di ridurre le spese generali della Gestione, la Legge aveva incaricato dell'esazione dei contributi dei lavoratori e datori di lavoro gli

Enti assicuratori per le malattie (che nei due settenni riscossero per conto dell'INACASA una somma di 600 miliardi). Per la ricerca delle aree e la realizzazione dei servizi si ricorse alle Amministrazioni Comunali; per le stime agli Uffici Tecnici Erariali; per le pratiche di occupazione temporanea e di acquisizione agli Ispettorati Generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni. E andrebbero qui aggiunti i compiti affidati a varie categorie professionali, dalla rilevazione dei terreni alla documentazione dei trapassi di proprietà, ai collaudi degli edifici costruiti.

Nettamente decentrate furono anche le attività relative all'assegnazione degli alloggi, che venivano svolte in ciascuna provincia dagli Uffici del Lavoro e da apposite Commissioni Provinciali, a partire dalla pubblicazione dei bandi per giungere alla formazione delle graduatorie, alla stipula dei contratti di assegnazione, alle consegne, ecc. Gli stessi Uffici del Lavoro disponevano direttamente per l'assegnazione degli alloggi rimasti disponibili a seguito di rinuncia o decadenza. Alle Amministrazioni Comunali fu anche decentrato il compito di ripartire le assegnazioni, eventualmente, tra le varie frazioni del Comune. Una Commissione Centrale fu tuttavia costituita per assicurare una opportuna uniformità d'indirizzo fra le varie Commissioni Provinciali.

Del resto, anche l'attività normativa accentrata negli Organi responsabili del Piano si giovò di un largo sistematico ricorso alle consultazioni, in sede provinciale o locale, delle autorità, delle organizzazioni, degli esperti ed esponenti delle categorie interessate. Consultazioni regolari che concernevano, sia la distribuzione delle costruzioni, sia la differenziazione, a seconda delle località, dei costi massimi, le aliquote di fitto, la durata dei periodi di riscatto entro i massimi consentiti, ecc. Gli interessati all'attuazione del Piano, esperti ed assegnatari, vennero anche interpellati attraverso apposite, ripetute inchieste, con le quali furono colte informazioni ed elementi di giudizio su diversi aspetti della attuazione del Piano, come i seguenti: effetti della compressione esercitata sui costi di costruzione nei riguardi della qualità degli edifici e degli alloggi; esame di talune soluzioni tecniche; risultati dei criteri urbanistici seguiti nella progettazione dei complessi

INACASA; grado di apprezzamento degli assegnatari per certe caratteristiche dei complessi edilizi, delle unità immobiliari, degli appartamenti loro assegnati. Anche su questo punto avremo occasione di tornare più ampiamente nel seguito, quando tratteremo specificatamente « I criteri di costruzione » (vedi pag. 55) e « La progettazione » (vedi pag. 79). Il complesso delle esperienze raccolte mise a disposizione degli Organi del Piano elementi che risultarono preziosi nel perfezionamento dei metodi di lavoro.

Il decentramento stabilito dalla Legge raggiunse lo scopo di dare una notevole elasticità di funzionamento e rapidità di attuazione al Piano, ma comportò ovviamente per i suoi Organi una quantità di problemi di scelta, stimolo, controllo, in ogni settore e in ogni fase d'attuazione. Per restare nel campo delle costruzioni, i problemi si presentavano particolarmente delicati; si trattava infatti di ricorrere all'opera di una gamma notevole di Enti, diversi tra loro per statuto, metodi, esperienza, capacità, temperando il rispetto per le responsabilità da trasferire ad essi ai sensi della Legge con le esigenze del controllo.

3. Caratteri della programmazione

Condizione essenziale al raggiungimento degli obiettivi del Piano era una distribuzione razionale dei mezzi in relazione agli effettivi bisogni. Questo significava anzitutto ripartire le costruzioni sul territorio nazionale in base a criteri assolutamente imparziali ed indiscutibili, accreditando ad ogni provincia un importo calcolato in base agli indici di affollamento, alla misura delle distruzioni belliche, all'ammontare dei contributi versati nella provincia stessa, e, nel Secondo Settennio, agli indici della disoccupazione locale. Ma significava anche ripartire equamente i fondi disponibili per ogni provincia fra capoluogo e altri comuni, e poi fissare il contingente di ciascun comune, salvo riequilibrare ancora, con un ultimo piano di assestamento, la situazione delle province che avessero ricevuto, a conti fatti, troppo o troppo poco.

Finalmente, la giustizia distributiva doveva essere raggiunta anche nell'atto ultimo — e più importante — del Piano, l'assegnazione ai singoli delle nuove case: si dovevano riservare gli alloggi a coloro che veramente e indiscutibilmente ne avessero più bisogno: in primo luogo, alle famiglie sprovviste di abitazione, o che abitassero in alloggi di fortuna o coabitassero in condizioni di più grave affollamento.

Per questa via, e seguendo rigidamente questi criteri, si poteva ottenere, presumibilmente, che i fondi disponibili venissero usati in modo da portare il massimo contributo al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.

L'impegno di ripartire le costruzioni sul territorio nazionale secondo gli indici del bisogno comportava per il Piano una speciale difficoltà: non era possibile seguire, come avviene normalmente nell'edilizia privata, le possibilità, le facilitazioni, i vantaggi che si potessero presentare nell'una piuttosto che nell'altra zona, era necessario invece stabilire per prima cosa l'importo delle costruzioni assegnate a ciascuna località, e impegnarsi poi ad eseguirle, quali che fossero le difficoltà ivi incontrate. Questo impegno accentuava una difficoltà già insita, per natura, in un piano di così gran mole rivolto ad un settore — quello edilizio — il quale comportava, come si è visto, un ciclo di lavorazione relativamente lungo e una vasta serie di operazioni tutte delicate.

Ottenere, in questo settore così complesso, un ritmo celere di realizzazioni simultanee in tutte le parti del territorio nazionale — e non solo nelle zone più agevoli e meglio attrezzate — costituiva un'impresa veramente ardua.

Appare quindi interessante esaminare più da vicino quali siano state, in questo campo, le caratteristiche e i risultati dell'azione svolta dal Piano, vedere in particolare se gli Organi dell'INACASA siano riusciti a mantenersi fedeli, nonostante tutto, al proposito di distribuire le costruzioni nelle varie zone del territorio nazionale in base agli indici del bisogno; e vedere anche se, nonostante ogni difficoltà, siano riusciti o meno a mantenere alle realizzazioni un ritmo celere e costante, impedendo che un Piano per l'incremento dell'occupazione operaia finisse per ristagnare dando luogo al formarsi e al perdurare di giacenze non utilizzate.

Ripartizione sul territorio nazionale

Per quanto riguarda la ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, le direttive indicate dalla Legge furono seguite dagli Organi del Piano con un rigore estremo, come risulta dall'esposizione particolareggiata di pag. 399. Sarà sufficiente accennare che i criteri distributivi furono sintetizzati in una formula matematica, nella quale figuravano come variabili gli indici previsti dalla Legge. Però si volle anche tener conto, ai fini di una giustizia distributiva il più possibile rigorosa, della densità degli interventi operati nelle varie zone dall'edilizia sovvenzionata in genere. E poiché, come è noto, le costruzioni sovvenzionate si concentrano, di solito, nei capoluoghi di provincia, si volle introdurre un correttivo che giocasse in tale ipotesi a favore dei centri minori, assegnando a questi quote più elevate che ai capoluoghi, e facendo beneficiare del Piano — per una certa aliquota — anche i piccoli comuni. Per avere un'idea della disseminazione capillare delle costruzioni INACASA in rapporto ai contributi versati, si pensi che nei piani furono inclusi diversi piccoli comuni a ciascuno dei quali fu assegnata la costruzione di due alloggi soltanto.

Com'è noto, le Aziende erano state ammesse a partecipare al Piano, costruendo direttamente alloggi per i propri dipendenti. Le località in cui queste costruzioni dovevano sorgere venivano indicate dalle Aziende medesime, in relazione al fabbisogno presente delle loro maestranze e ai prevedibili sviluppi della loro attività. Per tale via il Piano poté portare un contributo non trascurabile all'accrescimento della mobilità della mano d'opera, che troppo spesso è inceppata dalla deficienza di alloggi nei centri di lavoro.

In seguito, parlando dell'« INACASA in cifre » (pag. 142) avremo modo di vedere quale è in definitiva risultata, alla fine dei 14 anni, la ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni del Piano; quale quota abbia avuto, in concreto, ogni provincia ed ogni città dei 936 miliardi distribuiti, che nel complesso corrispondono a 355 mila alloggi e a quasi 2 milioni di vani. Nelle Tav. 5 e 6 sono riportati i confronti regionali, nelle Tav. 27 e 28 i dati provinciali. Ma, per un'idea generale e diremmo plastica, rinviemo anzitutto il lettore al Grafico di pag. 66.

Programmazione anticipata al massimo

Consideriamo ora la seconda esigenza fondamentale, quella di mantenere, nonostante tutti gli ostacoli, un ritmo rapido e possibilmente stabile, sia nel costruire, sia nel distribuire le costruzioni, ciò che era condizione indispensabile alla buona riuscita del Piano. Bisogna constatare anzitutto che la pianificazione dell'INACASA fu rivolta, in modo sempre più accentuato, ad anticipare le fasi iniziali (programmazione, primi stanziamenti, ricerca delle aree, preparazione dei progetti edilizi), in modo che le successive fasi della costruzione vera e propria, e quell'erogazione dei fondi che doveva contribuire per sua parte a stimolare l'economia nazionale, avvenissero, a loro volta, il più rapidamente possibile.

L'esempio di questa volontà di anticipazione dei tempi **partiva dallo Stato medesimo**, che, secondo l'art. 25 della Legge istitutiva, doveva **anticipare, a copertura dei contributi da esso dovuti, una quota annua di 15 miliardi per sette esercizi, con riserva di congruaglio finale: la quota fu portata nel Secondo Settennio a 12 miliardi annui**).

Il piano del primo anno, composto del piano iniziale di 31,6 miliardi e del piano integrativo di 67,2 miliardi per un totale, dunque, **di quasi 100 miliardi da impiegare nella costruzione di 50.000 alloggi**, approvato dal Comitato di Attuazione fin dai primissimi mesi di vita dell'INACASA, impegnava in anticipo i contributi previsti per un intero triennio. In altre parole, si adottò immediatamente, — **quando ancora il meccanismo del Piano non aveva affrontato il vaglio dell'esperienza — una politica di programmazione basata su stanziamenti che precorrevano l'afflusso dei contributi per un ampio periodo avvenire.**

Uno dei più importanti fattori della rapida realizzazione del Piano deve venire appunto ricercato in questa programmazione a larghissimo anticipo (vedi Grafico a pag. 98).

Quanto ai modi e ai tempi da seguire per l'anticipazione dei programmi, l'esperienza dimostrò che l'acquisizione dell'area non era sufficiente **per formulare previsioni abbastanza precise sui tempi di esecuzione**, essendo assai variabile il tempo occorrente per la progettazione e per l'approvazione dei progetti da parte dei Comuni. Il Comitato adottò pertanto il criterio di includere lo stanziamento dei fondi in un dato piano annuale solo quando il progetto esecutivo delle costruzioni fosse già approvato dalla Gestione. Pertanto le decisioni del Comitato ebbero luogo in due tempi. Dapprima si **procedeva alla « programmazione », fissando le località in cui costruire e gli Enti appaltanti, senza indicazioni di limiti di tempo**. In un secondo tempo aveva luogo lo stanziamento formale, che autorizzava l'apertura dei cantieri e stabiliva un termine massimo per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni.

La relazione del Comitato sull'esercizio 1952-53 così chiarisce il meccanismo adottato:

Effettuata la comunicazione del programma agli Enti interessati, il Comitato procede allo stanziamento formale dei fondi solo in un secondo tempo, cioè quando sono state completate le operazioni preliminari relative alle aree, ed elaborati i corrispondenti progetti. In pratica, i pagamenti iniziano in media dopo diversi mesi e si completano in circa trenta mesi dallo stanziamento; si verifica quindi che i pagamenti relativi a ciascun piano vengono in gran parte effettuati dopo il periodo alla cui competenza — come afflusso di contributi — il piano stesso era stato riferito, ciò che consente di anticipare i piani successivi.

Contribuì a dare fin dall'inizio forte impulso al Piano la facoltà concessa alle Aziende di costruire con i benefici del Piano stesso case riservate ai propri dipendenti, a condizione che anticipassero e riversassero subito in tali costruzioni i contributi che per Legge dovevano versare nell'intero settennio (si vedano al riguardo le ampie informazioni riportate a pag. 419). Interessanti programmi di costruzioni per i propri dipendenti furono realizzate anche, su vasta scala, da Pubbliche Amministrazioni.

Il largo favore incontrato presso le Aziende italiane da tali disposizioni (dalla Tav. 30 risulta come esse abbiano costruito case per oltre 100 miliardi), contribuì non poco a far sì che il Piano « partisse di scatto » e ponesse quindi rapidamente in azione quella spirale ininterrotta di piani successivi ad importi crescenti che fu edificata sulla base della fiducia ispirata dall'INACASA nei Comuni, nelle Stazioni Appaltanti, nelle Aziende, nelle Cooperative. Il Regolamento di attuazione della Legge istitutiva porta la data del 4 luglio 1949. Il primo cantiere dell'INACASA fu aperto a Colleferro nello stesso mese. La prima consegna di alloggi alle famiglie avvenne a Padova nel dicembre dello stesso anno.

La fiducia di cui si è detto provocò subito una larga offerta di aree, e quindi la possibilità di estendere sempre più rapidamente l'attività del Piano, evitando il rischio — che poteva essere assai grave — di un arenamento iniziale.

Perfezionamento della programmazione

L'esperienza accumulata nei primi anni consentì di perfezionare e ulteriormente accelerare l'intero sistema di programmazione. Ad esempio, si comprese l'opportunità di programmare fin dall'inizio tutte le residue disponibilità del Primo Settennio. Programmare significava indicare in anticipo le località in cui costruire, l'entità dei fondi da impiegare in ciascuna, i tipi di costruzione da adottare con i relativi costi massimi a vano, gli Enti incaricati di costruire.

È bensì vero che la programmazione anticipata si rivelò di per sé insufficiente ad assicurare una rapida realizzazione del Piano. Soprattutto — come si vedrà — la difficoltà di reperire le aree si rivelò un ostacolo tale da rallentare gravemente l'intero ritmo delle realizzazioni. Anche le procedure per l'emissione dei decreti di occupazione temporanea non erano rapide, né riuscivano a ridurre i tempi dell'effettiva utilizzazione dell'area.

A questa lentezza si pose in parte rimedio con un altro provvedimento, acquistando cioè aree in misura superiore a quella necessaria alle costruzioni per cui era stato effettuato già lo stanziamento, così da costituire in tempo utile un demanio di aree e dei relativi progetti per i piani futuri. Le costruzioni per le quali le pratiche preliminari erano già pronte venivano incluse nei piani con precedenza assoluta, e quelle non ancora messe a punto spostate nei piani successivi, in modo che non si verificasse — almeno in teoria — alcuno slasamento tra assegnazione dei fondi e inizio effettivo delle costruzioni.

Fu escogitato anche un altro espediente per favorire l'impiego dei fondi là dove più rapida se ne presentava l'utilizzazione: quello di autorizzare le Stazioni Appaltanti a costruire alloggi in numero superiore alla quantità già programmata, purché tali integrazioni si mantenessero entro determinati limiti e favorissero una migliore utilizzazione dell'area e del progetto approntati. In generale, si era pronti ad accogliere, anche al di là del contingente programmato, le eventuali nuove iniziative di Aziende e Cooperative, sia nel piano normale che in quello Aggiuntivo. Ciò portò in definitiva ad estendere gli impegni della

programmazione al di là degli stessi limiti di ciascun Settennio. Avvenne cioè che una parte dei fondi del Secondo Settennio fu programmata quando ancora era in corso il Primo e che durante il Secondo Settennio furono programmati fondi relativi a un periodo che si estendeva al di là del termine del Piano. Questa politica decisa ed audace fu appoggiata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sempre pronto ad agevolare e incoraggiare le iniziative dell'INACASA.

Si era notato che in un certo numero di casi gli alloggi già ultimati non potevano ancora venire assegnati, perché le Commissioni Provinciali incaricate di formare le relative graduatorie protraevano i loro lavori, per lo scrupolo lodevole di assicurare ai concorrenti ogni più ampia garanzia di giustizia, dando loro la facoltà di ricorrere contro le graduatorie provvisorie. Si provvide allora a sintonizzare le due fasi — del costruire e dell'assegnare — anticipando la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione degli alloggi al 60° giorno dall'inizio dei lavori. Una misura in apparenza normale, ma che in realtà deve essere considerata coraggiosa, poiché costringeva gli Organi del Piano ad assumere pubblicamente impegni per realizzazioni che rischiavano di venir ritardate, o addirittura annullate, da ostacoli del tutto imprevisi e imprevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno. Per realizzare la sincronizzazione delle varie fasi del lavoro, si affidò alle Stazioni Appaltanti il compito di mantenere contatti sistematici con gli Uffici del Lavoro, onde ottenere che essi anticipassero via via le graduatorie relative alle costruzioni più avanzate. Infine, le pratiche per l'assegnazione furono collegate automaticamente all'avvio delle pratiche per la futura amministrazione degli alloggi.

Lo stesso piano Aggiuntivo (si vedano gli ampi ragguagli riportati a pag. 421) va considerato come inteso a determinare una anticipazione dei piani di programmazione, perché i lavoratori che ne beneficiavano accettavano di versare le quote di riscatto in un periodo di tempo inferiore a quello previsto nei piani normali. Anche nell'ambito del piano ordinario, del resto, si concessero particolari agevolazioni a quegli assegnatari i quali manifestassero l'intenzione di anticipare il versamento delle proprie quote di riscatto.

Le tecniche operative del Piano

Il complesso delle norme e dei criteri organizzativi adottati dall'INACASA ai fini della pianificazione, ripartizione dell'attività costruttiva nello spazio e nel tempo secondo il bisogno, anticipazione nei programmi per mantenere ininterrotto il ritmo di lavoro, coordinamento della fase costruttiva con le assegnazioni e l'amministrazione — si venne via via affinando in base all'esperienza. Col progredire dell'attività queste norme finirono per costituire un complesso di « tecniche operative » caratteristiche del Piano, che per buona parte del Primo e del Secondo Settennio consentirono di ottenere, nel complesso, buoni risultati.

Il coordinamento delle varie fasi raggiunse la sua cadenza più serrata nel cuore del Primo Settennio e nel cuore del Secondo. Nel primo di questi periodi, il Piano riusciva, ogni settimana, a progredire con un passo — pressoché uniforme nelle varie fasi — valutabile a circa 500 alloggi la settimana, sia che si trattasse di nuovi appalti, sia di ultimazione di alloggi, di assegnazioni, di consegne. Nel cuore del Secondo Settennio questo ritmo settimanale divenne ancora più rapido: 700 alloggi la settimana. Viceversa, al momento dell'avvio di ciascun piano settennale e nelle fasi conclusive, in cui restavano da affrontare le situazioni più difficili, rimaste fatalmente arretrate, si dovettero registrare rallentamenti e inceppamenti, quasi perdite di colpi nel motore del Piano. In certi periodi si accumulò la lotta per la carenza di fondi non ancora utilizzati, in altri si dovette ricorrere a finanziamenti esterni.

Nonostante tutte queste difficoltà, sembra giusto riconoscere che il Piano nel suo complesso è riuscito ad attuare un rapido sviluppo delle costruzioni e — per un buon numero di anni del Primo e del Secondo Settennio — una discreta regolarità del ritmo realizzativo nelle varie regioni.

Chi voglia oggi, a ciclo compiuto, valutare con una certa esattezza e in quella prospettiva che ormai è possibile i risultati raggiunti dal Piano INACASA in 14 anni — sia sotto gli aspetti positivi che nelle eventuali carenze — dovrà inserirli in un quadro generale della vita economica italiana in quel periodo. Quale è stato il peso specifico del Piano nell'attività produttiva di quegli anni che, per riconoscimento ormai unanime degli osservatori, hanno visto l'Italia sollevarsi dalla miseria e dal disordine del dopoguerra al cosiddetto miracolo economico?

L'occupazione operaia

Poiché il Piano si propose anzitutto di combattere la disoccupazione operaia, vediamo quali risultati concreti sia riuscito a conseguire in questo campo.

Dal normale avvio delle costruzioni, nel 1950, a tutto il 1962, i 20.000 cantieri del Piano hanno richiesto 102 milioni di giornate-operaio (Tav. 9), con una media annua di 7,8 milioni. Tale cifra rappresenta poco meno del 10 per cento del totale delle giornate-operaio occupate nel complesso delle opere pubbliche realizzate durante lo stesso periodo, e circa il 45 per cento delle giornate impiegate in opere pubbliche rientranti nel settore delle abitazioni; (la Tav. 10 indica anno per anno l'incidenza della occupazione operaia registrata nei cantieri dell'INACASA sull'occupazione nelle opere pubbliche). Bastano questi dati, crediamo, per dare al Piano il posto che gli spetta nel quadro degli interventi dello Stato rivolti ad aumentare l'occupazione.

La media annua di 7,8 milioni di giornate-operaio che il Piano ha direttamente prodotto, corrisponde all'occupazione stabile di almeno 40.000 lavoratori edili l'anno. Se si ricorda che la disoccupazione nel settore edile si aggirava all'inizio intorno alle 300 mila unità, si avrà la misura del contributo dato dal Piano alla lotta contro la disoccupazione in questo specifico settore.

Hanno potuto lavorare alla realizzazione degli alloggi INACASA lavoratori della maggioranza dei comuni italiani: infatti sono stati aperti cantieri in 5.036 comuni. Tav. 28. Tassi al 100 per cento del totale: 89 per cento nel Mezzogiorno, 91 per cento in Puglia. L'ente "nazionalmente" e universalmente disegnatore delle costruzioni INACASA del Centro nord e sud, ha ricevuto una larghissima partecipazione anche alle imprese edili più consistenti del Mezzogiorno, secondo l'INACASA dato il suo sistema di sollecito pagamento degli sconti di ristrutturazione.

La mano d'opera necessaria è stata data ai lavoratori impiegati nelle costruzioni fino al 30 giugno 1961, con un tetto a 35 miliardi per il centro-nord, al 40 per cento del costo complessivo delle costruzioni eseguite da INACASA a tale data.

A questa data, altri 35 miliardi erano stati impiegati per la massima parte in acquisti di materiali e provvisti, non per altro, e per le costruzioni nazionali, producendo ovviamente il risultato, beninteso, di un vero sviluppo generale del reddito e dell'occupazione. Si può, pertanto, a questo proposito, far alcune stime attendibili, l'occupazione di 2 operai per ogni operaio occupato, e la conseguente occupazione di un altro operaio nei settori che producono materiali e provvisti per le costruzioni. Si può così valutare ad oltre 150 milioni di giornate-operaio, l'occupazione che è stata in corso dall'attuazione del Piano. Ma il quadro non è completo, e non si può ancora valutare la salita dei professionisti e dei tecnici chiamati dal Piano, dalle Regioni, dalle Province, dai vari Enti periferici, a collaborare alla costruzione per il centro-nord, partendo dalle operazioni preliminari di studio, di progetto, di direzione e amministrazione e di manutenzione degli alloggi.

Stimolo alla ripresa economica

Come può essere visto, l'opera di costruzione fortemente alla formazione della ricchezza nazionale, e di lavoro, e di sviluppo sociale. Gli investimenti lordi in tale campo rappresentano, nel 1957, il 11 per cento degli investimenti lordi complessivi, e nel

1957 salirono al 27,7 per cento. Risulta chiaro da queste cifre in quale misura l'andamento del settore edilizio possa condizionare lo sviluppo del reddito nazionale complessivo e il suo ritmo più o meno regolare.

Ora, il Piano INACASA ha offerto all'espansione dell'attività nazionale in questo campo un contributo che alcuni dati basteranno a sintetizzare. Gli investimenti da esso operati entro il Primo Settennio (pari a circa 300 miliardi) rappresentano l'11 per cento del totale degli investimenti nell'edilizia (2.829 miliardi) realizzati in Italia in un periodo, si noti, nel quale l'economia nazionale era più debole e bisognosa di stimolo. Nel Secondo Settennio l'incidenza è di circa il 9 per cento, ma l'apparente calo non è dovuto a un rallentamento dell'attività del Piano, bensì allo straordinario sviluppo dell'edilizia privata, e in questo quadro acquista anzi un particolare significato.

Si noti (Tav. 1) che mentre l'importo totale del piano del Primo Settennio è stato di 325 miliardi, dei quali solo 20 affluiscono dai proventi delle nuove costruzioni, vale a dire dalle quote di riscatto e di fitto, nel Secondo Settennio l'importo totale è salito a 605 miliardi. Ma il fatto più importante è che questo aumento lo si deve almeno in parte (vedi Grafici a pag. 16 e pag. 17) ai proventi degli alloggi costruiti, saliti a 118 miliardi (oltreché, beninteso, all'incremento dell'occupazione e dei salari, che ha prodotto un sensibile aumento nel gettito dei contributi). Al termine dei 14 anni di vita del Piano, il patrimonio complessivo delle costruzioni si arricchisce anno per anno, e continuerà ad arricchirsi per 25 anni, secondo lo schema del Piano, con i proventi via via maturati. Questo reddito crescente viene a costituire una specie di fondo di rotazione, messo a disposizione dei lavoratori italiani per aiutarli a risolvere definitivamente il problema della casa.

Le costruzioni dell'INACASA hanno contribuito in misura rilevante a rendere più regolare l'andamento dell'offerta complessiva di alloggi. Non c'è dubbio, ad esempio, che senza le realizzazioni del Piano, negli anni 1958-60 si sarebbe verificata in Italia dapprima una flessione, e poi una stasi, nel numero totale dei nuovi alloggi ultimati.

Miglioramento delle condizioni di abitazione

Durante il periodo in cui ha operato il Piano, l'edilizia nazionale ha compiuto progressi indubbiamente straordinari, che l'esame dei risultati dei due censimenti, 1951 e 1961, permette di porre in evidenza nelle linee essenziali (Tav. 15).

L'aumento del numero delle abitazioni (+ 23,3 per cento) e delle stanze (+ 25,7 per cento) è stato in Italia in quel decennio notevolmente maggiore di quello delle famiglie (+ 6,5 per cento) e degli abitanti (+ 6,2 per cento). In conseguenza, l'affollamento medio, che era rimasto pressoché stazionario tra il 1931 e il 1951, è diminuito notevolmente, scendendo da 1,27 abitanti per stanza, nel 1951, a 1,08 nel 1961. È anche aumentata l'ampiezza media delle abitazioni: da 3,1 stanze a 3,34. Altri indici del progresso: la diminuzione del numero delle famiglie coabitanti con altre (da 750.000 a 600.000) e di quelle viventi in abitazioni improprie (da 220.000 a 120.000) nonché, dato importantissimo ai fini sociali, l'incremento delle abitazioni in proprietà di coloro che le usano (le quali sono passate dal 40 per cento a oltre il 47 per cento del totale).

Il contributo del Piano a questo sviluppo appare notevole (Tav. 8); esso ha realizzato infatti nel decennio tra i due Censimenti (1951-61) 242.000 alloggi, pari al 9,1 per cento dell'incremento complessivo delle abitazioni verificatosi in Italia. L'ampiezza media degli alloggi INACASA è calcolabile seguendo il concetto di «stanza» adottato dall'ISTAT: ad oltre 4 stanze, superiore quindi al dato medio nazionale relativo al complesso delle costruzioni realizzate in Italia nello stesso periodo (3,5). È questo un fatto meritevole di particolare rilievo, dato il carattere e la destinazione squisitamente popolare degli alloggi costruiti dall'INACASA. Indubbiamente rilevante, anche se non sintetizzabile in dati statistici, è stato anche il contributo offerto dal Piano alla diminuzione delle famiglie coabitanti con altre, e all'abbandono delle abitazioni improprie, poiché, come si è detto, nell'assegnazione delle abitazioni furono favorite sistematicamente le famiglie più disagiate.

Da un'indagine eseguita presso gli assegnatari di alloggi INACASA, è risultato che solo il 40 per cento di essi abitava in precedenza una casa normale, mentre il 37,8 per cento, percentuale di una gravità che non è necessario sottolineare, abitava in cantine, o in grotte, o in baracche, o in sottoscala, e il 17,1 per cento coabitava con altre famiglie. In definitiva, con la spesa di una sigaretta al giorno da parte di ogni lavoratore contribuente, l'INACASA ha potuto, nei 14 anni, assegnare la casa nuova a 1 su 24 lavoratori contribuenti nel Centro-Nord, a 1 su 12 nel Sud-Isole. Uno su venti, il più bisognoso della nazione, o peggio da una baracca o da una grotta, in una abitazione nuova e civile, con la possibilità di acquistarla in 25 anni.

L'accesso alla proprietà degli alloggi è stato largamente favorito dal Piano, che ha concesso «a riscatto» quasi il 70 per cento delle abitazioni costruite. Un'alta percentuale, che acquista ancor più significato quando si consideri che gli assegnatari, in gran parte immigrati, provenivano dalle categorie più modeste del Paese (vedi pag. 155).

Le costruzioni eseguite dall'INACASA per un complesso di 350 mila alloggi hanno certamente contribuito in misura notevole ad equilibrare l'offerta alla domanda potenziale di abitazioni da parte delle categorie economicamente meno provvedute. Inoltre le favorevolissime condizioni di fitto e di riscatto a cui gli alloggi furono concessi, hanno svolto un'azione calmieratrice sui prezzi delle case di tipo economico e sulle loro oscillazioni, inevitabilmente influenzate sul mercato libero dalla speculazione, oltreché dal variare dei costi.

Passando ad esaminare sotto l'aspetto territoriale l'incidenza del Piano sullo sviluppo del patrimonio edilizio nazionale, si deve rilevare che essa varia sensibilmente da una regione all'altra: notevolissimo il fatto che sia molto maggiore nelle regioni più povere, dove è maggiore l'affollamento medio nelle abitazioni, e, per converso, assai minore nelle regioni economicamente più evolute, e quindi più progredite anche sotto l'aspetto edilizio. Nel

DECENTRAMENTO ATTUATO NELLE VARIE FASI DI ATTIVITÀ DEL PIANO

FASI DECENTRATE

Elaborazione studi [Ente partecipazioni]	Indicazione aree idonee [Amministrazione Comunale ed altri]
	Proposta area [Stazione appaltante]
	Decreti di occupazione temporanea ed espropri [Prefettura]
	Nomina progettista [Stazione appaltante]
	Predisposizione progetti urbanistici e architettonici [Progettisti e Stazione appaltante per la parte tecnica economica]
	Contratto acquisto area [Ispettorato INA]
	Effettuazione appalti [Stazione appaltante]
	Nomina direttore lavori [Stazione appaltante]
	Vigilanza sui lavori [Stazione appaltante]
	Pubblicazione bandi [Ufficio del Lavoro]
	Approvazione stati avanzamento [Stazione appaltante]
	Esame ricorso contro graduatoria provvisoria [Idem]
	Graduatorie definitive [Idem]
	Pareri sull'applicazione dei criteri di assegnazione [Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi]
	Assegnazione del tipo di alloggi [Ufficio del Lavoro]
	Assegnazione dei singoli alloggi [Ufficio del Lavoro]
	Stipula contratti con assegnatari [Incaricato regionale, Stazione appaltante, Ente amministratore]
	Consegna alloggi agli assegnatari [Idem]
	Vigilanza su amministrazioni autonome alloggi a riscatto [Ente amministratore e Incaricato regionale]
	Amministrazione alloggi in locazione [Ente amministratore]
	Amministrazione alloggi a riscatto [Amministrazione autonoma o Ente amministratore]
	Costruzione negozi [Stazione appaltante]
	Cambio alloggio [Ente amministratore]
	Autorizzazione subaffitto [Ente amministratore]

FASI ACCENTRATE

Formulazione del piano [Comitato]	Approvazione piani [Ministero Lavoro]
	Approvazione aree [Comitato o Gestione]
	Formazione albo architetti [Gestione]
	Coordinamento in sede C.E.P. [Ministero LL.PP.]
	Approvazione prezzo area [Gestione]
	Approvazione progetti [Gestione]
	Autorizzazione appalti [Gestione]
	Ratifica appalti [Gestione]
	Autorizzazione bandi [Gestione]
	Esame perizie suppletive [Gestione]
	Nomina collaudatori [Gestione]
	Approvazione carature [Gestione]
	Approvazione collaudi [Gestione]
	Approvazione costi definitivi [Gestione]
	Esame ricorso contro Gestione [Comitato]
	Convenzione con i Comuni per spazi verdi e servizi [Gestione]
	Esazione rate di riscatto e di locazione [Gestione]
	Passaggio da locazione a riscatto e viceversa [Gestione]
	Gestione Centri sociali [Ente gestione servizio sociale]
	Approvazione bilanci della Gestione [Comitato, Ministero Lavoro, Ministero Tesoro]

decennio tra i due Censimenti del 1951 e del 1961. Tra l'8, il rapporto fra il numero degli alloggi costruiti dall'INACASA e l'incremento totale delle abitazioni risulta massimo in Calabria (18,5 per cento), Abruzzi e Molise (16 per cento), Campania (12,9 per cento). Per contro, l'incidenza minima si ha in Liguria (4,9 per cento). Nel complesso del Centro-Nord, la percentuale delle abitazioni INACASA è stata pari all'8 per cento dell'incremento complessivo, nel Mezzogiorno essa sale al 12 per cento.

Fra i risultati del Piano, deve essere compreso quindi anche il contributo offerto all'attuazione dello squilibrio che ancora esiste nella ripartizione territoriale del patrimonio edilizio del Paese. E i progressi sono stati realizzati soprattutto nelle zone dove più difficile era ottenerli, perché minori erano le possibilità offerte alla iniziativa privata.

Si avverta che di questo incremento hanno beneficiato non solo i Capoluoghi di provincia (come in genere avviene nelle costruzioni dell'edilizia popolare), ma anche molti Comuni minori e addirittura un gran numero di quei piccoli Comuni, i quali più difficilmente sono raggiunti dal miglioramento delle condizioni che il rapido progresso economico generale porta con sé.

I realizzatori del Piano

Il Piano aveva, senza dubbio, una grande risorsa, e cioè la pronta disponibilità dell'importo totale di ogni costruzione, sottratto com'era dall'afflusso regolare dei contributi e, in misura sempre crescente, dal reddito delle costruzioni già ultimate. Ma nonostante questa forza, e o a causa di questa autorità nell'azione, le difficoltà incontrate furono gravi e non sempre superate, o come, almeno in parte, superabili.

Il problema più arduo rimase sempre quello di sincronizzare in modo soddisfacente le operazioni del Piano nello spazio e nel tempo, dalla fase della costruzione a quella della

assegnazione e dell'amministrazione. Le soluzioni adottate nei primi anni per il reperimento di aree nell'ambito dei Piani Regolatori con la collaborazione dei Comuni, a un certo punto non furono più sufficienti. Anche la decisione presa dalla Gestione di effettuare prestiti ai Comuni per la sistemazione degli allacciamenti e dei servizi collettivi nelle aree extraurbane successivamente prescelte, per quanto coraggiosa la si debba giudicare, non bastò in molti casi a ottenere una collaborazione efficiente. In alcune zone le costruzioni o quell'Ente che non aveva mantenuto i propri impegni; in altre zone invece occorreva frenare gli appalti per non superare il contingente stabilito. In alcuni dei nuovi quartieri la costruzione degli allacciamenti, in altri la formazione delle graduatorie di assegnazione non era in fase con la ultimazione delle costruzioni.

È facile valutare a questo punto la mole di lavoro che fu richiesta nel corso dei 14 anni al personale degli uffici centrali del Piano, impegnati in prima linea nella difficile opera di coordinamento.

Si dovettero affrontare, nel rispetto delle procedure e delle regole proprie di un Ente pubblico, gli ardui problemi che si andavano presentando via via che il Piano entrava nelle successive fasi, e gli Organi centrali andavano aggiornando i criteri di attuazione, e si venivano aprendo nuovi campi di lavoro, ognuno impostato su criteri diversi, dalle costruzioni aziendali a quelle del piano Aggiuntivo, dall'amministrazione autonoma delle case a riscatto al servizio sociale, dalla progettazione di singoli edifici alla impostazione di grandi centri residenziali.

L'ampio grado di decentramento dato alla struttura organizzativa del Piano lasciava tuttavia agli Uffici centrali un complesso di compiti di stimolo, di controllo e di preparazione delle norme, a cui, alla fine del Piano, attendevano 511 dipendenti in organico, oltre a 266 elementi distaccati dall'Istituto Nazionale Assicurazioni, 11 distaccati da Pubbliche Amministrazioni, 45 collaboratori interni e 330 collaboratori straordinari esterni.

È opportuno rilevare a questo proposito un dato dell'attività complessiva già realizzata, le spese generali non hanno superato, nel complesso dei due Settenni, il 2,50 per cento del costo totale delle realizzazioni.

Ma l'opera svolta dal INACASA va oltre il lavoro, per rilevante, dei suoi uffici. L'andamento del Piano nei risultati maggiori e minori raggiunti zona per zona dipese largamente dalla collaborazione che il Piano riuscì a ottenere da tutti gli Enti che cooperavano alla sua attuazione e soprattutto dalle Amministrazioni Comunali e dalle Stazioni Appaltatrici.

Sapete bene che la rete INACASA non era costituita dal gruppo degli uffici centrali, ma da un vasto sistema complesso di Enti, di Amministrazioni, di Uffici, di Commissioni, di Comitati di coordinamento che operavano per il Piano in tutte le parti d'Italia. Onde il successo del programma, o mancato, successo del Piano in una zona rispetto ad un'altra, o mancato, o avuto, in misura maggiore o minore, superato difficoltà o evitato ritardi ed ostacoli, va attribuito a tutti coloro che collaborarono alla realizzazione del Piano. Infatti, la prima causa di questo successo che fu la prima ragione del suo rapido sviluppo, e della sua riuscita, per le sue realizzazioni.

Tav. 1 — Disponibilità finanziarie del Piano INACASA nei due Settenni
(MILIONI DI LIRE)

FONTI DI ENTRATA	PRIMO SETTENNIO	SECONDO SETTENNIO	TOTALE
Contributi dello Stato	104.823	84.000	188.823
Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori	200.390	403.819	604.209
Rate di ammortamento	13.418	93.160	106.578
Canoni di locazione e varie	6.472	24.924	31.396
	325.103	605.903	931.006

N.B. - I dati relativi al Primo Settennio sono consuntivi (vedi all. I alla Relazione del Comitato al bilancio della Gestione INACASA per l'esercizio 1956-57), quelli relativi al Secondo Settennio sono consuntivi fino al 30 giugno 1962 e stimati per il periodo successivo fino al 31 marzo 1963.

Tav. 2 — Programmi economici e finanziari del 1° e del 2° Settennio

	PRIMO SETTENNIO	SECONDO SETTENNIO
ATTIVITÀ		
Arce - Fabbricati:		
Primo Settennio: Enti appaltanti	290.995,6	258.509,8
» : Azienda e cooperative	45.254,7	42.802,6
Secondo Settennio: Enti appaltanti	438.188,1	3.721,4
» : Azienda e cooperative	63.350,4	—
» : Altri immobili	4.815,—	1.376,—
Altri costi non imputati agli alloggi	5.895,3	—
Disponibilità di cassa	848.499,1	306.409,8
Enti incaricati riscossione contributi	20.447,7	39.656,1
Debitori	5.818,4	3.547,7
Mobili e macchine	13.970,6	3.764,8
Depositi	370,5	126,1
Risconti attivi	4,7	0,5
Spese da ripartire	111,5	—
	—	544,1
	889.222,5	354.049,1
PASSIVITÀ		
Contributi datori di lavoro e lavoratori	545.610,1	206.007,2
Contributi dello Stato	114.216,3	30.764,3
Anticipazioni dello Stato	74.577,1	86.058,7
Mutui passivi	400,—	—
Creditori	36.400,2	7.638,6
Fondo indennità licenziamento	464,7	151,5
Fondo ammortamento mobili e macchine	199,4	50,7
Riserve e accantonamenti vari	14.866,4	1.820,3
Proventi e quote ammortamento	102.488,3	21.557,8
	889.222,5	354.049,1

Tav. 3 — Situazione patrimoniale dell'INACASA al 30-6-1956 e al 30-6-1962
(MILIONI DI LIRE)

	AL 30.6.62	AL 30.6.56	DIFFERENZA
ATTIVITÀ			
Arce - Fabbricati:			
Primo Settennio: Enti appaltanti	290.995,6	258.509,8	+ 32.485,8
» : Azienda e cooperative	45.254,7	42.802,6	+ 2.452,1
Secondo Settennio: Enti appaltanti	438.188,1	3.721,4	+ 434.466,7
» : Azienda e cooperative	63.350,4	—	+ 63.350,4
» : Altri immobili	4.815,—	1.376,—	+ 3.439,—
Altri costi non imputati agli alloggi	5.895,3	—	+ 5.895,3
Disponibilità di cassa	848.499,1	306.409,8	+ 542.089,3
Enti incaricati riscossione contributi	20.447,7	39.656,1	— 19.208,4
Debitori	5.818,4	3.547,7	+ 2.270,7
Mobili e macchine	13.970,6	3.764,8	+ 10.205,8
Depositi	370,5	126,1	+ 244,4
Risconti attivi	4,7	0,5	+ 4,2
Spese da ripartire	111,5	—	+ 111,5
	—	544,1	— 544,1
	889.222,5	354.049,1	+ 535.173,4
PASSIVITÀ			
Contributi datori di lavoro e lavoratori	545.610,1	206.007,2	+ 339.602,9
Contributi dello Stato	114.216,3	30.764,3	+ 83.452,—
Anticipazioni dello Stato	74.577,1	86.058,7	— 11.481,6
Mutui passivi	400,—	—	+ 400,—
Creditori	36.400,2	7.638,6	+ 28.761,6
Fondo indennità licenziamento	464,7	151,5	+ 313,2
Fondo ammortamento mobili e macchine	199,4	50,7	+ 148,7
Riserve e accantonamenti vari	14.866,4	1.820,3	+ 13.046,1
Proventi e quote ammortamento	102.488,3	21.557,8	+ 80.930,5
	889.222,5	354.049,1	+ 535.173,4

N.B. - Dalla Relazione del Comitato sui Bilanci della Gestione INACASA per gli esercizi 1955-56 e 1961-62.

Tav. 4 — Incremento patrimoniale degli immobili INACASA nei diversi esercizi
(MILIONI DI LIRE)

ESERCIZIO	PRIMO SETTENNIO		ALTRI IMMOBILI		SECONDO SETTENNIO		TOTALE	
	Per anno	Sommat.	Per anno	Sommat.	Per anno	Sommat.	Per anno	Sommat.
1949-50	16.436,6	16.436,6	—	—	—	—	16.436,6	16.436,6
1950-51	52.382,7	68.819,3	—	—	—	—	52.382,7	68.819,3
1951-52	53.727,2	122.546,5	—	—	—	—	53.727,2	122.546,5
1952-53	54.257,7	176.804,2	35,0	35,8	—	—	54.293,5	176.840,-
1953-54	54.315,2	231.319,4	58,1	93,9	—	—	54.573,3	231.413,3
1954-55	43.610,8	274.938,2	733,9	827,8	—	—	44.352,7	275.766,-
1955-56	26.374,-	301.312,2	548,3	1.376,1	3.721,5	3.721,5	30.643,8	306.409,8
1956-57	17.747,5	319.059,7	829,7	2.203,0	14.347,4	18.068,9	32.924,6	339.334,4
1957-58	7.009,4	326.669,1	726,4	2.932,2	51.072,6	69.141,5	59.408,4	398.742,8
1958-59	4.373,6	331.042,7	486,4	3.418,6	113.293,3	182.434,8	118.153,3	516.896,1
1959-60	2.554,2	333.596,9	296,5	3.715,1	147.524,1	329.958,9	150.374,8	667.270,9
1960-61	1.682,8	335.279,7	443,9	4.164,-	107.628,7	437.587,6	109.760,4	777.031,3
1961-62	719,-	335.998,7	651,1	4.815,1	64.202,3	501.789,9	65.572,4	842.603,7

N.B. - Dati del bilancio della Gestione INACASA pubblicati nelle Relazioni del Comitato di attuazione per i singoli esercizi, gli « altri immobili » sono costituiti dai Centri Sociali e dai negozi non ancora venduti.

Tav. 5 — Ripartizione per regioni delle costruzioni INACASA del 1° Settennio e confronto con alcuni indici

REGIONI	DANNI BELlici ¹	CONTRI- BUTI INACASA ²	POPOLA- ZIONE AL 4.11.1951	ABITANTI PER STANZA AL 4.11.1951	CONSTRUZIONI INACASA Programma del 1° Settennio		
					milioni di lire	%	N. Comuni inhab.
Piemonte-Valle d'Aosta	3,58	14,61	7,65	1,—	26.334	7,93	307
Lombardia	1,88	31,35	13,93	1,24	58.991	17,73	782
Trentino-Alto Adige	4,10	1,53	1,55	1,11	4.341	1,31	63
Veneto-Friuli-Venezia G.	3,43	8,82	10,26	1,25	30.613	9,16	507
Liguria	10,31	6,99	3,30	0,93	13.368	4,02	90
Emilia-Romagna	11,—	6,24	7,51	1,22	24.111	7,25	284
Toscana	8,65	7,50	6,69	1,03	21.184	6,37	248
Umbria	7,10	1,17	1,70	1,27	3.956	1,19	69
Marche	4,18	1,45	2,89	1,15	5.672	1,71	118
Lazio	11,93	6,70	7,10	1,55	22.363	6,73	213
Abruzzi e Molise	5,65	0,89	3,57	1,39	8.384	2,52	182
Campania	5,17	4,77	9,20	1,95	41.795	12,57	324
Puglie-Basilicata	1,38	2,48	8,15	2,13	27.873	8,38	270
Calabria	1,55	0,94	4,33	2,03	11.895	5,49	272
Sicilia	7,10	3,20	9,47	1,73	23.905	7,79	242
Sardegna	1,68	1,36	2,70	1,38	7.895	2,37	145
Centro Nord	6,03	86,36	62,58	1,18	210.753	63,40	2.690
Sud Isole	4,35	13,64	37,42	1,81	121.747	36,60	1.344
ITALIA	5,55	100,—	100,—	1,36	332.500	100,—	4.125

¹ Incidenza percentuale delle stanze distrutte e danneggiate, sul totale delle stanze esistenti.
² Dati riferiti al gettito complessivo dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori nel Primo Settennio.

Tav. 6 — Ripartizione per regioni delle costruzioni INACASA del 2° Settennio e confronto con alcuni indici

REGIONI	NUMERO LAV. NAT. SI INDICAZIONI AL PIANO ¹	POPOLAZIONE ZONI RESIDENTI AL 15.10.1961	ABITANTI PER CANTIERE AL 15.10.1961	CONSTRUZIONI INACASA Programma del 2° Settennio		
				in milioni di m ²	%	N. Comuni inhab.
Piemonte-Valle d'Aosta	10,85	7,90	1,06	44.760	7,41	326
Lombardia	21,64	14,63	1,09	89.712	14,75	761
Trentino-Alto Adige	1,59	1,56	1,04	8.454	1,40	96
Veneto	7,72	7,59	1,07	89.188	6,57	355
Friuli-Venezia Giulia	3,46	2,39	0,97	15.119	2,50	134
Emilia	4,76	5,40	0,85	28.888	3,77	82
Emilia-Romagna	6,60	7,22	1,01	41.166	6,82	256
Liguria	6,40	6,47	0,94	36.574	6,06	207
Umbria	1,30	1,37	1,11	7.046	1,17	54
Marche	2,04	2,67	1,03	10.686	1,77	126
Lazio	6,36	7,77	1,19	54.473	9,02	172
Abruzzo e Molise	1,81	3,14	1,20	14.237	2,36	129
Campania	7,45	9,42	1,60	76.901	12,74	261
Puglia	4,44	6,75	1,62	44.612	7,42	193
Basilicata	0,56	1,28	1,75	6.429	1,05	51
Calabria	2,05	4,05	1,67	23.459	4,05	197
Sicilia	5,57	9,35	1,49	52.471	8,69	210
Sardegna	1,82	2,30	1,22	14.705	2,44	116
Centro Nord	75,55	64,23	1,03	369.750	61,24	2.769
San Isola	24,95	36,77	1,49	234.021	38,76	1.164
Italia	100,00	100,00	1,16	603.771	100,00	3.933

Tav. 7 — Abitazioni costruite in Italia nei singoli anni dal 1950 al 1960 e incidenza del Piano INACASA

MIGLIAIA

ANNI	ABITAZIONI COSTRuite DALL'INACASA	ABITAZIONI COSTRuite DA ALTRI	ABITAZIONI IN COMPLESSO	INCIDENZA INACASA SUL COMPLESSO
	(1)	(2)	(3)	(4) = $\frac{(1)}{(3)}$
1950	6	86	92	6,5
1951	20	98	118	16,9
1952	25	108	133	18,8
1953	26	176	202	12,9
1954	32	189	221	14,5
1955	17	249	266	6,4
1956	14	277	291	4,8
1957	10	305	315	3,2
1958	26	289	315	8,2
1959	40	293	333	12,0
1960	51	280	331	15,4

Tav. 8 — Incidenza delle costruzioni INACASA sull'incremento delle abitazioni verificatosi fra i Censimenti del 1951 e del 1961

REGIONI	ABITAZIONI COSTRUITE DALL'INACASA ¹	INCREMENTO DELLE ABITAZIONI ²	INCIDENZA PERCENTUALE
	1	2	(1) (2) 100
Piemonte	16.160	231.172	7,1
Valle d'Aosta	539	6.660	8,1
Lombardia	41.215	480.230	8,6
Trentino-Alto Adige	3.794	36.204	10,2
Veneto	19.173	187.461	10,3
Friuli-Venezia Giulia	5.964	62.663	9,5
Liguria	7.651	156.601	4,9
Emilia-Romagna	20.416	201.316	10,1
Toscana	16.415	173.762	9,5
Umbria	1.137	31.761	3,6
Marche	5.954	54.114	11,0
Lazio	19.745	331.927	5,9
Abruzzo e Molise	6.304	39.315	16,1
Campania	27.319	211.316	12,9
Puglia	16.912	150.717	11,2
Basilicata	2.197	20.350	10,8
Calabria	7.990	41.305	19,3
Sardegna	15.540	169.947	9,1
Sardegna	5.961	58.177	10,2
Centro Nord	159.998	1.967.314	8,1
Sud Italia	82.233	693.657	11,9
ITALIA	241.631	2.660.971	9,1

¹ Nel periodo che va dal 31 dicembre 1951 al 31 dicembre 1961.

² Fra i Censimenti del 4 novembre 1951 e quello del 25 novembre 1961 i dati relativi a quest'ultimo sono provvisori.

Tav. 9 — Occupazione operaia nei cantieri dell'INACASA per regione, a tutto il 31 dicembre 1962

REGIONI	GIORNATE LAVORATIVE (migliaia)	REGIONI	GIORNATE LAVORATIVE (migliaia)
Piemonte	6.259	Lazio	7.489
Lombardia	16.483	Abruzzi e Molise	2.614
Trentino-Alto Adige	1.511	Campania	12.121
Veneto	7.903	Puglia	8.359
Friuli-Venezia Giulia	2.205	Basilicata	1.258
Liguria	3.467	Calabria	3.638
Emilia-Romagna	7.512	Sicilia	7.645
Toscana	7.013	Sardegna	3.122
Umbria	2.017		
Marche	1.434	ITALIA	102.047

Tav. 10 — Occupazione operaia nelle opere pubbliche: in complesso, nella costruzione di abitazioni e nei cantieri dell'INACASA, dal 1953 al 1960 (MIGLIAIA DI GIORNATE)

ANNI	OPERE PUBBLICHE				
	In complesso (1)	Costruzione di abitazioni (2)	Costruzioni INACASA (3)	(4)	(3) (1) 100
1953	123.032	20.483	9.401	7,6	45,9
1954	98.376	17.281	7.015	7,1	40,6
1955	94.786	15.055	5.580	5,9	37,1
1956	78.171	12.059	2.346	3,0	19,5
1957	76.000	12.883	3.261	4,3	25,3
1958	91.295	17.382	8.649	9,5	49,8
1959	92.585	24.533	15.574	16,8	63
1960	85.284	20.595	11.178	13,2	54

Tav. II — Occupazione operaia nelle opere pubbliche per la costruzione di abitazioni, nel periodo 1953-1958

MIGLIAIA DI GIORNATE OPERAIE

RIPARTIZIONI TERRITORIALI	1940-54	ALTRI 1951	IN COMPLESSO
Nord	15.691	21.965	37.659
Centro	5.795	16.616	22.411
Sud	10.445	13.614	24.059
Isole	4.521	6.593	11.014
ITALIA	36.452	57.788	94.240

DATE PERCENTAGE

RIPARTIZIONE TERRITORIALE	INALASA	ALTRI ENII	RIPARTIZIONE MEDIA DEI DISOCCUPATI NON AGRICOLI
Nord	43,1	47,1	45,5
Centro	16,0	20,2	14,4
Sud	28,8	23,1	29,5
Isole	11,9	11,4	10,6
ITALIA	100, -	100, -	100, -



Tav. 12 — Abitanti per stanza secondo i Censimenti del 1881, 1931, 1951

REGIONI	1881	1931	1951 *
Piemonte-Valle d'Aosta	1,56	1,11	1,02
Liguria	1,16	0,90	0,93
Lombardia	1,54	1,28	1,27
Trentino-Alto Adige	—	1,17	1,14
Veneto	1,50	1,32	1,29
Friuli-Venezia Giulia	—	1,24	1,18
Emilia-Romagna	1,59	1,45	1,24
Marche	1,47	1,20	1,19
Toscana	1,27	1,10	1,03
Umbria	1,55	1,33	1,31
Lazio	1,61	1,45	1,59
Campania	1,94	1,75	1,93
Abruzzi e Molise	1,91	1,42	1,45
Puglia	2,20	2,04	2,19
Basilicata	2,11	2,07	2,13
Calabria	2,32	1,82	2,14
Sicilia	1,93	1,65	1,76
Sardegna	1,75	1,33	1,43
Nord	1,50	1,22	1,18
Centro	1,40	1,23	1,28
Sud	2,05	1,77	1,96
Isole	1,90	1,58	1,68
Centro Nord	1,48	1,22	1,21
Sud Isole	2,00	1,70	1,86
ITALIA	1,65	1,36	1,39

* I dati della presente tavola sul numero degli abitanti per stanza differiscono da quelli della Tav. 13 per il fatto che in questa tavola si tiene conto solo delle abitazioni in cui sono abitati. Un secolo di statistiche italiane. Nord e Sud - 1861-1961

Tav. 13 — Popolazione residente, abitazioni, stanze e affollamento medio nelle varie regioni (situazione al 4 novembre 1951)

REGIONI	ABITANTI	ABITAZIONI	STANZE	ABITANTI per stanza
Piemonte	3.518.177	1.150.035	3.891.549	0,90
Valle d'Aosta	94.140	35.084	106.109	0,89
Lombardia	6.566.154	1.745.082	5.528.834	1,19
Trentino-Alto Adige	728.604	178.547	708.430	1,03
Veneto	3.918.059	752.273	3.190.794	1,23
Friuli-Venezia Giulia	1.226.121	281.361	1.096.409	1,12
Liguria	1.566.961	424.938	1.177.207	1,33
Emilia-Romagna	3.544.340	845.100	2.122.222	1,67
Toscana	3.158.811	741.216	3.234.489	0,97
Umbria	803.918	171.707	671.241	1,20
Marche	1.364.030	291.876	1.245.399	1,10
Lazio	3.340.798	712.669	2.322.034	1,44
Abruzzi e Molise	1.684.030	393.501	1.298.137	1,30
Campania	4.346.264	933.438	2.348.382	1,85
Puglia	3.220.485	728.518	1.625.092	1,99
Basilicata	627.586	177.233	1.077.700	0,58
Calabria	2.044.287	473.305	1.088.87	1,88
Sicilia	4.486.749	1.126.293	2.837.811	1,58
Sardegna	1.276.023	272.453	967.548	1,32
Nord	21.162.556	5.412.465	19.385.443	1,09
Centro	8.667.557	1.917.468	7.473.163	1,16
Sud	11.922.652	2.682.006	6.678.252	1,77
Isole	5.762.772	1.398.746	3.805.351	1,52
Centro Nord	29.830.113	7.329.933	26.858.606	1,11
Sud Isole	17.685.424	4.080.752	10.483.603	1,69
ITALIA	47.515.537	11.410.685	37.342.217	1,27

Tav. 14 — Popolazione residente, abitazioni, stanze e affollamento medio nelle varie regioni
(situazione al 15 ottobre 1961)

REGIONI	ABITANTI	ABITAZIONI	STANZE	ABITANTI PER STANZA
Piemonte	3.889.962	1.381.507	4.588.674	0,85
Valle d'Aosta	99.754	11.764	135.478	0,74
Lombardia	7.390.492	2.225.312	7.111.467	1,04
Trentino-Alto Adige	785.491	211.751	824.380	0,95
Veneto	3.633.337	939.737	3.811.950	1,01
Friuli-Venezia Giulia	1.205.222	344.044	1.321.199	0,91
Liguria	1.717.630	381.664	2.314.048	0,74
Emilia-Romagna	1.646.507	1.049.436	3.396.683	0,94
Toscana	3.267.374	914.973	3.749.432	0,87
Umbria	788.546	203.468	763.573	1,03
Marche	1.347.244	345.990	1.407.621	0,96
Lazio	3.922.783	1.054.596	3.600.582	1,09
Abruzzi e Molise	1.384.777	432.816	1.463.611	1,08
Campania	4.756.094	1.144.754	3.164.872	1,50
Puglia	3.409.687	879.265	2.293.417	1,49
Basilicata	646.085	174.094	413.351	1,57
Calabria	2.045.215	516.610	1.312.560	1,56
Sicilia	4.711.783	1.296.240	3.531.188	1,33
Sardegna	1.413.239	330.630	1.231.211	1,15
Nord	22.568.895	6.778.215	24.003.879	0,94
Centro	9.325.937	2.519.032	9.521.211	0,98
Sud	12.443.658	3.137.539	8.647.811	1,44
Isole	6.125.072	1.626.679	4.765.399	1,29
Centro Nord	31.894.832	9.297.247	33.525.090	0,95
Sud Isole	18.566.930	4.774.409	13.413.210	1,38
ITALIA	50.463.762	14.071.656	46.938.300	1,08

N.B. - I dati sono provvisori.

52

Tav. 15 — Incremento della popolazione residente, delle abitazioni e delle stanze fra i due Censimenti del 4 novembre 1951 e del 15 ottobre 1961

REGIONI	INCREMENTO ABITANTI		INCREMENTO ABITAZIONI		INCREMENTO STANZE	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Piemonte	371.785	10,6	231.472	10,1	697.125	17,9
Valle d'Aosta	5.614	6,-	6.680	19,-	29.369	27,7
Lombardia	824.338	12,6	480.230	27,5	1.582.633	28,6
Trentino-Alto Adige	56.887	7,8	36.204	20,3	115.950	16,4
Veneto	84.222	2,1	187.464	24,9	621.156	19,5
Friuli-Venezia Giulia	20.899	1,7	62.683	22,3	224.790	20,5
Liguria	150.669	9,6	156.681	36,9	496.753	27,3
Emilia-Romagna	102.167	2,9	204.336	24,2	850.660	27,9
Toscana	108.563	3,4	173.762	23,4	514.943	15,9
Umbria	15.372	1,9	31.761	18,5	92.332	13,8
Marche	16.796	1,2	54.114	18,5	162.225	13,-
Lazio	581.985	17,4	341.927	48,-	1.278.548	55,1
Abruzzi e Molise	99.253	5,9	39.315	10,-	165.474	12,7
Campania	409.830	9,4	211.316	22,6	816.490	34,1
Puglia	189.202	5,9	150.747	20,7	668.325	41,1
Basilicata	20.499	3,3	20.850	13,6	95.585	30,1
Calabria	928	—	43.305	9,1	223.685	20,5
Sicilia	225.034	5,-	169.947	15,1	693.377	24,4
Sardegna	137.266	10,8	58.177	21,4	266.663	27,6
Nord	1.406.339	6,6	1.365.750	25,2	4.618.436	23,8
Centro	658.380	7,6	601.564	31,4	2.048.048	27,4
Sud	521.206	4,4	465.533	17,4	1.969.559	29,5
Isole	362.300	6,3	228.124	16,3	960.040	25,2
Centro Nord	2.064.719	6,9	1.967.314	26,8	6.666.484	24,8
Sud Isole	883.506	5,-	693.657	17,-	2.929.599	27,9
ITALIA	2.948.255	6,2	2.660.971	23,3	9.596.083	25,7

N.B. - I dati relativi al Censimento 1961 sono provvisori.

53

La costruzione degli alloggi e dei complessi edilizi

1. I criteri di costruzione

Un programma edilizio di grande mole come quello che affrontava l'INACASA, regolato sì da un meccanismo ferreo e da scadenze precise nel tempo, ma affidato necessariamente per la realizzazione a migliaia di progettisti, Enti, imprese di costruzione disseminate in ogni angolo di un Paese così vario, anche nelle consuetudini edilizie, richiedeva fin dal primo momento che si conciliassero esigenze addirittura opposte. I criteri di costruzione e di progettazione dovevano essere così inflessibili, da elevare a ogni costo il tono dell'edilizia popolare in Italia, ma al tempo stesso così duttili, da potersi adattare ai mille aspetti di tante regioni diverse per il paesaggio, per il costume, per i caratteri architettonici.

Gli edifici non dovevano riuscire delle caserme monotone, disseminate in serie per tutto il territorio nazionale, ma interpretare, zona per zona, le caratteristiche locali, nel rispetto di norme generali capaci di fissare in modo inconfondibile il tono e il carattere delle nuove case destinate ai lavoratori del Piano.

E non basta: pur nel rispetto di quelle norme, doveva essere lasciata a ogni progettista la possibilità di una ricerca personale, di un atto d'intelligenza e di fantasia. In questo campo specifico si ritrova ancora una volta, a guardar bene, lo spirito informatore dell'intero Piano, che vuole guidare, ma non soffocare, che stimola l'iniziativa degli individui in una certa direzione, ma si guarda bene dal rinchiuderli fra staccionate.

Le norme di costruzione dovevano anche consentire di affrontare con idee chiare quel conflitto tra qualità e costo che sarà uno dei punti più sofferti del Piano. Sappiamo i limiti ristretti di costo a vano entro cui si dovevano tenere le costruzioni dell'INACASA. E tuttavia il Piano non avrebbe raggiunto il suo scopo sociale, non avrebbe avuto — staremmo per dire — quasi nessun significato, se non fosse riuscito a dare ai lavoratori più bisognosi la possibilità di abitare in una casa realmente civile, se non avesse contribuito sostanzialmente a innalzare il tono della loro vita.

La decisione del Comitato

Su questi punti, la Legge non dava indicazioni. Fu il Comitato che assunse l'impegno di fissare le norme di costruzione. E bisogna dire subito che questa «delibera» conservò, nel corso dei quattordici anni, un carattere di sostanziale continuità come forse nessun'altra.

I criteri si imperniarono essenzialmente sui seguenti punti. Densità di popolazione non superiore ai 500 abitanti per ettaro. Limiti d'altezza di ogni edificio contenuti in una media di quattro piani. Edifici distanziati l'uno dall'altro una volta e mezza la rispettiva altezza, in misura cioè da consentire che il sole illuminasse ogni alloggio (compresi quelli del piano terreno) anche nei giorni più brevi del solstizio invernale. Due esposizioni opposte (o, solo eccezionalmente, ortogonali per ogni alloggio; e per ciascun alloggio l'esposizione nord limitata agli ambienti di servizio, e solo per eccezione a un'unica camera (quando però l'alloggio ne avesse almeno altre due). La preoccupazione del sole, come della prima ricchezza che non deve mancare a nessuno, ritorna continuamente in queste norme. Così sono esclusi rigorosamente cortili chiusi, semichiusi e chiostrine (quegli squallidi cortili chiusi dei vecchi casoni popolari). E i cortili aperti dovranno avere dimensioni e disposizioni tali da soddisfare, prima di tutto, il bisogno di sole, e ci dovranno essere spazi pubblici a disposizione di chi non può usufruire né di un cortile né di un orto suo proprio.

Ma anche restando in casa, si deve poter godere l'aria e il sole. Il rapporto illuminante in ogni alloggio deve riuscire piuttosto elevato, orientandosi sulla base di 1/6. Una delle richieste più ferme ai progettisti è che ogni casa abbia balconi, e balconi ampi. I balconi ampi, i loggiati, rimarranno sempre una delle caratteristiche inconfondibili, che faranno distinguere anche di lontano, anche correndo in macchina, le case del Piano dalle consuete case popolari.

Il loro scopo però non è soltanto di dar più sole a chi sta in casa, né soltanto di ampliare la superficie utile dell'alloggio, ma anche di far da ponte fra l'intimità familiare e la vita di vicinato all'aria aperta, antica consuetudine italiana, tipica della nostra civiltà.

Diamo ora uno sguardo all'interno degli alloggi. I minimi di superficie utile vengono fissati in 30, 45, 60, 75, 90 mq. per alloggi rispettivamente di 1, 2, 3, 4, 5 stanze utili più i servizi: dimensioni economiche ma non disagiati. Vi sono anche indicazioni precise sull'altezza minima dei vani. Per guadagnare spazio effettivamente godibile, si raccomanda anche di ridurre al minimo corridoi e locali di disimpegno. Si potrà anche utilizzare il soggiorno per l'accesso diretto ad altri ambienti.

Funzionalità ed economia

In sintesi, le norme si possono raggruppare intorno alle seguenti esigenze. Anzitutto, funzionalità: occorre prevedere nell'alloggio la separazione del reparto diurno dal notturno, e raggruppare il reparto notturno intorno al bagno; occorre studiare la forma e la dimensione delle stanze e in particolare la disposizione di porte e finestre, in modo che gli spazi liberi adempiano ciascuno a una precisa funzione, e siano frazionati il meno possibile. È questo un caso tipico in cui il criterio economico coincide esattamente con i corretti criteri architettonici.

Senza venir meno all'economia, e anzi attraverso l'economia, si punta al decoro, che è la seconda esigenza alla quale non si vuol venir meno in queste case popolari pensate in modo nuovo. Ridurre al minimo lo spazio per i disimpegni a favore dell'ampiezza degli ambienti, evitare la costruzione di camere da letto destinate in progetto ad accogliere più di due letti per adulti, allargare la casa dotandola di logge ampie e profonde: tutto questo significa dare più respiro, più agio per muoversi, in ultima analisi dare maggior dignità alla pur modesta vita quotidiana.

La razionalizzazione — sintesi di economia e di decoro — si estende anche ai servizi e alle piccole comodità della casa. Occorre prevedere ripostigli per tutti quegli oggetti che non trovano posto negli armadi, e quindi restano di solito abbandonati per la casa, provocando

quel disordine che irrita e umilia e abbassa di per sé il tono della vita; occorre anche dotare gli alloggi di lavatoio, per evitare che a questo scopo sia adibito il bagno. Non si dimentichi che l'INACASA ha fatto « scoprire », alla lettera, a decine di migliaia di famiglie, la civiltà del bagno in casa.

Infine, nell'impostazione del progetto si doveva tener conto, in ogni senso, dell'ambiente in cui sarebbe sorta la casa. Prima di tutto della sua posizione geografica: latitudine, altezza sul livello del mare, condizioni di clima, con tutte le ripercussioni che ne derivavano sulla ampiezza delle finestre, sul sistema di copertura, sugli impianti di riscaldamento. In secondo luogo, occorre tener conto dei materiali da costruzione rinvenibili sul posto, delle maestranze locali, dei metodi di costruzione tradizionali. In terzo luogo, delle abitudini di vita della regione. La casa doveva venire inserita in un certo mondo, storicamente concreto, e armonizzarsi con esso.

A distanza di quattordici anni, si deve constatare che le poche norme qui sopra elencate hanno contribuito decisamente a una profonda evoluzione nel tono dell'edilizia popolare italiana.

Alcuni principi affermati dall'INACASA, sulla razionalizzazione e sull'elevazione del tono delle case popolari, hanno avuto ripercussioni al di là delle costruzioni del Piano. Si scopri che la progettazione di case per lavoratori che conciliassero economia e decoro era un « problema », degno d'impegnare al massimo l'attenzione dei professionisti.

Razionalizzazione dei criteri

Ai costi via via crescenti negli anni successivi, si contrappose una sempre maggior razionalizzazione delle norme, una più approfondita ricerca di semplicità e di schiettezza, e la tipizzazione di alcuni schemi costruttivi. Per quanto riguarda le strutture portanti, si curò che la scelta del sistema costruttivo si adattasse pienamente allo schema distri-



butivo. E così pure si ribadì la necessità di usare i materiali più adatti per resistenza, durata, coibenza, ma al tempo stesso più economici per la località in cui la casa doveva sorgere. Si prescrisse di eliminare tutti gli elementi non essenziali alle esigenze qui ricordate, che pertanto avrebbero rappresentato un dispendio inutile, o quasi. Si raccomandò anche di studiare a fondo l'associazione degli alloggi nell'edificio e quella dei vani nell'appartamento, evitando nei muri ogni tracciato lungo e contorto, eliminando interruzioni troppo ampie nelle strutture e (nel calcolare l'ampiezza dei solai) luci superiori a quelle compatibili con armature economiche. Si trovò il modo di evitare, nei balconi, sbalzi notevoli di dimensioni, si cercarono le coperture più adatte alle varie condizioni climatiche, e al tempo stesso più economiche, si tentò di prevedere i piccoli problemi della manutenzione.

Nel predisporre gli spazi interni per gli usi pratici della vita quotidiana, si raccomandò di tener conto di ogni attività dei vari componenti la famiglia nelle diverse ore della giornata.

Ad esempio, nella stanza di soggiorno, non avrebbe dovuto mancare l'angolo per i lavori domestici della donna, con il posto per la macchina da cucire; nella stessa camera, o in quella da letto dei figli, era necessario prevedere la collocazione di un tavolo per le ore di studio dei ragazzi. E ancora: si doveva predisporre un ripostiglio o armadio a muro presso l'ingresso, per riporvi gli arnesi da lavoro o di pulizia, un altro da adibirsi a dispensa in cucina, un terzo, accanto all'ingresso, per depositare le biciclette, nelle località ove il loro uso era generale, e così via.

Particolare cura fu dedicata all'attribuzione degli spazi condominiali. Si seguì il criterio generale di lasciare all'uso comune il maggior numero di spazi, ribadendo tuttavia l'obbligo di cedere, almeno in uso, agli abitanti del pianterreno quel minimo di spazio che li proteggesse dagli sguardi indiscreti e dai rumori diretti.

L'indagine fra gli assegnatari

Verso la fine del Primo Settennio, si pensò di rivedere i criteri costruttivi, traendo frutto dall'esperienza ormai maturata. A questo fine si invitarono gli esperti e i professionisti collaboratori dell'INACASA a esporre le conclusioni delle loro prove e ricerche. Ma nello stesso tempo si interpellarono direttamente con un'apposita indagine gli stessi assegnatari, quelli che concretamente avevano sperimentato, vivendoci, i requisiti di abitabilità degli alloggi INACASA, perché indicassero i pregi e gli inconvenienti che vi avevano riscontrati. Si volevano mettere di fronte le ricerche tecniche degli esperti e l'esperienza diretta delle famiglie.

Ma l'iniziativa (senza precedenti, salvo errore, nel campo dell'edilizia popolare) aveva un significato più profondo, al di là della ricerca pura e semplice delle migliori soluzioni edilizie. Portando alle estreme conseguenze il loro metodo favorito di fare appello alla collaborazione periferica, gli Organi dell'INACASA riscattavano in qualche modo il Piano da quel tanto di rigido e d'imposto dall'alto che esso aveva avuto fin dall'inizio. Fino allora i diretti beneficiari del Piano, a parte il pagamento delle quote mensili, non avevano partecipato attivamente alla sua realizzazione; non avevano potuto scegliere, per esempio, il tipo di edificio in cui sarebbero stati chiamati ad abitare. Ma ora almeno venivano invitati a esporre criticamente i risultati della loro diretta esperienza, a vantaggio non di se stessi, certo, ma dei futuri beneficiari del Piano.

L'indagine — condotta sull'altezza degli edifici, sul tipo di scale più consigliabile, sulla pianta degli alloggi, sulle soluzioni migliori da adottare per lavatoi e stenditori, sui sistemi di riscaldamento più razionali ed economici — in molta parte confermò la giustezza delle norme fino allora seguite, ma in parte le criticò, con motivazioni che risultarono convincenti.

Uno dei problemi maggiormente dibattuti fra i tecnici era quello della ventilazione naturale, gliabile per gli edifici. È noto che il mercato dei materiali edili e dei servizi di attrezzatura delle imprese, pongono dei limiti alla convenienza economica di questo

Ma anche dove non sorgono incertezze circa la scelta del tipo di struttura portante, gli edifici di cinque o sei piani presentano altri inconvenienti, e provocano perplessità in chi progetta case economiche. Ad esempio, conviene dotarli o meno di ascensore? Nei primi anni, l'INACASA aveva consigliato di lasciare sulle scale un vano a disposizione, perché gli assegnatari potessero, nel caso, installarvi un impianto a loro spese; ma questo in pratica non era quasi mai avvenuto, perché gli abitanti non erano, nella stragrande maggioranza, in condizioni economiche tali da poter affrontare una spesa non indifferente. Risultò dall'indagine che i piani preferiti erano il secondo e il terzo e che, comunque, assai grave era considerato il disagio, in caso di mancanza d'ascensore, per i piani dal quarto in su. In un ordine d'idee del tutto diverso, appariva inoltre evidente che in un Paese come il nostro, caratterizzato da numerosissimi aggregati urbani di antica formazione inseriti in un paesaggio vario e di per sé espressivo, le costruzioni a basso numero di piani erano le più adatte a non turbare, in moltissimi casi, l'equilibrio preesistente.

Viceversa, un criterio fino allora seguito e che nell'inchiesta fra gli assegnatari risultò poco accettato fu quello relativo agli appartamenti su due piani (in genere, soggiorno e cucina al piano terreno, reparto notte al piano superiore). L'indagine provò, senza possibilità

Sottoposta ad attento esame fu anche la questione delle abitazioni a piano terra. Quel tipo di alloggio era largamente richiesto dai beneficiari del Piano prima dell'assegnazione. Ma risultò che in molti casi le famiglie, una volta entrate negli appartamenti, si erano trovate a disagio, e chiedevano di passare ai piani superiori. Ciò avveniva soprattutto quando gli alloggi a piano terra si trovavano pressappoco al livello del terreno circostante. Le ragioni del disagio erano molte e varie: andavano dalla maggiore umidità dei massimi (se al di sotto non vi erano cantine e se i vespai erano male eseguiti) alla minore insolazione, al fastidio che dava agli inquilini la possibilità di venir osservati dall'esterno attraverso le finestre troppo basse.

Altro argomento di indagine riguarda le parti coperte e in parte scoperte dei ponti, i quali, se non sono soddisfacenti, avevano dato origine a un certo malcontento manifestato da alcune chiusure che, non essendo sufficienti alle costruzioni. D'altra parte, le parti bagnate dalla pioggia e dall'esterno. Ciò rende i rischi che ne conseguono.

Anche per gli schemi distributivi apparve consigliabile una revisione dei criteri seguiti fino a quel momento. E poiché alcuni dei miglioramenti giudicati necessari comportavano l'ampliamento di alcuni vani o l'inserimento di altri negli alloggi, furono riveduti i minimi di superficie netta prescritti dalle prime norme; e pertanto ai due vani utili si fecero corrispondere 50 mq.; ai tre vani utili 70 e poi 75 mq.; ai quattro vani utili 90 mq.; ai cinque vani utili 110.

La generalità degli assegnatari chiese un tipo di cucina-pranzo separata dal soggiorno, e tutti, o quasi, affermarono di non gradire le soluzioni nelle quali il soggiorno deve essere attraversato per accedere agli altri ambienti della casa.

Ci si rese anche conto che per la stanza da letto matrimoniale era necessaria una superficie non inferiore a 15-16 mq. ed una accurata collocazione della porta e della finestra, perché fosse possibile disporre, oltre al letto matrimoniale, i comodini, una culla, un armadio, un cassettone e un tavolino-scrittoio, mentre eran necessari nelle stanze dei figli circa 11 mq. per disporvi due letti, i comodini, un armadio, e un tavolino. Si ritenne infine necessario prevedere nei futuri alloggi, oltre al ripostiglio, una cantina e il lavatoio interno, in locale separato e chiuso, in comunicazione diretta con uno stenditoio individuale.

300 abitanti per ettaro

Un'ulteriore revisione dei criteri costruttivi fu sottoposta dagli Organi del Piano al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — e da questo approvata — all'inizio del Secondo Settennio. Vi si stabiliva fra l'altro che la densità massima della popolazione nei nuovi complessi residenziali dovesse scendere, tranne casi eccezionali, da 500 a 300 abitanti per ettaro; si prescriveva che i nuovi quartieri si inserissero nei Piani Regolatori comunali secondo le direttrici previste di sviluppo, in modo da consentire facili collegamenti con i luoghi di lavoro; infine si raccomandava di evitare, nello studio dei nuovi centri residenziali, qualsiasi alterazione stridente del paesaggio e dell'ambiente architettonico preesistente.

La maggiore difficoltà che dovette affrontare l'INACASA nel Secondo Settennio consistette, come si è visto, nell'aumento continuo dei costi, che poteva causare un decisivo abbassamento nel livello delle costruzioni, sia per il sacrificio dell'aspetto architettonico, sia per una semplificazione della tematica distributiva, sia per una eccessiva schematizzazione che riducesse gli edifici a semplici case di altezza limitata, con caratteristiche di estrema linearità.

Fra i vari rimedi escogitati per contenere i prezzi, vi fu anche un nuovo criterio costruttivo e cioè l'adozione di una gamma di tipi edilizi differenziati nel costo in base alle maggiori o minori esigenze delle varie località, scendendo fino a uno speciale tipo di alloggio semi rurale dal costo ridotto, riservato alle zone depresse, dove più gravi erano le difficoltà per il pagamento dei canoni. (Ma di ciò parleremo più ampiamente nei prossimi due capitoli).

Guardando nel complesso, a ciclo compiuto, l'attività edilizia del Secondo Settennio, si deve riconoscere che malgrado tutte le difficoltà cui si accennava, il livello medio delle costruzioni, anziché decadere, andò via via migliorando nei principi costruttivi, attraverso un ulteriore aumento della superficie minima a vano (che nel tipo da 7 vani salì fino a 20 mq. utili) attraverso forme distributive meglio studiate e infine attraverso una maggiore cura dell'aspetto esterno delle costruzioni: per esempio, l'uso decisamente più esteso del mattone in superficie, indispensabile per la protezione delle facciate nel tempo. Gli alloggi costruiti nel Secondo Settennio hanno in media 5,42 vani «legali» (Tav. 18) una superficie media per alloggio di mq. 87,54 e una superficie media a vano di mq. 15,59.

Basta confrontare i complessi edilizi del Primo con quelli del Secondo Settennio per constatare un sostanziale progresso, dovuto allo svilupparsi di una esperienza sempre più costante preoccupazione di soddisfare via via le nuove esigenze degli assegnatari. Nel Secondo Settennio si poté anche arrivare a esperimenti, sia pur limitati, di prefabbricazione parziale, di costruzione in acciaio, di complessi unificati in alcune parti costruttive

354.781 ALLOGGI SUL TERRITORIO NAZIONALE
5.036 COMUNI

VEDI TAVOLE N. 27 e 28

UD 4.378	GO 1.455	TS 1.855	VE 5.757																	FG 5.585			
BZ 2.585	BL 1.123	TV 3.622	RO 1.770	FE 3.534	RA 2.066	FO 3.467	PS 1.628	AN 2.588	AP 1.078	TE 843	CH 2.231	CB 1.627	AV 2.610	BA 9.117	BR 2.281								
SO 933	TN 2.084	VI 4.570	PD 3.963	RE 2.404	BO 6.941	FI 7.914	AR 1.515	PG 2.571	MC 952	FR 2.258	AQ 2.234	PE 1.620	BN 1.508	PZ 2.331	MT 1.371	LE 5.733							
CO 4.987	BS 6.341	VR 3.443	MN 1.713	PR 1.965	MO 3.174	PT 1.109	PI 2.301	SI 1.331	TR 1.564	RI 733	LT 1.327	CE 3.985	NA 28.504	SA 7.262	CS 4.281	TA 4.485							
VA 6.170	BG 3.252	CR 1.617	PC 1.582	SP 2.889	MS 1.380	LU 2.458	LI 3.115	GR 1.811	VT 853	ROMA 22.269						RC 4.409	CZ 4.899						
NO 3.448	MI 28.753	PV 2.748	GE 7.633																				
VC 3.221	AL 2.297	AT 739	SV 1.760																				
AO 915	TO 14.911	CN 1.838	IM 879																				
																				SS 1.056		CA 5.289	
																				ME 4.398		CT 5.108	
																				PA 7.947		EN 1.396	
																				TP 2.075		AG 2.319	

NUMERI IN TONDO NERO SI RIFERISCONO AL NUMERO DEGLI ALLOGGI
NUMERI IN CORSIVO CHIARO SI RIFERISCONO AI COMUNI INCLUSI

Nel campo urbanistico, infine, e in particolare nell'impostazione dei centri residenziali, l'INACASA, pur ostacolata dai non inconvenienti e dalle incertezze dovute a un mercato del problema, compì esperienze che risultarono utili anche al di fuori del settore. Il Piano, come si vedrà nel seguente capitolo. Da tali esperienze è stato possibile ricavare le prime norme sistematiche sulla classificazione dei centri residenziali e sul decentramento dei servizi essenziali, e sull'ubicazione degli stessi servizi in relazione alla struttura e al mercato del centro. L'INACASA ha raccolto in questo campo le esperienze e le lezioni che sarà preziose in ogni futuro programma di piani urbanistici.

2. Scelta e acquisizione delle aree

L'importanza decisiva, per i risultati del Piano, del problema delle aree fu avvertita fin dall'inizio dagli Organi centrali, che impegnarono la loro diretta responsabilità nella scelta dei suoli edificatori, cercando di restare fedeli a una duplice direttiva: tutela, nello spirito della Legge, delle esigenze di vita civile dei futuri assegnatari e rispetto dei limiti di costo delle costruzioni.

In questo campo, l'INACASA fece appello alla più larga collaborazione degli Organi locali: Prefetture, Amministrazioni Comunali, Stazioni Appaltanti, Uffici Tecnici Erariali. Considerata la laboriosità delle pratiche (l'INACASA ha dovuto acquistare quasi 6.000 ettari e per ogni ettaro sono stati necessari in media quattro contratti di acquisto), si favorì quanto più possibile, anche in questa materia, il decentramento delle attività: quasi il 90% (in numero) degli atti di acquisto fu espletato dagli Ispettorati regionali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni.

L'attività particolarmente laboriosa della Commissione, costituita in seno al Consiglio Direttivo della Gestione, per l'esame delle richieste e delle controfferte, nonché per la definizione conclusiva dei costi, dà la misura della complessità del problema. Importa aggiungere che alla base di ogni acquisto fu posta, costantemente, la preventiva stima dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Sul mercato delle aree, il Piano INACASA operò, praticamente, in regime di libera concorrenza. Senza dubbio la Legge lo autorizzava ad eseguire gli espropri per motivi di pubblica utilità. Ma in pratica si preferirono gli accordi consensuali, e si ricorse all'esproprio soltanto come estrema risorsa, quando le richieste dei proprietari eccedevano le stime U.T.E. Su un complesso di circa 20 mila atti di acquisto stipulati al 30 giugno 1962, non più di 1.045 risultavano frutto di esproprio. Ma non basta; l'area complessiva espropriata era pari al 3,5% soltanto del totale.

Per contro la Gestione ricorse in larga misura all'occupazione temporanea dei terreni scelti, per poter dare inizio ai lavori senza troppi ritardi.

L'acquisto di lotti urbani

In regime di concorrenza, due strade si aprivano davanti al Piano: la prima consisteva nell'acquisto di una serie di lotti frazionati nell'ambito dei Piani Regolatori o comunque delle zone urbane, particolarmente di quelle ove i Comuni avessero già eseguito l'attrezzatura delle aree. Ed effettivamente, nei primi tempi, facendo leva sul grande successo psicologico incontrato dal Piano, si poté usufruire dell'apporto dei Comuni, e anzi si diede la preferenza, nell'assegnazione delle prime costruzioni, a quelli che offrivano aree gratuite. Si ottennero così anche nelle grandi città aree a prezzi di favore, o addirittura simbolici.

Questa prima via era quella che le disposizioni di legge additavano senza alternative agli Organi del Piano.

Il Regolamento che integrava la Legge istitutiva dell'INACASA stabiliva infatti, all'art. 31, che le aree necessarie per l'esecuzione dei programmi costruttivi del Piano dovevano « essere scelte tra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località, e delimitate da pubbliche strade, o comunque comodamente allacciate » ad esse; le norme integrative della Legge di rinnovo del Piano per il Secondo Settennio ribadivano: « si avrà cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ».

Il problema fu semplificato, comunque, nel caso delle costruzioni dirette delle Aziende, come era più tardi per le Cooperative del piano Aggiuntivo. Nell'uno come nell'altro caso, infatti, gli interessati ricercarono di loro iniziativa le aree e le misero gratuitamente a disposizione dell'INACASA. Le aree fornite a titolo gratuito ammontavano complessivamente, al 30 giugno 1962, a 4.793, per una superficie di 982 ettari).

Ma a parte le risorse offerte nei singoli casi dalla libera collaborazione, il problema delle aree non tardò a presentarsi nella sua vera natura e nella sua gravità. Il sempre crescente volume delle costruzioni messe via via in programma nei Centri di una certa importanza richiedeva terreni assai vasti, che non potevano più essere reperiti nelle zone urbane.

D'altra parte, il sistema degli acquisti di piccoli lotti già attrezzati si presentava sconsigliabile anche sotto l'aspetto del costo. I lotti urbani, in un periodo nel quale l'attività edilizia privata e sovvenzionata si stava sviluppando in misura sempre più intensa, raggiunsero infatti, rapidamente, prezzi sempre più elevati.

I quartieri autonomi

Gli Organi del Piano abbandonarono perciò il sistema della realizzazione di nuclei edilizi modesti con interventi eventualmente ripetuti, ed imboccarono con risolutezza la sola altra strada che si apriva davanti a loro, quella della realizzazione di quartieri autonomi, da far sorgere su aree non ancora urbanizzate, nei quali però gli alloggi fossero integrati, già in sede di progettazione, da tutti i servizi collettivi.

A distanza di tempo, la decisione deve essere valutata come un'avventura necessaria, affrontata animosamente e perseguita anche di fronte al concreto delinearsi di pericoli di vario ordine. Infatti su tale strada gli Organi del Piano dovettero procedere senza il sostegno delle Leggi in genere — carenti su questo punto — e in particolare della Legge istitutiva dell'INACASA, che raccomandava semplicemente, come si è visto, di scegliere aree già ben servite e collegate, ma non consentiva all'Ente la facoltà di provvedere con i propri mezzi i nuovi quartieri dei servizi collettivi, compresi quelli più indispensabili alla vita quotidiana.

Già nella relazione del Comitato sull'esercizio 1953-1954 il problema era posto in termini precisi:

Sono evidenti i riflessi sociali che derivano dalle soluzioni adottate per il reperimento delle aree edificabili. Fino a che si utilizzano, per la costruzione di alloggi di lavoratori, aree di modesta estensione che si inseriscono in un tessuto urbano preesistente, dotato già dei necessari servizi, i problemi di adattamento degli assegnatari alla vita dei nuovi quartieri non si pongono quasi, a

comunque non assumono preoccupante rilevanza. Quando invece si costruiscono vasti quartieri in aree poste alla estrema periferia della città, o addirittura staccate dal preesistente tessuto urbano, la vita dei nuovi ingenti nuclei che così si costituiscono trova faticoso avvio in mezzo a difficoltà di ogni genere, materiali e morali: e perché mancano o tardano ad essere approntati i servizi pubblici di collegamento; e perché mancano o sono male accessibili la Chiesa, la scuola, gli ambulatori, i negozi, i locali di divertimento o ricreazione, ecc.; e perché, in agglomerati troppo vasti, di persone virtualmente poco differenziate e di struttura professionale ed economico-sociale troppo omogenea, si determinano tensioni o storture che rendono difficile l'avvio di una ordinata vita collettiva.

Gli Organi direttivi del Piano si orientarono inizialmente verso la soluzione che importa meno difficoltà di adattamento ai lavoratori e consente un più rapido avvio delle costruzioni, e pertanto accordarono la preferenza a terreni già provvisti di servizi, vicini il più possibile ai centri degli agglomerati urbani, inseriti per piccoli lotti nelle maglie di espansione delle città. Ben presto, però, lo sviluppo delle attività edilizie, specie nei grandi centri, e le realizzazioni stesse dei programmi I.N.A.C.A., portarono ad un rapido esaurimento delle aree disponibili entro le cinte urbane, o comunque le rese inaccessibili per ragioni di prezzo, anche in relazione ai criteri urbanistici adottati, che richiedevano una utilizzazione edilizia sufficientemente distesa.

In sintesi:

La spinta verso l'estrema periferia delle grandi città, determinata dalle difficoltà di reperimento di aree centrali, e la conseguente necessità di creare nuovi quartieri, in zone sprovviste completamente di servizi, hanno portato gli Organi direttivi del Piano ad affrontare nuove responsabilità che il Legislatore non aveva previsto.

E, infine:

Anche in questo delicato settore si è cominciato col far ricorso a soluzioni contingenti, mano a mano che l'esperienza presentava, spesso con aspetti drammatici, nuovi problemi; ma presto la Gestione è passata alla progettazione urbanistica dei nuovi quartieri con una visione ampia ed organica delle

esigenze di vita dei nuclei da creare, prevedendo nel piano urbanistico tutti i servizi indispensabili al sorgere di una ordinata vita collettiva, anche se affidati ad altri Enti per la realizzazione o per la gestione.

La storia del Piano è in gran parte la storia degli sforzi compiuti per offrire alle nuove comunità che si venivano costituendo nelle periferie le condizioni necessarie a una vita civile: sforzi ininterrotti, che ottennero risultati alterni.

Si noti che via via che si perfezionavano criteri e mezzi per soddisfare determinate esigenze, si andava concretamente presentando la necessità di affrontarne e prevederne delle nuove; dopo aver provveduto ai negozi, si dovette pensare alle scuole, agli ambulatori, alla sistemazione e manutenzione degli spazi verdi, alle vie di allacciamento, alle Chiese, ai mercati, e via discorrendo.

In sostanza, il concetto di centro residenziale autonomo e di servizi collettivi, per necessità si andò gradualmente estendendo e arricchendo, parallelamente a quanto avveniva per i progetti degli alloggi. Si dette così inizio ad un nuovo sviluppo costruttivo che costituì il primo esperimento del genere su un piano nazionale.

Si trattava, in effetti, di un ordine nuovo di problemi a favore dei quali non poteva certamente giuocare la disponibilità di strumenti legislativi idonei, per il fatto stesso che in nessuna sede si erano ancora maturate, nel nostro Paese, una esperienza ed una consapevolezza sufficienti ad inquadrarli e a risolverli.

Alcune difficoltà vennero alleviate adottando particolari criteri. Fra l'altro, si era rilevato che la valorizzazione crescente dei terreni periferici (conseguenza anche delle scelte operate dall'INACASA) costringeva spesso l'Ente a sborsare prezzi di gran lunga maggiori per le costruzioni contigue ai primi nuclei di abitazioni e destinate ad ampliarli. Il Comitato venne perciò nella determinazione di costituire, in anticipo sulla realizzazione dei piani, un demanio di aree sufficiente per i futuri sviluppi previsti in ciascun Centro, interessandosi tempestivamente perché i Comuni provvedessero ad attrezzarli.

Inoltre, in vista delle prevedibili esigenze dei grandi complessi edilizi, si adottò l'orientamento di acquistare aree, in eccedenza al fabbisogno, da utilizzare per le future attività artigianali e commerciali.

La ricerca di zone periferiche (oltre a creare in partenza ai futuri assegnatari difficoltà per raggiungere il centro cittadino e i luoghi di lavoro) poneva il problema di inserire i nuovi quartieri extraurbani nei piani di sviluppo delle città, spesso in zone non comprese nei Piani Regolatori, i quali d'altra parte in molti Centri non erano stati ancora approvati.

Il problema era delicato, perché le iniziative dell'INACASA incidevano direttamente sulle future linee direttrici di sviluppo.

In materia, l'INACASA seguì il principio di interpellare le singole Amministrazioni Comunali circa la scelta delle aree per i nuovi quartieri; non solo, ma per le evidenti implicanze delle nuove costruzioni sulla fisionomia stessa delle città, procurò di invitare i rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e delle Sovraintendenze ai Monumenti, a partecipare ai lavori delle sue Commissioni tecnico-amministrative.

Naturalmente, la carenza di Piani Regolatori e di sviluppo per molte città costituì un grande ostacolo, che in alcuni casi rese difficile la scelta di aree ben dislocate.

I servizi collettivi

Tuttavia il problema di gran lunga più difficile rimaneva quello di dotare i nuovi quartieri dei servizi pubblici. Queste opere, come si è detto, non rientravano nella competenza della Legge sull'INACASA; buona parte di esse spettava ai Comuni, che disponevano però di mezzi inadeguati e non sempre potevano dare la precedenza alle urgenti necessità di nuovi quartieri per lavoratori.

Allo scopo pertanto di stimolare e facilitare l'intervento dei Comuni, gli Organi del Piano promossero tutta una serie di interventi e di accordi con le Amministrazioni interessate. In molti casi vennero concessi mutui ai Comuni, allo scopo preciso di provvedere ai pubblici servizi nei nuovi quartieri, sulla base di speciali forme di garanzia (quale, ad esempio, la concessione di deleghe per la riscossione di alcune imposte comunali).

I mutui concessi ai Comuni nei due Settenni ammontarono a oltre 20 miliardi. In altri casi, si concessero contributi da utilizzare per l'allestimento delle attrezzature sociali nei nuovi centri, con l'intesa che al funzionamento e alla manutenzione di tali attrezzature avrebbe provveduto il Comune con i propri mezzi.

Una terza forma di intervento fu la cessione ai Comuni interessati, a titolo gratuito, delle aree da destinare sia ai servizi pubblici che alle attrezzature sociali (ad esempio, agli ambulatori). Per provvedere poi con urgenza alle necessità quotidiane di vita delle nuove comunità, l'INACASA assunse l'iniziativa di costruire per conto proprio i negozi, che poi rivendette via via ai privati, e i « Centri Sociali », la cui gestione affidò a un Ente apposito.

Per le Chiese, si ricorse talora a soluzioni provvisorie, quale la concessione di locali al piano terreno, ad uso di cappelle; spesso invece l'INACASA offrì gratuitamente l'area per facilitare una soluzione definitiva.

Per quanto riguarda la sistemazione viaria, l'INACASA poteva costruire solo le strade di penetrazione, dalle grandi arterie ai nuovi quartieri, mentre le strade di attraversamento erano di competenza dei Comuni. La Gestione promosse al riguardo Convenzioni varie, che solo in parte divennero operanti. Alcuni quartieri rimasero, nonostante ogni sforzo, poveri di strade, e stentarono in complesso ad acquistare il carattere di centri autonomi.

Un passo avanti verso una soluzione più organica e razionale del problema fu rappresentato senza dubbio dall'iniziativa del C.E.P. (Comitato per il coordinamento dell'edilizia popolare), costituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Ad una Amministrazione Comunale, l'allacciamento viario e l'impianto dei servizi pubblici a vantaggio di nuclei esclusivi di un Ente e remoti dal centro urbano, poteva apparire, non senza qualche logica, una soluzione frammentaria, provvisoria, e in definitiva troppo costosa. Assai più razionale diventava invece lo sforzo quando fosse volto a servire vari nuclei di Enti diversi, riuniti in un solo vasto quartiere di periferia.

Il Comitato per il coordinamento dell'edilizia popolare, ponendo a base dei nuovi quartieri coordinati ed autosufficienti i criteri di scelta e trasformazione delle aree già adottati su larga scala dall'INACASA, sollecitò un intervento più attivo dei Comuni nell'impostazione dei quartieri stessi — dalla scelta delle aree alla loro tempestiva attrezzatura — e a tal fine distinse le opere che i Comuni dovevano realizzare in proprio (servizi generali, comprendenti le strade, l'acqua potabile, il gas, le fognature) dalle opere di carattere sociale come Chiese, scuole, asili-nido, negozi, mercati, Centri Sociali, delegazioni comunali, posta ecc.. Per queste ultime opere, come per la sistemazione delle aree non coperte, il Comune avrebbe ricevuto contributi da parte dei singoli Enti, in misura proporzionale alla loro partecipazione ai nuovi quartieri.

Si trattava di un miglioramento sostanziale, che non valse però ad eliminare complesse trattative e procedure, che prolungarono notevolmente i tempi tecnici di preparazione (Tav. 17). Al 30 giugno 1962, le aree acquistate dall'INACASA nei complessi C.E.P. aumentavano a 366 ettari; quelle in corso di acquisto a 24 ettari.

Dal punto di vista legislativo, la premessa per il graduale superamento di una situazione per troppo tempo paralizzante verranno poste solo dalla Legge n. 167 del 18 aprile 1962, che consentirà ad ogni Comune e anzi imporrà ai Comuni capoluoghi di Provincia, o superiori a 50.000 abitanti di formare, mediante esproprio, demani di aree da destinare all'edilizia popolare e d'impostare un piano organico per la graduale realizzazione, sulle aree stesse, delle opere e dei servizi complementari di vario genere.

L'INACASA è riuscita a realizzare, nei 14 anni del Piano, un complesso enorme di costruzioni, funzionali in gran parte anche sotto l'aspetto dei servizi, giovandosi, fra l'altro, della collaborazione del proprio Servizio Sociale, che si fece interprete dei bisogni della collettività presso i vari Enti specializzati.

Non sempre però si poterono evitare inconvenienti di varia natura, ritardi, inadeguatezze, e per conseguenza insoddisfazione degli assegnatari, sui quali ricadeva in definitiva il peso della mancata realizzazione di qualche attrezzatura. In vari casi — al di là di ogni sforzo di buona volontà — l'esecuzione delle opere risultò ritardata fino a portare un grave disagio alle famiglie.

Si verificarono anche diversi casi di ritardo nelle consegne degli alloggi da tempo ultimati, per mancanza degli allacciamenti fondamentali non ancora costruiti (al 30 giugno 1962, gli alloggi non ancora consegnati erano 14.862, su un totale di 140 mila alloggi ultimati).

Il costo dell'area

L'aspetto più difficile del problema delle aree fu però, senza dubbio, il fatale progressivo aumento dei costi.

Nel primo periodo del Piano, il costo di un'area attrezzata poteva aggirarsi sulle 1.000 lire al mq. Pertanto, in base alla densità adottata di 500 abitanti per ettaro, sulle 400 mila lire del costo massimo a vano di costruzione richiesto dalla Legge, l'area incideva per sole 20 mila lire, cioè nella percentuale bassissima del 5 per cento.

Ma il rapporto in seguito mutò profondamente, anche perché la densità massima consentita fin dall'inizio del Secondo Settennio non fu più di 500, ma di 300 abitanti per ettaro. I costi massimi di costruzione previsti, ad esempio, per le tre grandi città di Milano, Roma e Napoli, si possono computare attualmente (marzo 1963) in 750 mila lire a vano, di cui 150 mila per l'area (Tav. 21). Questa pertanto incide nella misura non indifferente del 20 per cento, pari al quadruplo di quella registrata all'inizio del Piano.

È bensì vero che una parte dell'aumento va attribuita al proposito di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, diminuendo la densità di abitanti in ogni complesso di abitazioni. Ma è da riconoscere che la spesa per l'area nuda, e quella che l'INACASA si è accollata per le sistemazioni ed attrezzature è aumentata, in proporzione, più degli altri costi.

Si può calcolare, partendo dal citato massimale di 150 mila lire a vano, il costo attuale al metro quadro di un'area attrezzata: sulla base di 33 mq per vano (pari a 300 abitanti per ettaro) esso sale a 4.500 lire, contro le 1.000 lire al mq del primo periodo.

Il problema della progettazione si presentava condizionato da una duplice esigenza: realizzare rapidamente lo studio dei progetti, e ottenere una elaborazione qualificata. Si trattava cioè di mantenere il ritmo veloce richiesto da un intervento contro la disoccupazione, e nello stesso tempo di trarre il miglior risultato possibile da un così largo impiego di mezzi finanziari.

Il criterio che guidò l'INACASA fu di accantonare qualsiasi metodo basato sulla ripetizione di tipi edilizi prefissati e standardizzati, evitando di addossare la progettazione ai propri uffici tecnici, e affidando invece il compito alle forze della libera professione. Il sistema adottato si basò sul concorso nazionale pubblico, ed aperto a tutti i professionisti italiani del ramo, per scegliere, mediante progetti e titoli, gli architetti ed ingegneri cui affidare l'ideazione delle opere.

Si preferì cioè scegliere i progettisti e non i progetti, per un complesso di ragioni che poggiano sopra una ormai lunga esperienza. Si è constatato, infatti, che molto spesso i progetti risultati vincitori dei concorsi banditi per singoli edifici e per complessi edilizi di ogni genere, non possono essere posti in esecuzione per diversi motivi, e soprattutto per la mancata aderenza alle esigenze funzionali di dettaglio che si manifestano poi nell'attuazione pratica: perciò occorre procedere successivamente ad una loro rielaborazione, in base alle concrete esigenze di funzionalità richieste dall'Ente o dal privato che deve usare l'edificio. Ciò rappresenta un'operazione che richiede un maggior costo in denaro e un ulteriore periodo di tempo per la progettazione, di cui l'Ente spesso non può disporre.

Non era inoltre possibile ripetere il concorso nazionale per ogni complesso residenziale importante, sia perché questi erano molto numerosi, sia perché la cosa avrebbe richiesto un rilevante sforzo organizzativo da parte dell'Ente, ed un logorio di energie da parte dei professionisti ripetutamente e troppo di frequente chiamati a concorrere preparando sempre nuovi progetti; una produzione destinata a rimanere sterile, con danno anche per la comunità.

Per contro, il metodo adottato dall'INACASA puntava sulla capacità dei progettisti risultante da una scelta adeguata e rigorosa, e cioè sul solo elemento atto a garantire in ogni caso la qualità ed il livello della produzione - salvo beninteso il successivo giudizio esercitato volta per volta sui progetti.

La scelta dei progettisti

Il primo grande concorso nazionale per progetti-tipo di case per lavoratori, bandito nell'ottobre del 1949, ebbe come risultato la formazione di un primo elenco di 220 progettisti classificati idonei, i quali vennero iscritti in uno speciale Albo di professionisti di fiducia, appositamente istituito. Ciò permise di individuare tra gli ingegneri e architetti italiani i più preparati alla progettazione di organismi edilizi a carattere economico. In seguito, durante il 1950-51, alcune Stazioni Appaltanti, seguendo le direttive e adottando i criteri dell'INACASA, bandirono altri 31 concorsi (fra nazionali e locali, in 22 province ai quali venne conferita dalla Gestione la stessa validità di selezione, portando così il totale dei professionisti iscritti nell'elenco a 1.210 (665 architetti e 545 ingegneri).

In un primo periodo, che si potrebbe dire sperimentale (gennaio-giugno 1950), le Stazioni Appaltanti cui spettava la cura del progetto e quindi la designazione dei progettisti, furono semplicemente « invitate » a giovare della facoltà di scegliere entro l'elenco. Ma successivamente, in base all'esperienza che aveva ampiamente dimostrato la convenienza di giovare dei vincitori del concorso, divenne obbligatorio limitare la scelta ai progettisti iscritti nell'Albo, ad eccezione dei casi in cui le opere da progettare risalissero all'iniziativa di Aziende e Cooperative.

Questa grossa immissione nel processo edilizio di energie e capacità diede modo di eseguire la necessaria mediazione fra burocrazia e clientela, questa ultima rappresentata da

lavoratori, operai e impiegati, che non potevano esprimere direttamente e compiutamente i loro desideri e le loro esigenze. Comprendere ed interpretare tali esigenze divenne da allora compito degli architetti.

Ebbe così inizio una complessa attività di collaborazione di nuovo tipo, tra Uffici Centrali, Enti periferici e progettisti; e precisamente fra gli Organi del Piano i quali formulavano i programmi, li finanziavano e ne controllavano l'esecuzione, le Stazioni Appaltanti che proponevano le aree, sceglievano i progettisti e curavano l'esecuzione delle opere, e i professionisti che studiavano i progetti.

Con particolare impegno gli Uffici centrali e le Commissioni di esame della Gestione affrontarono il compito di fiancheggiare, consigliare e guidare gli architetti e ingegneri impegnati nella progettazione. In vista di tali compiti i quadri degli Uffici del nuovo Ente e le Commissioni di consulenti ed esperti (dove erano rappresentati gli Ordini e le Associazioni professionali e l'Istituto Nazionale di Urbanistica), furono formati fin dall'inizio da professionisti qualificati, studiosi e docenti universitari. Tale criterio originò direttamente una qualificazione del lavoro ed un rilevante innalzamento del tono di tutta la produzione.

Contrariamente a quanto in generale si ritiene, la casa economica costituisce uno dei temi edilizi più difficili e appassionanti. Una cellula abitativa di costo ridotto, ma rispondente ai requisiti di una vita familiare sana e confortevole; la ripetizione di questa cellula in edifici che non assumano l'aspetto di falansteri monotoni e soffocanti; la disposizione dei volumi studiata in modo da assicurare a tutti buona esposizione e soleggiamento, spazi collettivi variati e visuali ampie e gradevoli. Sono problemi tecnicamente e figurativamente assai impegnativi, la cui soluzione si riflette sulla vita degli abitanti e incide sullo stesso carattere dei Centri urbani maggiori e minori.

Suggerimenti, norme e schemi

Il sistema adottato dall'INACASA, di affidare ai liberi professionisti l'ideazione dei quartieri e degli edifici, richiedeva però una particolare cura per mantenere a tutto il complesso delle costruzioni dell'Ente un'impronta unitaria, sia sotto il profilo urbanistico e tecnico, sia sotto quello economico e sociale. Occorreva cioè conferire all'opera di tutti i progettisti impegnati appartenenti, si badi, a tutte le correnti e tendenze dell'architettura e dell'urbanistica italiana una sufficiente compattezza di criteri, di metodi e di risultati.

Pertanto oltre alla istituzione dei normali controlli (mediante le Commissioni esaminatrici dei progetti e gli esami analitici condotti d'ufficio), fu realizzata una nuova iniziativa diretta all'aggiornamento dei progettisti. Nel 1949-50 furono pubblicati e largamente diffusi due fascicoli contenenti « Suggerimenti, norme e schemi » per la progettazione edilizia e per quella urbanistica.

Attraverso questi veicoli capillari, che rendevano facilmente disponibile il frutto di lunghi studi effettuati in tutto il mondo, gli ingegneri e gli architetti ebbero a disposizione schemi ed esempi illustrati in forma sintetica e chiara, e poterono giovare di consigli e avvertimenti che produssero un sostanziale aggiornamento nell'impostazione del loro lavoro.

I suggerimenti espressi nel primo fascicolo, diffuso nell'ottobre 1949, riguardavano soprattutto l'impostazione che occorreva dare ai progetti sotto il profilo economico e la necessità di pervenire ad un equilibrio fra diverse esigenze. Quella di evitare qualsiasi spesa superflua, studiando le dimensioni degli ambienti e l'utilizzazione dello spazio in modo da riuscire a dare alla casa una perfetta funzionalità ed un aspetto lieto ed accogliente. E così pure l'esigenza di impostare l'ideazione del progetto in maniera da ottenere un adeguato sfruttamento edilizio (economia di spazio, di materiali e di tempo), buone condizioni di abitabilità (benessere della famiglia), e, infine, un buon livello di qualità formale (valore architettonico generale della produzione).

A queste raccomandazioni, che in pratica ebbero l'effetto di vere e proprie norme, l'INACASA aggiunse una enunciazione programmatica in cui si definiva l'edilizia del piano come « edilizia psicologica », e cioè diretta a realizzare le migliori condizioni ambientali per la vita del lavoratore, sia nella creazione dei quartieri (con ampi spazi verdi, visuali variate, edifici diversi nelle dimensioni, forme e colori), sia nella realizzazione degli alloggi. I « suggerimenti » per i progettisti riportati nei fascicoli citati sono ampiamente trattati nell'ultima parte della presente pubblicazione, a pag. 409.

Dal punto di vista urbanistico, l'INACASA provide per ciascun Centro di grandi e medie dimensioni, a raggruppare gli alloggi programmati in nuclei edilizi e in quartieri residenziali organicamente concepiti, e ubicati secondo le linee direttive dei Piani Regolatori comunali, in modo da potenziare le direttrici di sviluppo previste per gli insediamenti urbani.

Nello stesso tempo, si stabiliva la unificazione dimensionale di alcuni elementi edilizi, e cioè l'altezza dei piani, le dimensioni dei gradini delle scale, le dimensioni delle finestre e delle porte interne. Questa disposizione voleva essere un primo avviamento alla normalizzazione e standardizzazione dei tipi edilizi. Ma nelle successive fasi incontrò difficoltà di vario ordine anche presso Enti, imprese e progettisti, fra l'altro perché l'entità dell'area di applicazione dell'esperimento era relativamente ridotta rispetto all'intero volume della produzione nazionale.

Negli anni seguenti, in una continua successione di sforzi di miglioramento, furono sperimentati altri metodi di progettazione. Nel 1958 venne adottato il sistema della « ripetizione dei progetti », impiegando in altre località progetti già realizzati con esito positivo sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. La ripetizione era decisa quando le condizioni di luogo e di ambiente si presentavano simili e quelle originarie, e comunque l'adattamento alle nuove aree era affidato alle cure dello stesso progettista. Un secondo sistema, applicato in una trentina di casi negli anni 1953-54, ma limitato ai complessi di entità superiore a 300 milioni di lavori, fu quello dei concorsi-appalto. Qui si presen-

tava soprattutto la difficoltà di conciliare due termini discordanti ed opposti: la qualità edilizia e architettonica con l'economia. I risultati architettonici, tecnici ed anche economici di questo grosso esperimento furono buoni, ma gli ostacoli costituiti da questioni di procedura e dai ricorsi, che in qualche caso imposero l'annullamento ed il rifacimento della gara, ne sconsigliarono l'adozione definitiva. Un terzo sistema, di gran lunga il più adottato, fu quello di raggruppare i professionisti in *équipes*, come si vedrà a suo luogo.

Il concetto dello standard nella determinazione dei tipi edilizi e degli alloggi-tipo fu adottato senza riserve ed applicato a fondo, ottenendo risultati positivi: il razionale sfruttamento dello spazio nell'appartamento, riducendo al minimo indispensabile i disimpieghi, l'ingombro delle aperture e degli impianti, e lo studio preventivo e preciso dell'arredamento miravano a calibrare i singoli vani al loro uso nel modo migliore. Per ciò che riguarda i sistemi di costruzione, l'INACASA accolse più volte da parte di Aziende, Stazioni Appaltanti e progettisti la proposta di sperimentare nuovi metodi e materiali: ciò portò, tra l'altro a realizzare alcuni edifici e nuclei e anche complessi parzialmente e totalmente prefabbricati, in cemento armato, in muratura e in acciaio.

Nel 1955, in vista della proroga del Piano, l'INACASA effettuò un generale lavoro di revisione dei risultati conseguiti, mediante uno studio attento e particolareggiato degli elementi disponibili. Per quanto riguarda la progettazione lo studio comprese, oltre alle inchieste e interviste presso gli assegnatari, di cui si è già parlato a proposito dei criteri di costruzione, al fine di rilevare gli inconvenienti funzionali e costruttivi direttamente constatati da chi abitava nelle case, la raccolta ed il vaglio dei rilievi e delle proposte formulate da tutti coloro che avevano svolto funzioni tecniche: progettisti, direttori dei lavori, ispettori tecnici e collaudatori.

In tale occasione l'Ente organizzò un Convegno delle maggiori personalità italiane dell'architettura e della tecnica edilizia, le quali fornirono un decisivo contributo di osserva-

zioni, esperienze e consigli per l'impostazione dei piani e dei lavori del Secondo Settennio.¹ Questa ricerca produsse una revisione ed un aggiornamento delle norme, ripubblicate e diffuse nel 1956 attraverso l'ormai consueto mezzo dei fascicoli-guida e l'introduzione di nuove norme per la scelta dei progettisti. Ancora una volta il criterio di scelta non poteva essere che quello del concorso su base nazionale, aperto a tutti i professionisti italiani. Ma la necessità che si presentava urgente era quella di perfezionare i metodi di progettazione, assicurando una armonica composizione dei gruppi, considerato anche il fatto che in quelli formati per associazione spontanea o concordata si erano potuti constatare risultati certamente migliori.

Pertanto all'inizio del Secondo Settennio il metodo fino allora seguito fu perfezionato mediante l'istituzione di due elenchi di progettisti, l'uno riservato ai gruppi e l'altro ai singoli (per la progettazione di case in piccoli lotti). L'innovazione più importante fu quella del concorso per gruppi: il bando pubblicato nel giugno 1955, stabiliva trattarsi di un concorso per titoli, al quale i concorrenti dovevano presentarsi « associati in gruppi, costituiti in modo da assicurare la presenza delle diverse specializzazioni della tecnica edilizia, e perciò tali da formare delle unità professionali complete ». Si chiedeva cioè una reciproca integrazione delle diverse competenze in seno al gruppo, che sola poteva assicurare alla *équipe* un funzionamento armonico ed una aumentata capacità di fronte al difficile problema della progettazione di interi quartieri residenziali.

I risultati quantitativi del concorso per gruppi furono i seguenti: 433 gruppi concorrenti, con un totale di 1.819 professionisti fra architetti, ingegneri, geometri e periti industriali edili. Il numero dei gruppi classificati idonei fu di 292 e quello dei non idonei di 141, corrispondenti rispettivamente al 67,5 per cento e al 37,5 per cento. Nel concorso per

¹ Alla riunione presero parte: Giovanni Astengo, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Marcello Cammo, Pasquale Carbone, Salvatore Caronia, Carlo Cocchia, Gino Cipriani, Daneri Enrico Del Debbio, Raffaele Fagnola, Arnaldo Gatti, Saul Greco, Adalberto Libera, Plinio M. Rossi, Roberto Ranzani, Adriano Olivetti, Roberto Ranzani, Ugo Rossi, Bruno Zevi, Mario Morpurgo, Saverio Muratori, Giovanni Muto, Pier Luigi Nervi, Adriano Olivetti, Roberto Ranzani, Ugo Rossi, Bruno Zevi, Giulio Rossico, Giuseppe Samonà, Giuseppe Vaccaro, Cesare Valle, Virginia Valler, Bruno Zevi, Vittorio Zucchi.

progettisti singoli, i partecipanti furono 1.080, dei quali risultarono idonei 531. Nel Secondo Settennio del Piano, in seguito a tale concorso, tutta l'attività di progettazione si giovò di un sensibile miglioramento dei metodi, che contribuì a perfezionare il processo di ideazione e quello di progettazione vera e propria, nonché i criteri di giudizio in tutte le fasi. L'impostazione urbanistica fu preceduta da indagini critiche sul rapporto città-quartiere e sulle implicazioni connesse all'inserimento di un nuovo complesso residenziale nell'organismo urbano. Lo studio dei piani urbanistici fu condotto considerando aspetti socio-economici, edilizi e tecnico-economici, e coordinando i rapporti e le competenze di tutti gli Enti interessati. La progettazione urbanistica e quella edilizia furono approfondite per gradi successivi, giovandosi di tutti i vantaggi del lavoro in *équipe*. L'economia delle costruzioni fu oggetto di studio speciale e così la dotazione di servizi pubblici, di impianti tecnici e la sistemazione delle aree scoperte.

Altri potrà valutare, in seguito, i risultati di questa nuova fase della progettazione, iniziata nel 1956-57. Qui ci limitiamo a rilevare lo sforzo che fu compiuto per qualificare l'edilizia del Piano in modo nuovo e rispondente alle istanze dei tempi, in base a moderni metodi di progettazione via via aggiornati, nell'intento di offrire ai lavoratori italiani case a livello della migliore produzione europea.

A questo proposito riteniamo opportuno riportare anche alcune osservazioni dello Zevi, che ci sembra tocchino i punti essenziali della progettazione INACASA:

« Ogni famiglia che abiterà i nuovi centri dell'INACASA scoprirà, sia pur lentamente, che l'architetto ha dato alla casa qualcosa di più della mera funzionalità, qualcosa di impercettibile, che una mente acritica non accoglie immediatamente, ma che si sente nel vivere; qualcosa che trasforma quattro mura in quattro mura pensate, e pensate affettuosamente, e che in definitiva determina il passaggio dall'edilizia all'architettura, da un telegramma a una lettera scritta con cura ed amore. Nulla sono costati finanziariamente questa cura e questo amore e spesso sono serviti a far risparmiare; è appunto questo « di più », questo sforzo non richiesto e non imposto da leggi, questo contributo disinteressato, quel qualche cosa che un freddo pragmatico riterrebbe « inutile », che conferisce a queste case un valore letterario e d'arte, un valore che non si misura in soldi, ma in termini di benessere e di felicità umana ».

La rapidità di attuazione e il contenimento dei costi. Ecco le due componenti decisive per il raggiungimento degli obiettivi del Piano visti sotto l'aspetto, diciamo così, quantitativo, che erano: costruire il più gran numero di alloggi e dare il massimo incremento all'occupazione operaia.

Non per nulla coloro che all'inizio esprimevano scetticismo, o intransigenza, nei confronti delle future realizzazioni dell'INACASA in confronto alla mole dei mezzi e delle strutture, appuntavano la loro sfiducia su due aspetti: la impossibilità congenita per un'impresa burocratica di raggiungere una snellezza organizzativa, e di operare con la necessaria rapidità, e la sua inefficienza e incapacità a contenere i costi, sia di costruzione che di gestione e spese generali.

I fatti dicono che l'INACASA, nel Primo Settennio, ha ultimato ed assegnato 148.000 alloggi — con un ritmo « di regime », per la maggior parte del periodo, di 500 alloggi la settimana — e che nel Secondo Settennio ha ultimato ed assegnato altri 170.000 alloggi, mantenendo per vari anni la cadenza di 700 alloggi la settimana. Queste cifre, mentre contemporaneamente si cercava di raggiungere nelle costruzioni il più alto livello di qualità e di decoro, sono già per sé un elemento indicativo che la politica di contenimento di tutti i costi, forse la più difficile fra quelle affrontate nel Piano, è stata condotta con risultati in complesso positivi.

Il problema dei costi era importante e delicato anche da un altro punto di vista: le ripercussioni sugli assegnatari, su coloro cioè a cui il Piano era più direttamente destinato, sui quali in ultima analisi il costo, qualunque esso fosse, avrebbe fatto la differenza. Non si dimentichi che i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dell'alloggio erano di specie nei grandi Centri, a immettere nelle nuove abitazioni famiglie veramente bisognose, con scarse possibilità quindi di corrispondere i canoni, sia di riscatto che di locazione, e meno che questi non scendessero al livello delle più modeste risorse e possibilità.

La Legge, preoccupandosi di ciò, aveva stabilito facilitazioni adeguate. Negli alloggi a locazione l'aliquota del fitto annuo non doveva superare l'1,50 per cento del valore di

alloggi assegnati con promessa di vendita, il riscatto doveva avvenire in un periodo di 25 anni, senza la corresponsione di alcun interesse, non solo, ma per di più con l'abbuono, a carico dello Stato, di circa il 15 per cento del capitale.

Costo e qualità

Le norme integrative della Legge istitutiva avevano espressamente indicato in cifra il limite massimo di 400 mila lire a vano « superabile soltanto qualora si verificassero apprezzabili variazioni nel livello dei costi » e ciò in un periodo che vedeva i costi dell'edilizia sovvenzionata arrivare, non di rado, a cifre assai superiori per costruzioni di tono contenuto. La Legge specificava altresì che nella scelta dei tipi degli alloggi si doveva « tener presente la necessità di ottenere il maggior numero di alloggi con il minor costo possibile ».

Sarà forse opportuno indicare in concreto a quale carico finale per il singolo assegnatario conduceva questo limite iniziale di costo. Per un alloggio di 5 vani, del costo quindi di 2 milioni, il canone medio di locazione in base all'aliquota stabilita dalla Legge, dell'1,50 per cento, ammontava a circa 1.700 lire mensili; per lo stesso alloggio, il canone mensile di riscatto in 25 anni risultava di L. 5.700 escluse, sempre, le spese di amministrazione e manutenzione. Questi massimali di canone apparivano in sé modestissimi — se ragguagliati ai prezzi del mercato libero — e tuttavia, per le possibilità economiche estremamente ridotte degli assegnatari dell'INACASA, rappresentavano già un impegno non trascurabile e in alcuni casi notevole.

Subito dopo i primi mesi del Piano, l'INACASA si trovò ad affrontare il rialzo generale dei prezzi del mercato, connesso in buona parte a gravi avvenimenti internazionali — guerra di Corea — il cui livello è misurabile dagli indici riportati nella Tav. 19.

Nel giro di pochi mesi il costo della mano d'opera nell'edilizia aumentò del 10 per cento, e quello dei materiali impiegati nelle costruzioni del 15 per cento. Contemporaneamente la stessa spinta della ricostruzione italiana determinò, specie nei grandi Centri, il noto fenomeno di un aumento del prezzo delle aree in misura più volte maggiore rispetto agli altri prezzi.

Una causa particolare di aumenti era connessa con lo stesso estendersi dell'attività dell'INACASA costretta, come si è visto, ad impiantare i suoi complessi edilizi di dimensioni sempre crescenti in aree non ancora urbanizzate, con necessità quindi di realizzare o facilitare la realizzazione di attrezzature di ogni genere.

Le difficoltà da affrontare furono quindi aspre e sempre diverse, se si volevano costruire case solide e durevoli che comportassero poi limitati costi di manutenzione, se non si voleva cioè rinunciare a quelle caratteristiche di livello delle costruzioni (superficie media, altezza dei piani, distacchi fra gli edifici, ecc.) che gli Organi stessi del Piano, più che la Legge istitutiva, avevano deciso di assicurare alle nuove case, per combattere l'affollamento e conseguire le finalità sociali di un moderno piano per i lavoratori.

I costi massimi a vano

Si constatò in questo campo, più ancora che altrove, quanto fosse preziosa la possibilità lasciata per legge agli Organi del Piano di un'azione normativa autonoma, mediante la quale le norme sui massimali di costo poterono continuamente essere aggiornate e articolate in nuove forme, cercando di difendere — quasi metro per metro — i lavoratori destinatari del Piano dalle gravi conseguenze, di vario ordine, di un aumento incontrollato dei costi.

Le tappe di questa azione normativa e di controllo costituiscono un capitolo a sé: esse hanno registrato la successiva introduzione in questa materia di vari ordini di criteri: la differenziazione dei costi massimi secondo località e tipo di progetto, l'enucleazione dai massimali del costo dell'area, la graduazione dei costi massimi in presenza di particolari complementi costruttivi o oneri speciali, ecc., come è dettagliatamente esposto nella parte finale della presente pubblicazione, a pag. 408

Come prima cosa si riconobbe che gli stessi termini del dilemma costo-qualità delle costruzioni si ponevano in modo differenziato per le varie località e per le varie categorie di lavoratori, ponendo l'accento talvolta sull'uno e talvolta sull'altro aspetto.

Allo scopo di contenere i costi medi generali — pur avendo dovuto aumentare i massimali in alcune località — furono quindi previsti tre tipi di costruzioni differenziati a seconda dell'importanza della località, ciascuno vincolato da superfici minime degli alloggi, altezza dei piani, larghezza di scale, balconi, distacchi, ecc. Si poté così stabilire un sistema di massimali costi massimi per vano legale delle costruzioni differenziato per località e tipo di costruzione in ragione di 320-350-380 mila lire a vano, e si introdusse anche, per le località più disagiate, un tipo « speciale » poi detto « semirurale » di costruzioni aventi caratteristiche modeste, pur nel rispetto delle esigenze igieniche e funzionali e dei regolamenti edilizi, con il costo massimo di 270 mila lire a vano.

Dall'ottobre 1955 il costo massimo fu sempre rapportato, anziché al complesso della costruzione, al costo esclusa l'area, in modo da enucleare i singoli casi di notevole costo del terreno che, come si è detto, si andavano presentando con sempre maggiore gravità.

Si faceva riferimento, naturalmente, al costo dell'area « attrezzata », compresa cioè la rete dei servizi principali, gli oneri per le attrezzature sociali, il rischio delle anticipazioni ai Comuni, ecc., mentre nel massimale della costruzione vera e propria restavano compresi gli allacciamenti dei servizi alle reti principali ed i compensi vari per progettazione, direzione lavori e collaudi.

1. Le attrezzature sociali delle nuove e vecchie piazze che risulteranno dalle nuove sistemazioni e sistemazioni delle zone libere, dovranno essere previste nel rispetto dei rapporti preesistenti fra gli spazi liberi e le attrezzature sociali, come si è detto, per la progettazione urbanistica. - Fase n. 2, pag. 91.
Verona - Comune di S. Lucia - Progettazione Gruppo M. Sacripanti



Si analizzarono quindi le diverse componenti del costo, in modo da distinguere gli eventuali superi del costo massimo sussistenti in casi normali, da quelli dovuti a costi supplementari od oneri speciali: di questi ultimi si tenne conto attraverso una opportuna graduazione dei massimali. Ciò avvenne via via che si decideva di soddisfare nuove esigenze, introducendo elementi di « comfort » non previsti nei progetti primitivi, che avevano un carattere più modesto e più rigidamente economico. Così s'introdussero supplementi per gli impianti di termosifone, per le russe o cantine, ecc.; fra gli oneri speciali ricordiamo invece quello relativo alle costruzioni antisismiche. Inversamente, in attuazione di una precisa disposizione della Legge, si prevede fin dall'inizio la riduzione del costo massimo consentito in caso di concessione gratuita delle aree, di cui il Piano ha potuto largamente beneficiare, nel primo periodo, per l'iniziativa di Aziende e anche di Comuni. Nella Tav. 21 sono riportati i massimali di costo in vigore verso la fine del Piano INACASA.

L'azione per contenere i costi

Accanto alla capacità normativa degli Organi del Piano il problema dei costi mise alla prova l'efficienza organizzativa e tecnica dell'Ente in tutte le fasi costruttive, che dovevano peraltro essere svolte ottenendo la essenziale collaborazione delle Stazioni Appaltanti e di tutti gli altri Enti delegati a svolgere i vari compiti.

I mezzi adottati per contenere i costi di costruzione — ed ottenere quindi l'effettivo rispetto dei massimali nonostante l'aumento continuo dei prezzi — riguardano infatti le disposizioni prese per l'acquisizione delle aree, la progettazione, gli appalti e l'esecuzione dei lavori, le facilitazioni concesse alle imprese e, infine, il controllo delle spese generali.

Abbiamo già parlato di quanto fu fatto per evitare l'acquisto di lotti per piani successivi a prezzi sempre più cari, demanio aree e per evitare i prezzi inaccessibili a cui erano arrivati i terreni di Piano Regolatore: acquisto di aree extraurbane con relative complicazioni,

Alle imprese si arrivò a riconoscere facilitazioni come l'anticipazione fino all'85 per cento dell'importo dei materiali approvvigionati, mentre si adottò una formula parametrica di revisione dei prezzi dei materiali e della mano d'opera in ciascuna provincia.

Si cercò inoltre di razionalizzare la progettazione con l'indicazione di una serie di schemi-tipo, sui quali però — come si è illustrato ampiamente nel capitolo precedente — si lasciò operare la ricerca individuale dei progettisti, scartando l'altra soluzione che sarebbe stata costituita dalla imposizione uniforme di veri e propri « progetti-tipo ».

In sede di approvazione dei progetti (che la Legge riservava alla Gestione) si cercò inoltre di eliminare le soluzioni troppo costose, prescrivendo semplificazioni a quei progetti che oltrepassassero i limiti di costo stabiliti o presentassero soluzioni puramente ornamentali o superflue o addirittura eccentriche.

In sede di appalto ed esecuzione dei lavori, la Gestione si sforzò di ridurre i costi sia favorendo i concentramenti di più cantieri nella stessa località, e l'utilizzazione del materiale di costruzione più facilmente reperibile sul luogo, sia attirando (e scontando nelle offerte di appalto) la fiducia delle imprese con l'assicurare la migliore funzionalità dell'apparato e con l'evitare qualsiasi ritardo nei pagamenti che non fosse richiesto dalle esigenze di un controllo sistematico e preciso.

Si ricordi che alle Stazioni Appaltanti era riconosciuta la facoltà di utilizzare capitolati propri anziché quelli dell'INACASA, quando queste soluzioni apparissero più convenienti per le esigenze locali.

Il metodo del forfait (escluse fondazioni) fu quello generalmente adottato. D'altra parte, per assicurare serietà e concretezza allo svolgimento degli appalti, rinunciando ad illusorie riduzioni dei costi, l'INACASA non esitò ad introdurre, in tutte le sue gare, fin dal Primo Setteennio, il metodo delle « medie compensate » che ha dato, per unanime riconoscimento, favorevoli risultati e viene applicato anche in altri settori della edilizia pubblica sia pure con varianti relative alla correzione delle medie.

Delle spese generali abbiamo già detto ricordando la loro limitata incidenza (2,5 per cento della spesa totale), nonostante la complessità degli adempimenti.

È pure interessante rilevare che la incidenza media dei compensi alle Stazioni Appaltanti è risultata pari al 2,5 per cento (comprensivo del compenso per la direzione dei lavori); quella per i progettisti dell'1,5 per cento e quella per i collaudatori dello 0,3 per cento nel Primo Settennio, salito allo 0,5 per cento nel Secondo, a seguito dell'aumento della tariffa.

Per quanto riguarda l'area, la sua incidenza sui costi di costruzione è molto variabile: come si è accennato parlando del problema delle aree in generale (pag. 77), si può dire che essa è passata dal 5 per cento nel Primo Settennio al 20 per cento nel Secondo, sempreché si faccia riferimento al costo dell'area attrezzata nei grandi Centri gravante sull'INACASA.

Per il complesso delle costruzioni del Primo Settennio, il costo medio a vano, incluse tutte le spese gravanti sull'INACASA per la costruzione, l'area e relativa attrezzatura, i servizi e le spese generali, è risultato pari a 402 mila lire. Nel Secondo Settennio si calcola a 514 mila lire per vano.

Per valutare questi costi del Secondo Settennio si tenga presente che i vani hanno una superficie media di 15,6 mq. Tav. 18 e una cubatura media di 46,7 mc. Va chiarito che i due dati sono ottenuti rapportando la superficie e la cubatura del singolo alloggio al numero dei vani legali.

L'azione per ridurre i canoni

Contemporanea a questo sforzo nel campo delle costruzioni fu, all'estremo opposto, l'azione per contenere le ripercussioni degli aumenti dei costi sui canoni di riscatto e di locazione. Attese le finalità del Piano, i due aspetti furono infatti considerati sempre come due facce dello stesso problema. L'azione assunse varie forme, e si svolse in più direzioni.

Si curò che l'onere conseguente all'aumento dei costi fosse ridotto al minimo, ove l'assegnatario si trovasse in situazione di difficoltà economica. A questo fine si stabilì una

gamma di aliquote diverse per i canoni di fitto, rapportate alla situazione economica non solo delle varie Province, ma delle singole località nell'ambito di ogni Provincia, cosicché l'aliquota di fitto, che secondo la legge poteva arrivare a un massimo dell'1,50 per cento, scese in molti casi fino allo 0,50 per cento.

Si ricorda anche l'elevazione (per gli alloggi del piano Aggiuntivo) della durata del periodo di riscatto al massimo ammesso dalla Legge e, in alcuni casi di particolare bisogno, l'autorizzazione al passaggio dal riscatto alla locazione, anche in deroga alle norme vigenti per gli alloggi del piano ordinario.

Si cercò anche di mettere in grado il lavoratore, fin dal momento della sua partecipazione ai bandi di assegnazione, di proporzionare la richiesta del numero di vani alle proprie capacità economiche. Ciò costringeva a fissare in un primo tempo un costo provvisorio, e successivamente, una volta chiusa la contabilità dei cantieri, a rivedere il costo stesso per stabilire costo e canoni definitivi, in modo da evitare, per quanto possibile, gli oneri non ripartibili fra i vari assegnatari.

In casi difficili, ferma restando la difesa generale della diga contro la pressione dei costi in ascesa, si prese la responsabilità di concedere in sede di Comitato, su proposta della Gestione, deroghe particolari ai limiti di costo generali. Contemporaneamente però, in vista dei fini del Piano, si adottò come estrema risorsa, nell'interesse degli assegnatari, la decisione di prevedere nel bilancio la voce dei costi non imputabili agli assegnatari di alloggi (che in media ha avuto nei 14 anni, l'incidenza dello 0,69 per cento) in modo che i maggiori costi autorizzati in base alle deroghe non venissero a gravare direttamente sugli assegnatari del singolo complesso.

Infine, per completare il quadro dei provvedimenti a favore degli assegnatari, si può richiamare, per gli alloggi a riscatto, l'introduzione dell'amministrazione autonoma e, per gli alloggi in locazione, le Convenzioni strette dall'INACASA con i vari Enti amministratori per controllare e contenere gli oneri dell'amministrazione e della manutenzione a carico degli inquilini.

Tav. 16 — Attuazione del Piano INACASA (1° e 2° Settennio) nelle varie fasi, al 30 giugno di ciascun anno

AL 30 GIUGNO DELL'ANNO	PRO-GRAMMA	STANZIA-MENTI	APPALTI	ENTRATE DI COMPE-TENZE	LAVORI ESEGUITI	NUMERO ALLOGGI ULTIMATI	NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI
	MILIARDI DI LIRE						
1950	139,7	137,6	66,2	36,8	16,4	—	—
1951	312,2	171,4	108,1	77,1	68,8	30.178	25.346
1952	312,2	227,9	163,5	121,2	122,5	51.332	50.679
1953	312,2	279,7	229,9	167,4	176,8	82.218	76.462
1954	332,5	306,4	266,4	223,6	231,4	106.648	108.108
1955	332,5	312,2	297,7	285,5	275,8	128.120	125.559
1956	332,5	312,3	309,—	325,1	306,4	139.770	139.820
1957	932,5	475,5	347,4	413,1	339,3	147.099	150.074
1958	932,5	671,5	470,3	484,7	398,7	160.135	176.095
1959	932,5	779,—	636,6	558,9	516,9	191.399	216.329
1960	932,5	818,6	741,—	637,3	667,3	240.406	267.452
1961	932,5	862,1	789,2	729,5	777,—	277.976	295.473
1962	932,5	879,3 ¹	804,8	836,9	842,6 ¹	299.228	307.063

¹ Gli importi degli stanziamenti e dei lavori eseguiti includono le relative « integrazioni » approvate dopo lo stanziamento; nell'importo dei lavori eseguiti comprende anche le spese effettuate per aree e progetti « a demanio ».


Tav. 17 — Partecipazione dell'INACASA ai programmi C.E.P.*

QUARTIERI COORDINATI	MILIARDI DI LIRE	QUOTA DA DEFINIRE
Torino	2	
Bergamo	2	
Milano	2	
Bolzano	2	
Treviso	2	
Venezia	2	
Trieste	2	
Genova	2	
Bologna	2	
Firenze	2	
Livorno	2	
Pisa	1,7	
Pesaro	3	
Ancona	3	
Roma	15,42	
Campobasso	1,5	
Pescara	2,0	
Napoli	12,7	
Bari	6,2	
Brindisi	1,7	
Foggia	2,43	
Taranto	2,3	
Potenza	2,0	
Catanzaro	2,5	
Reggio Calabria	3	
Catania	4	
Messina	2,5	
Palermo	5	
Cagliari	2	
Sassari	2	
Nuoro	2	

* Comitato per il coordinamento dell'edilizia
 ** Quota da definire.


RISULTATI DI UNA PROGRAMMAZIONE

IMPORTO DELLE COSTRUZIONI IN MILIARDI DI LIRE

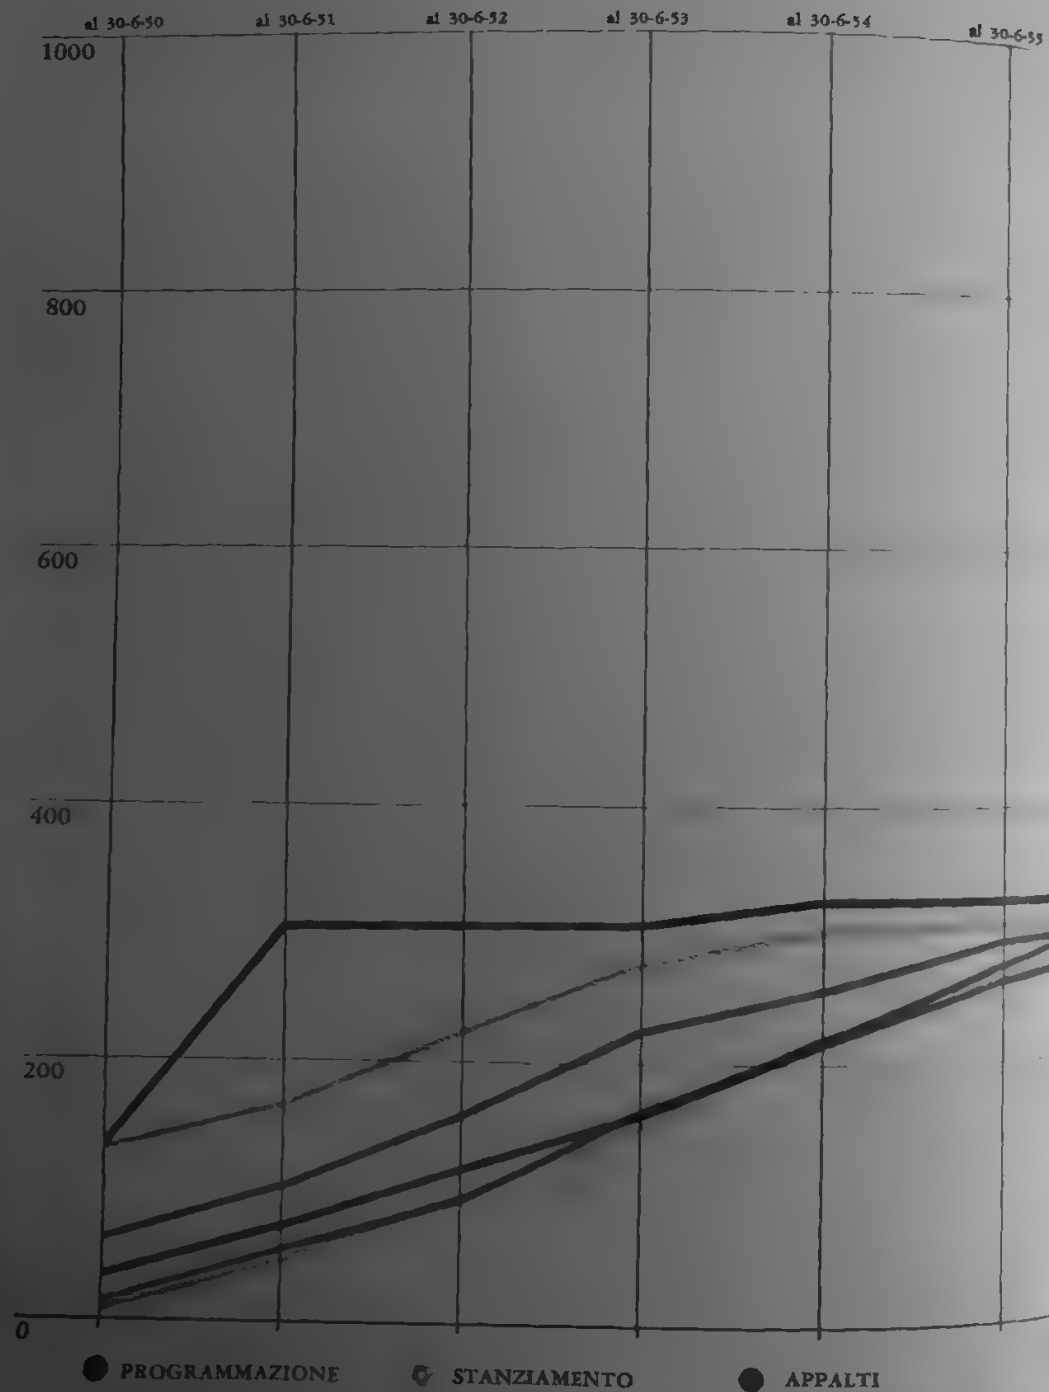

ATTICIPATA AL MASSIMO NELLE VARIE FASI

VEDI TAVOLA N. 10

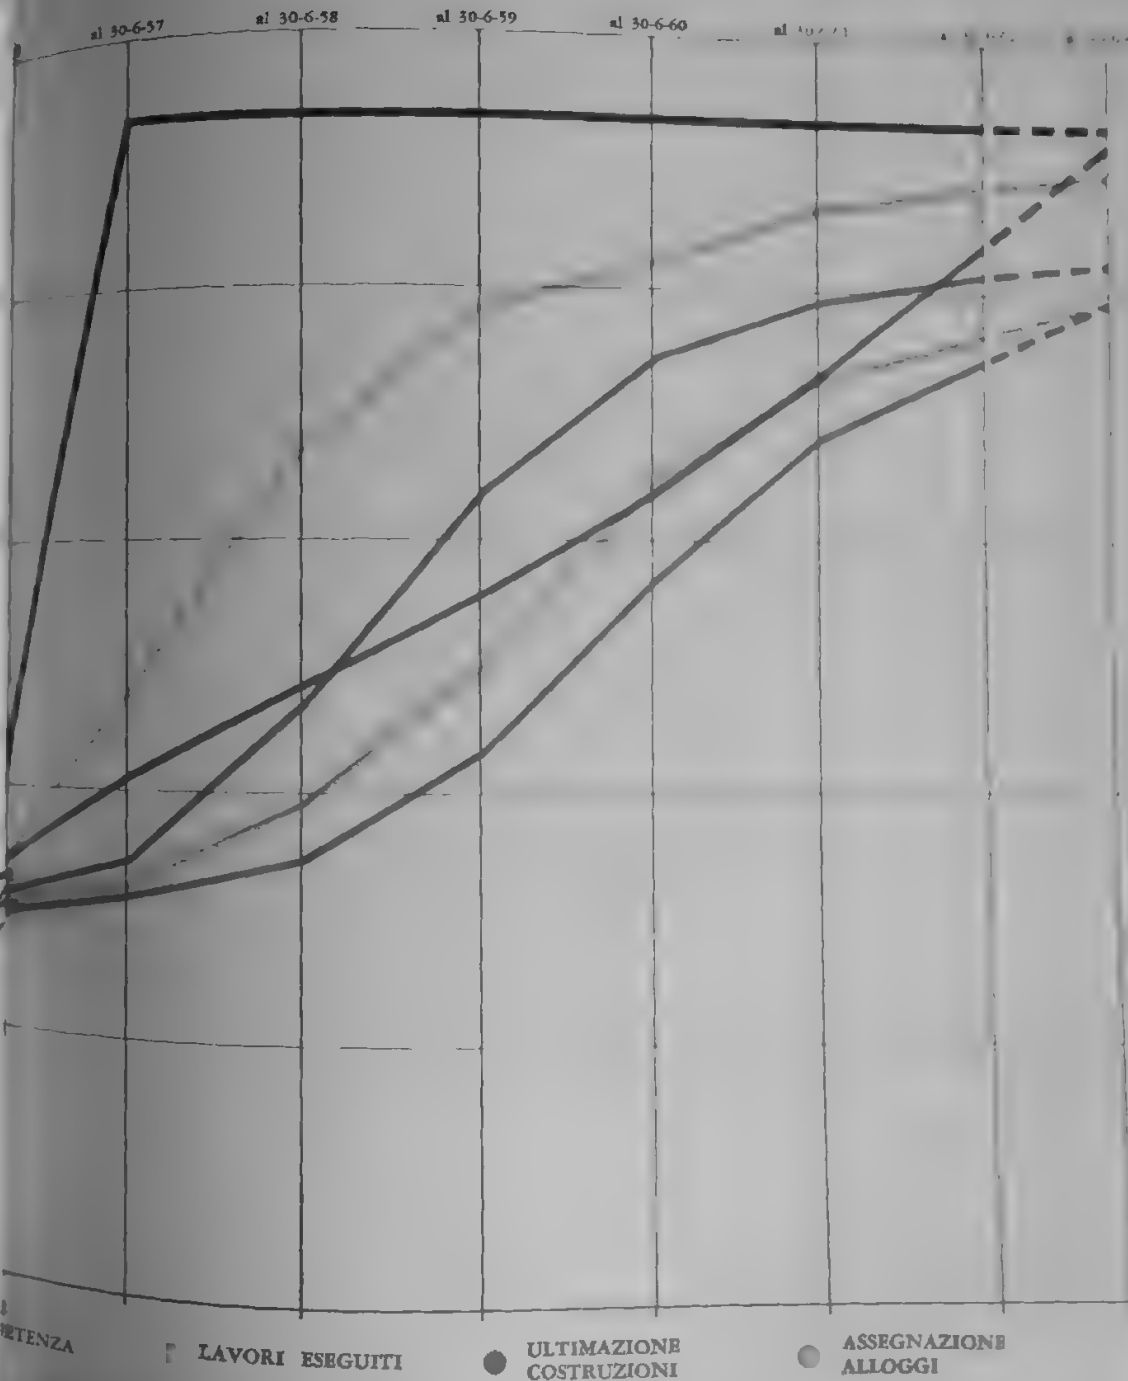

Tav. 18 — Alcune caratteristiche degli alloggi INACASA costruiti nel 2° Settennio
(da un'indagine effettuata su 90.022 alloggi)

REGIONI	RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEGLI ALLOGGI PER NUMERO VANI					NUMERO MEDIO DEI VANI PER AL- LOGGIO	SUPERFI- CIE MEDIA DEGLI ALLOGGI (mq)	SUPERFI- CIE MEDIA DEI VANI (mq)
	3,3	5	6	7	TOTALE			
Piemonte	4,4	58,9	31,8	4,9	100	5,35	86,35	15,71
Valle d'Aosta	1,4	57,	25,7	16,	100	5,55	91,20	15,06
Lombardia	9,2	62,4	23,4	5,	100	5,19	80,32	15,05
Trentino-Alto Adige	3,4	36,1	53,3	7,2	100	5,62	89,93	15,53
Veneto	2,1	44,8	40,7	12,4	100	5,62	93,89	16,41
Friuli-Venezia Giulia	0,9	44,4	47,7	7,-	100	5,60	89,21	15,33
Liguria	3,	50,7	35	9,3	100	5,46	87,90	15,77
Lazio-Romagna	3,4	63,2	24,7	8,7	100	5,36	87,25	16,01
Toscana	3,6	65,1	26,3	5,-	100	5,30	85,64	15,77
Umbria	4,8	59,6	23,7	11,9	100	5,40	86,63	15,43
Marche	3,2	62,5	26,8	7,5	100	5,37	87,03	15,73
Lazio	2,-	59,7	31,9	13,4	100	5,52	94,45	15,20
Abruzzi e Molise	6,2	55,3	30,8	7,7	100	5,36	87,90	15,73
Campania	3,1	43,2	36,6	17,1	100	5,66	92,27	15,77
Puglia	6,7	64,-	21,6	7,7	100	5,27	87,07	16,13
Basilicata	6,-	61,6	26,9	5,5	100	5,28	82,21	14,30
Calabria	1,5	63,8	22,8	11,9	100	5,44	86,78	15,82
Sicilia	0,3	47,6	22,7	29,4	100	5,81	95,92	15,13
Sardegna	1,9	43,6	33,8	20,7	100	5,72	94,94	16,12
Centro Nord	4,6	57,6	29,9	7,9	100	5,38	86,40	15,53
Sud Isole	3,9	52,4	29,4	14,3	100	5,52	90,63	15,79
ITALIA	4,4	56,2	29,7	9,7	100	5,42	87,54	15,59

Tav. 19 — Indice del costo di costruzione di una casa di civile abitazione
1938 = 100

ANNI	MANO D'OPERA
1938	100
1939	114
1940	138
1941	163
1942	167
1943	193
1944	337
1945	871
1946	2.053
1947	4.566
1948	5.750
1949	6.025
1950	6.358
1951	7.010
1952	7.536
1953	8.133
1954	8.477
1955	8.721
1956	9.210
1957	9.666
1958	10.928
1959	11.044
1960	11.911
1961	12
1962	14.896

Fonte: Centro per la Statistica Aziendale

Tav. 20 — Composizione percentuale del costo di costruzione di una casa di civile abitazione

VOCE DI COSTO	1949	1962
Aglomeranti, putrelle	12,7	8,9
Laterizi	7,4	7,-
Materiale rivestimento	7,3	5,3
Legnami, opere in legno	16,5	13,5
Metalli, opere in ferro	7,9	4,6
Vetri e cristalli	0,4	0,2
Materiale sanitario	5,3	3,-
Materiale riscaldamento	5,7	2,8
Materiale elettrico	0,9	0,9
Coloni e cerami	2,-	0,8
Materiali	66,1	48,-
Accessori	1,7	2,9
Mano d'opera	32,2	49,1
	100,-	100,-

Fonte: Centro per la Statistica Aziendale - Indes -
N.B. - L'edilizia si riferisce ad un progetto delle Ferrovie dello Stato di casa medio-popolare per ferrovieri, costruita in struttura prefabbricata. La casa è costituita da 6 appartamenti su tre piani; ogni appartamento è di tre vani più cucina, bagno e garage, con sala centrale in comune e impianti di termosifone 0+18°. Volume v.p.p. 1950 mc circa. Nel costo sono comprese le spese per l'acquisto dell'area, né le spese per le sistemazioni esterne (muri di cinta, giardino e rusini), né l'utile dell'impresa costruttrice.

Tav. 21 — Costi massimi a vano per le costruzioni dell'INACASA, nel marzo 1962

COMPONENTI DEL COSTO	TIPO			
A) Area attrezzata nei comuni con contingente settennale:				
meno di 100 milioni di lire ¹	40.000			
da 100 a 300 milioni di lire ¹	50.000			
da 300 milioni di lire in su ¹	60.000			
B) Costo base della costruzione ²	375.000	5		
C) Maggiorazioni per: ³				
cantina e ripostigli	20			
riscaldamento	40			
ubicazione in isola	15			
zona sismica di seconda categoria	15			
zona sismica di prima categoria	32			

¹ Aumentabili del 20 per cento.
² Ove si tratti di aree di Piano Regolatore oppure su
invece di lire 75.000, 85.000, 95.000 si riconoscono 100.000
lire 125.000).
³ Aumentabili del 5 per cento.

I diretti beneficiari del Piano

1. Sviluppo dei metodi per l'assegnazione degli alloggi

La fase dell'assegnazione degli alloggi rappresenta il coronamento di un piano di edilizia popolare, il punto d'arrivo dell'intera catena dei suoi sforzi.

Ma per gli assegnatari dell'INACASA (e attraverso essi, per l'opinione pubblica) era un momento ancor più importante: il metro in base al quale si poteva giudicare, alla resa dei conti, l'effettivo risultato di un esperimento che si proclamava sociale. Chi sarebbero stati, all'atto pratico, i beneficiari del Piano?

Veramente sarebbero entrati in quelle case coloro che ne avevano più bisogno, e quindi più diritto? Per ogni alloggio che attende di venire assegnato, la rosa degli aspiranti in attesa è vastissima, e molti son bisognosi, e ciascuno è convinto di avere titolo per entrarvi. Non solo, ma per ciascuno la promessa proprietà di quella casa rappresenta un bene nuovo, considerato finora irraggiungibile, e ancor più desiderato ora che è diventato possibile sperarlo. Con tanta più acuta attenzione ognuno degli aspiranti starà a vigilare se l'assegnazione sia attuata o meno con rigorosa equità, pronto a gridare al favoritismo, a denunciare il fallimento di questo ennesimo tentativo di giustizia sociale.

I metodi seguiti dall'INACASA per l'assegnazione degli alloggi, e in particolare i criteri per la formazione della graduatoria, costituiscono una delle caratteristiche più originali del Piano, e sono rimasti, dopo 14 anni, il simbolo migliore del Piano.

Spetta alla Legge e ai successivi regolamenti il merito di aver fissato quei criteri, destinati a divenire notissimi per la loro intransigente severità.

Criteri rigorosi

Agli Organi del Piano spettò il compito di assicurare l'esatto adempimento delle disposizioni della Legge, evitando però di compromettere il ritmo con cui le nuove famiglie dei destinatari potevano entrare nelle case costruite per loro. L'esperienza raccolta

questa complessa e delicata materia consentì inoltre al Comitato e alla Gestione di contribuire, in tempi successivi, alla revisione e al perfezionamento delle norme.

È questo uno dei campi in cui il decentramento, che era la caratteristica spiccata del Piano, fu attuato in modo più radicale e sistematico. L'INACASA, nonostante la sua fisionomia di Organo centrale, al quale in definitiva il pubblico attribuiva la totale responsabilità in ogni settore dell'attività del Piano — e quindi, in particolare, nel capitolo delicatissimo delle assegnazioni — lasciò fin dall'inizio alle Commissioni provinciali appositamente costituite l'esclusiva cura e responsabilità della formazione delle graduatorie, procurando soltanto di ottenere un regolare ritmo di lavoro dalle varie Commissioni e relative segreterie. Gli stessi ricorsi degli aspiranti beneficiari contro le graduatorie provvisorie erano presentati alle Commissioni provinciali. Se però il cittadino non era soddisfatto dell'esito del suo ricorso, gli era offerta ancora la possibilità di adire il Consiglio di Stato. A partire dal Secondo Settennio la Gestione INACASA, ricevute dalle Commissioni provinciali le graduatorie definitive dopo le decisioni sui ricorsi, fu autorizzata dalla Legge a sospenderle per sentire il parere di una Commissione consultiva centrale, di cui si dirà più oltre.

Gli Organi del Piano si assunsero anche il compito di difendere l'opera delle Commissioni di assegnazione di fronte alle campagne di stampa originate dalle proteste di coloro che fin dai primi anni di vita del Piano miravano a un addolcimento delle norme di assegnazione. Essi evitarono comunque di interferire in qualsiasi modo nei criteri seguiti dalle Commissioni durante l'esame dei casi in contestazione.

Rimane da esaminare l'attività normativa svolta a più riprese dal Comitato in questa materia. Esso giunse a disciplinare con minuzia l'intero meccanismo dell'assegnazione, per la sua delicatezza tanto esposto a contestazioni, non solo per ciò che riguarda la scelta degli assegnatari, ma per una quantità di altre questioni che via via insorgevano nell'attività concreta, dall'assegnazione di alloggi più o meno ampi alla scelta fra alloggi di uguali dimensioni e diversamente situati, fino alla possibilità che fu concessa all'assegnatario d'un

alloggio divenuto troppo esiguo per i crescenti bisogni della sua famiglia, di ottenere con un nuovo bando un alloggio più ampio.

Nel complesso queste norme aumentarono ulteriormente la precisione dell'attività svolta dall'INACASA nell'assegnazione degli alloggi. Non si volle lasciare in mano del tutto all'improvvisazione e all'arbitrio. Questa complessa attività fu disciplinata in un regolamento di genere, rigorosa e quasi matematica nella sua formulazione, che fu per tutti ben nota e conosciuta da vicino; ne riportiamo perciò un'ampia esposizione nel capitolo che costituisce il presente volume (pag. 423). Si tenga presente che con questa rigorosa disciplina furono stati assegnati, al 31 dicembre 1962, ben 300 mila alloggi ad altrettanti cittadini.

Revisione dei criteri

E tuttavia la Gestione, alla luce delle sue esperienze, considerò necessario rendersi interprete presso il Comitato e gli Organi dello Stato, del fatto innegabile che il rigido criterio di graduatoria previsto dal primo Regolamento (e soprattutto l'assoluta precedenza della prima classe rispetto al punteggio nell'interno delle classi) veniva in pratica a escludere la grande maggioranza dei contribuenti da una concreta speranza di futura assegnazione. Si può constatare che nei grandi Centri quasi esclusivamente i lavoratori della prima classe, cioè quelli sprovvisti di alloggio, che abitassero in baracche o in ricoveri (e che erano per la maggior parte recenti immigrati) potevano sperare di ottenere un alloggio entro un numero ragionevole di anni. Nei Centri medi, tale possibilità si restringeva ai lavoratori appartenenti alla seconda classe, quelli cioè viventi in coabitazione ovvero in condizioni di superaffollamento.

Il secondo Regolamento, dell'ottobre 1957, predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in base ai risultati delle esperienze compiute dalla Gestione nel Pi-

Settennio, si propone per l'appunto di rimediare alle difficoltà segnalate, togliendo la precedenza assoluta delle classi sul punteggio. Il nuovo Regolamento riduce fra l'altro da sette a cinque il numero delle classi, accorda speciale considerazione al caso di stratto ed a quello di scissione del nucleo familiare per ragioni di lavoro, e semplifica notevolmente il complesso sistema di attribuzione del punteggio.

Tuttavia, anche se la procedura risulta più snella, l'inconveniente del ritardo nella formazione delle graduatorie non fu sempre eliminato. Era necessario in ogni caso, alle Commissioni provinciali, una volta esaurito il lavoro di spoglio delle domande e di computo del punteggio, una volta assegnati gli alloggi, attendere il termine di presentazione dei ricorsi, esaminarli, decidere in merito, prima di dare il via alle graduatorie definitive e finalmente all'assegnazione.

Per guadagnare tempo, si stabilì che i bandi venissero pubblicati entro il 60° giorno dall'inizio dei lavori di costruzione, e si pose in atto l'invio sistematico di sollecitazioni agli Uffici del Lavoro per la formazione delle graduatorie in rispondenza all'avanzamento dei lavori di costruzione.

Gli Organi centrali del Piano, impegnati quotidianamente da una quantità di problemi diversi, difficilmente avrebbero potuto mantenere quella visione distaccata e quello spirito di autocritica necessari per rivedere di volta in volta, o proporre la revisione delle norme, sulla base della realtà e dell'interesse generale. Ciò che si poté raggiungere fu in buona parte dovuto allo stretto contatto mantenuto con gli Organi periferici, antenne sensibili di fronte alla esperienza quotidiana. Furono questi rapporti continui con la realtà concreta a consentire agli Organi centrali un metodo di lavoro che andò al di là della « routine » puramente amministrativa.

Una importante occasione si manifestò nel momento in cui fu preparata e discussa la Legge che prorogava il Piano stesso. In tale circostanza furono gli Organi stessi dell'INACASA a sottoporre al legislatore i risultati delle esperienze di un Settennio, e si può affermare

che alcune innovazioni importanti introdotte dalla Legge nacquero proprio dalle loro indicazioni.

Si può ricordare, in tema di assegnazione alloggi, la proposta accolta nel terzo Regolamento, in base alla quale i criteri di preferenza compresero, oltre che il bisogno di alloggio e l'entità del nucleo familiare, anche l'anzianità di lavoro nella zona delle costruzioni. In alternativa si escluse, dai requisiti per l'ammissione ai concorsi, quello dell'attività di lavoro nella zona. Altra innovazione caratteristica fu il riconoscimento agli eredi del concorrente deceduto, del diritto di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio anche se non fossero in possesso dei requisiti di Legge.

L'istituzione della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi INACASA, decisa dalla Legge di proroga del Piano, costituì un ulteriore perfezionamento del sistema di assegnazione. Il suo parere era vincolante, ed in conformità ad esso la Gestione INACASA provvedeva all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria, ovvero alla sua convalida.

Compito della Commissione era anche quello di esprimere pareri in materia di assegnazione alloggi su quesiti posti dal Comitato di Attuazione, dalla Gestione INACASA e dalle Commissioni provinciali. L'attività della Commissione centrale valse a stabilire precisi orientamenti nel lavoro delle Commissioni provinciali e ad assicurare uniformità di indirizzo nelle decisioni delle Commissioni stesse. L'INACASA poté così diminuire o eliminare i ritardi provocati dalle incertezze di interpretazione delle disposizioni.

Nuovi sviluppi: il piano Aggiuntivo

Ma l'innovazione più caratteristica, introdotta nei criteri di assegnazione, è rappresentata dal « piano Aggiuntivo », istituito all'inizio del Secondo Settennio.

Va sottolineato che l'art. 8 della Legge del novembre 1955 rispecchia una delle principali

110

111

In questo senso il piano Aggiuntivo, varato con la Legge del Secondo Settenni-
volume di costruzioni fino al 20 per cento del totale, costituisce, insieme con i reiterati
aggiornamenti dei criteri di assegnazione, e con i programmi di costruzioni aziendali
capitolo importante nello sviluppo dei criteri di assegnazione degli alloggi INACASA.
Potrà quindi interessare l'esposizione sistematica del funzionamento del piano A
dei suoi particolari criteri d'assegnazione (sostegno per le Cooperative, graduatoria per
costruzioni di Aziende) riportata nell'ultima parte della presente pubblicazione.

2. Un nuovo tipo di amministrazione degli alloggi

Anche in questo campo - come si può constatare con tutta chiarezza - l'INACASA ha potuto seguire i principi generali che hanno consentito di impostare con successo il difficile problema dell'amministrazione di un così vasto numero di alloggi.

La Legge istitutiva prevedeva che una metà degli alloggi costruiti dall'INACASA fosse assegnata in locazione ed una metà a risatto. Essa prevedeva poi che l'amministrazione degli alloggi in locazione fosse assegnata a dipendenti da Pubbliche Amministrazioni (cioè affidata all'INCLIS) e quella degli alloggi assegnati ai dipendenti da altri datori di lavoro dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di ciascuna provincia.

Per gli alloggi assegnati con promessa di vendita, si prevedeva invece che l'INACASA conservasse l'amministrazione fino all'esaurimento delle quote di riscatto; a tal fine l'Ente doveva predisporre un Regolamento-type e gli assegnatari di ogni casa dovevano nominare un proprio rappresentante, responsabile, di fronte alla Gestione, dell'ottemperanza al Regolamento.

Nell'adottare tali disposizioni, gli Organi del Piano adottarono una serie di modalità operative che tendevano a orientare verso l'autoamministrazione delle case a risatto, non trascurando, tuttavia, di prevedere opportune cautele e controlli, così da utilizzare in piena libertà ed efficacia le esperienze maturate dalla lunga esperienza raccolta, in questa materia, dai vari Enti dell'edilizia popolare.

L'amministrazione degli stabili popolari

Il problema dell'amministrazione degli alloggi costruiti dall'edilizia sovvenzionata è veramente assai complesso.

Dal 1935 è certo che anche sugli Enti pubblici la responsabilità di conservare i grandi patrimoni che si vengono via via costituendo, specie con l'assegnazione di alloggi in locazione, viene assunta e assunta anche nel caso di cessione con promessa di vendita, fino al momento dell'acquisto in proprietà. Questi patrimoni immobiliari sono costati grandi somme

alla collettività, che punta sul loro reintegro attraverso una attenta amministrazione. Occorre quindi organizzare l'esazione delle rate, combattere la morosità, ecc. Inoltre occorre compiere una vasta serie di opere di manutenzione ordinaria che investono tutte le parti dell'abitazione, evitando che una negligenza in questi normali interventi porti in seguito alla necessità di massicce opere di manutenzione straordinaria.

Per lo svolgimento di tutte queste attività nessuno è più indicato degli stessi Enti specializzati che hanno provveduto alla costruzione delle case, e che dispongono pertanto di uffici attrezzati anche per l'amministrazione e la manutenzione degli immobili. Questa però è solo una faccia della medaglia. Dall'altra parte occorre tener presente che le spese per questi uffici, anche se contenute da una rigorosa amministrazione e rivolte su un numero crescente di alloggi, vengono comunque ad incidere sensibilmente sui bilanci degli assegnatari; inoltre è molto difficile che questi ultimi riconoscano all'Ente amministratore una sufficiente solerzia nell'accogliere le loro richieste per interventi di manutenzione ordinaria. Più questi interventi si moltiplicano, più crescono le spese; più si dilata, più cresce il malcontento degli assegnatari.

Occorrerebbe evidentemente che l'assegnatario, con senso di responsabilità, limitasse le sue richieste all'indispensabile, provvedendo per suo conto alle riparazioni causate da cattivo uso. Occorrerebbe soprattutto che le famiglie assegnatarie riducessero le cause degli interventi di manutenzione ordinaria, facendo buon uso della casa e delle sue attrezzature, come di cosa propria.

È difficile però che famiglie sottoposte all'amministrazione anonima di un Ente si sentano responsabilizzate e compartecipi, chiamate cioè a collaborare alla buona amministrazione e manutenzione.

Nel caso di categorie socialmente meno elevate è, sotto certi aspetti, ancor più necessario l'intervento di un Ente amministratore che porti la disciplina ed effettui tutti i controlli richiesti; ma d'altra parte in questo caso è ancor più difficile che le famiglie assegnatarie



si rendano conto della necessità di collaborare con l'Ente al quale fanno risalire la causa dell'alto livello dei canoni, per loro particolarmente gravosi.

Effettivamente, solo il trasferimento in proprietà agli assegnatari, con rimborso immediato o rateale del costo, può costituire una soluzione adeguata, che tolga all'Ente le responsabilità amministrative e crei negli assegnatari un pieno ed esclusivo interesse alla buona amministrazione e conservazione degli stabili.

L'amministrazione autonoma dell'INACASA

Per gli alloggi a riscatto si dovevano attendere 25 anni prima del passaggio definitivo in proprietà. Tuttavia gli Organi del Piano fecero leva sulle disposizioni di legge che per questi alloggi prevedevano, come si è detto, la istituzione di un Regolamento tipo e la nomina di un responsabile da parte degli assegnatari di ogni casa, per arrivare alla definizione di un modello di « amministrazione autonoma ». In base ad esso, gli assegnatari non avevano, di fronte all'INACASA altro onere che quello dell'ammortamento delle quote di riscatto, mentre le quote di manutenzione ordinaria e straordinaria venivano raccolte e impiegate dagli assegnatari medesimi, attraverso i rappresentanti da essi stessi nominati.

In sostanza l'INACASA considerò gli assegnatari a riscatto come dei « condòmini ante-litteram » non dimenticando però di introdurre, come si è detto, nel Regolamento e nella concreta prassi una serie di correttivi per evitare che le amministrazioni autonome, abbandonate a se stesse, non fossero in grado di funzionare, e si arrivasse quindi a inconvenienti ancora maggiori di quelli che si volevano evitare, e che abbiamo descritto parlando delle amministrazioni affidate ad appositi uffici responsabili. In questo ordine di idee, furono affidate opportune funzioni di assistenza e di controllo sulle amministrazioni autonome agli Enti amministratori degli alloggi in locazione, competenti per territorio.

Il Regolamento prevedeva inoltre la nomina da parte dell'INACASA di un incaricato per ogni regione, con il compito di presiedere l'assemblea istitutiva dell'amministrazione di ogni singolo condominio. L'incaricato rimaneva a disposizione degli assegnatari per risolvere qualsiasi eventuale difficoltà e disporre, se del caso, le opere di manutenzione straordinaria.

Nel caso che l'amministrazione autonoma non fosse in grado di funzionare, era previsto il passaggio obbligatorio all'amministrazione controllata da un Ente, la quale era chiamata, con riferimento alle modalità di pagamento dei compensi per amministrazione ordinaria e straordinaria, « amministrazione tortettaria ». Il sistema dell'amministrazione autonoma ebbe però grande successo: al 31 dicembre 1962, su 189 mila alloggi assegnati a riscatto il 98 per cento, e cioè 185 mila, avevano una normale amministrazione autonoma e solo il 2 per cento erano retti da amministrazione « tortettaria » (vedi pag. 157). La peculiarità del sistema di amministrazione autonoma dell'INACASA ci induce a ritenere che possano interessare al lettore i più ampi ragguagli riportati nell'ultima parte del presente volume (pag. 429).

Non si può spiegare il successo avuto dalle amministrazioni autonome dell'INACASA se non si tiene presente l'opera svolta dall'Ente per affrontare, nel suo complesso, il problema della convivenza delle famiglie nei nuovi centri realizzati dal Piano. Su questo argomento ci intratterremo nel prossimo capitolo, dedicato ad illustrare i problemi del nuovo Servizio Sociale. È evidente che l'opera delle Assistenti Sociali e degli Incaricati Regionali, sorretta dalla collaborazione degli Enti specializzati, ha molto contribuito a rendere possibile un tipo di amministrazione che senza dubbio costituisce un interessante progresso.

L'assegnazione degli alloggi a riscatto anziché in locazione, comportava un canone di ammortamento più forte: per un alloggio del costo di 2,5 milioni di lire, il canone mensile di ammortamento da corrispondere per 25 anni, nel caso del riscatto ammontava a lire 3.445 (tav. 22); per un alloggio in locazione, le aliquote di ammortamento, sempre escluse le spese di amministrazione e manutenzione, non superavano, anche nei cittadini centri dove si avevano le aliquote maggiori, le lire 3.125 mensili.

Comunque, da parte dei lavoratori destinatari del Piano si mostrò un prevalente interesse per l'assegnazione dell'alloggio a riscatto anziché in locazione, e gli Organi del Piano accolsero nella misura più larga questa tendenza, sancita poi dalla Legge di proroga del Piano che portò la percentuale da assegnare a riscatto ai due terzi.

In pratica, nel Primo Settennio fu assegnato a riscatto il 62 per cento delle abitazioni; nel Secondo Settennio il 76 per cento, con una media generale del 69 per cento (pag. 155).

Per le costruzioni del piano Aggiuntivo, il periodo di riscatto era previsto dalla Legge in 10 o 15 anni. Tuttavia, aderendo alla richiesta degli assegnatari e sempre per alleviare al massimo possibile gli oneri di ammortamento, si decise di estendere in ogni caso il periodo di ammortamento al limite superiore, di 15 anni.

Per gli alloggi in locazione, gli Organi del Piano stabilirono apposite Convenzioni con gli Enti incaricati dell'amministrazione, in modo da ridurre al minimo le quote per amministrazione e manutenzione degli alloggi. L'aliquota di fitto prevista dalla Legge per gli alloggi in locazione era quanto mai modesta, appunto in considerazione del fatto che fra i beneficiari dell'INACASA avrebbero scelto il sistema dell'affitto coloro che si trovavano in condizioni economiche più ristrette. Il valore annuo del canone, pertanto, non doveva, secondo la Legge, superare l'1,50 per cento del costo dell'alloggio. Ma nell'applicare queste disposizioni, gli Organi del Piano fecero ancora un passo avanti, introducendo (come si è già avuto occasione di ricordare) nelle zone più disagiate una scala di quote inferiori, che poteva scendere fino al canone, quasi irrisorio per verità, dello 0,50 per cento annuo sul costo dell'alloggio.

Una agevolazione importante venne introdotta nel caso dei complessi edilizi gravati da costi particolari, sia per la natura del terreno, sia per speciali sistemazioni esterne, sia infine per la necessità sopraggiunta di prendere a carico dell'INACASA l'onere relativo alla realizzazione di servizi collettivi particolarmente gravosi. In tutti questi casi si stabilì di caricare i maggiori oneri su un apposito fondo di compensazione, in modo da evitare un aggravio diretto sugli assegnatari del complesso.

3. I problemi delle nuove comunità e il Servizio Sociale

Quando una famiglia aveva finalmente ottenuto l'alloggio dell'INACASA, uscendo dopo tanta attesa da una condizione di grave disagio, avrebbe dovuto — così sembra — assaporare la soddisfazione di chi ha risolto uno dei problemi fondamentali dell'esistenza. Invece a questo punto incominciava un'altra serie di difficoltà: l'insediamento nel nuovo quartiere aveva per risultato, in brevissimo tempo, scontenti che potevano sembrare imprevedibili in chi magari abitava, fino al giorno prima, una baracca. È il fenomeno ben noto dell'exilar: il gusto elevarsi dei bisogni, a mano a mano che quelli primari vengono soddisfatti; un'evoluzione accompagnata dalla scoperta e dalla crescente consapevolezza dei propri diritti in seno alla società. Andare a prender l'acqua alla fontana era cosa normale per dei baraccati, ma diventava un'eccezione per assegnatari di alloggi nuovi e civili.

Alla base di tutto vi erano senza dubbio problemi concreti, basterebbe, ad esempio, ricordare come l'INACASA fosse stata costretta a realizzare ampi complessi edilizi in zone periferiche delle città, talora ai loro estremi margini, o addirittura a notevole distanza da questi. Ora i nuovi complessi dovevano essere qualificati come « periferici » anche sotto il punto psicologico, sia per la loro lontananza, che rappresentava un sostanziale distacco dalla città, sia per la carenza iniziale di quelle attrezzature che sono consuete nei quartieri inseriti nel nucleo urbano, e che tanta importanza hanno per la vita delle famiglie.

A queste difficoltà già note se ne aggiungevano molte altre, particolarmente acute durante la fase di insediamento e di prima acclimatazione delle famiglie nei nuovi complessi. Quando un numero notevole di persone, a seguito dell'assegnazione, vengono ad abitare contemporaneamente in un nuovo quartiere residenziale, si richiede loro un particolare sforzo per adattarsi ad un diverso ambiente, per abituarsi all'uso di una abitazione o un ambiente di quella a cui erano avvezzi, per stabilire rapporti di vicinato, per imparare il nuovo sistema di pagare le nuove tipi di spese, per assumere le responsabilità derivanti dall'amministrazione del proprio alloggio e in qualche caso dell'edificio. I nuovi

abitanti devono anche, a poco a poco, scoprire il valore dei nuovi rapporti che vengono allacciando con le altre famiglie; imparare a sentirsi impegnati nella partecipazione alle attività di gruppo per soddisfare gli interessi comuni; maturare in concomitanza con lo sviluppo dell'ambiente una nuova coscienza, non solo dei propri diritti ma dei doveri ad essi inerenti; rendere insomma possibile la progressiva formazione di quei vincoli di comunanza, d'interessi e di solidarietà che varranno a trasformare gradualmente il gruppo in una collettività omogenea e organica.

Il Piano ritenne di non poter abbandonare a se stessi i suoi beneficiari in questo momento conclusivo, che era forse il più delicato, e in cui si apriva una pagina nuova della loro vita. Dopo aver dato loro una casa, era necessario aiutarli, almeno nei primi passi, a costituirsi in comunità.

Alcuni dei nuovi problemi erano di natura materiale, ma altri, forse i più numerosi, e certamente i più complessi, no. Essi richiedevano uno speciale impegno delle persone e dei gruppi direttamente interessati, e tutta una serie di interventi e stimoli dall'esterno, volti a favorire una sostanziale evoluzione nelle abitudini, nell'atteggiamento dei singoli verso la comunità e quindi un migliore inserimento di ciascuno nella nuova realtà. Qui sta il significato della decisione presa dagli Organi del Piano fin dal 1952, di istituire nei nuovi quartieri un Servizio Sociale, destinato ben presto a svilupparsi in un Ente autonomo specializzato (Tav. 26). In un certo senso, questa è l'ultima forma di intervento del Piano, intervento che va forse al di là della lettera, ma rimane certamente nello spirito della Legge istitutiva, e intende svolgersi anch'esso nel rispetto della personalità degli assegnatari, aiutando senza imporsi, stimolando le iniziative individuali senza irreggimentarle.

In questo campo, l'azione del Piano si prolunga necessariamente oltre i 14 anni della sua attività, è ancora aperta, e quindi il lettore ci comprenderà se parleremo di essa come di cosa attuale, usando il presente.

Nell'apposito capitolo a pag. 451 di questa pubblicazione, si potranno trovare molte informazioni sull'organizzazione del Servizio Sociale, sui compiti ad esso assegnati, sulla natura dei suoi interventi, sui risultati ottenuti. Qui dovremmo piuttosto tentare una sintesi dei problemi affrontati e dell'impostazione tecnica data a questo tipo relativamente nuovo di Servizio Sociale a indirizzo familiare.

Riteniamo però che in luogo di una esposizione astratta di principi e metodi (possa riuscire più interessante per il lettore - e più conforme al carattere di questa pubblicazione) individuare e seguire direttamente, attraverso quanto risulta dalle relazioni delle Assistenti Sociali, le varie fasi e i vari problemi affrontati dalle famiglie dal momento dell'assegnazione dell'alloggio in poi. Contidiamo che per questa via si possa meglio seguire, come in un film, la storia dei quartieri in formazione, vista attraverso l'occhio e descritta con lo stesso linguaggio tecnico e preciso, ma nello stesso tempo acuto e sensibile) dell'Assistente Sociale. Nella loro sommarietà, le pagine che seguono potranno forse interessare il lettore come una inchiesta sociale, quasi un documentario girato, fase per fase, sul vivo, nell'ambiente composito dei complessi INACASA.

L'ingresso nelle nuove case

Un fattore psicologico di eccezionale incidenza è l'attesa dell'alloggio; questa attesa è ancora generica, e relativamente poco « ansiosa », nelle famiglie che hanno inoltrato domanda di assegnazione ma ancora non ne conoscono l'esito. Diventa invece quasi spasmodica, quando le famiglie apprendono di essere entrate nella graduatoria degli assegnatari.

Da quel momento, infatti, cambia radicalmente l'atteggiamento psicologico dei prescelti: se prima essi sentivano genericamente di poter avere un loro diritto alla casa, ora affermano il diritto di avere il nuovo alloggio presto, e adeguato ai propri bisogni, e ben fatto; ma soprattutto presto. Sono noti alla cronaca certi episodi di occupazione violenta d'alloggi

ormai completati, ma che non si potevano ancora consegnare perché mancavano dei servizi essenziali, come l'acqua o la luce. Eppure l'esperienza ha portato l'INACASA a non consentire l'ingresso nelle nuove case se non quando questi servizi erano già funzionanti, o per lo meno d'imminente e certo inizio, perché è stato provato che il malcontento dei primi giorni influisce negativamente sulla vita di quartiere più ancora, forse, che la prolungata attesa.

Le Assistenti Sociali segnalano anche l'importanza, per la formazione più o meno rapida di un'armonica vita di quartiere, della « stagione » in cui gli alloggi vengono consegnati. Il trasferimento delle famiglie in zone quasi sempre distanti dal quartiere in cui abitavano in precedenza porta con sé la necessità di mutare, da un giorno all'altro, tutte o quasi le abitudini più radicate, i negozi in cui si andava a far la spesa quotidiana, i vicini con cui s'erano stretti rapporti di amicizia. Molto spesso aumenta la distanza dai luoghi di lavoro e quindi il tempo e la spesa per raggiungerli. Fra i problemi di questo genere, uno dei più seri è quello del cambio della scuola per i figli, che quasi inevitabilmente porta loro disorientamento e difficoltà. Trasferirsi ad anno inoltrato può aver conseguenze gravi sull'esito degli studi; far coincidere, per contro, la consegna degli alloggi con l'inizio dell'anno scolastico è di per sé un elemento favorevole per l'inizio sereno della nuova vita. E in realtà gran parte delle assegnazioni d'alloggi INACASA avvennero, dove possibile, nei mesi estivi o nel primo autunno, quando il cambio di scuola è più facile e meno dannoso.

Nel periodo che precede immediatamente la consegna degli alloggi, gli Uffici del Lavoro sono meta di ripetute visite da parte degli assegnatari, ansiosi di individuare, fra i tanti, l'alloggio destinato a loro, di informarsi sulla data in cui effettivamente potranno entrarvi, sui diritti e doveri che loro competeranno. Già in questo delicato momento entra in azione il Servizio Sociale. L'Assistente inizia i contatti con i nuovi assegnatari, fornisce notizie sulla situazione obiettiva che incontreranno, dà consigli, rappresenta già un punto di riferimento e di appoggio.

Come si è visto, la situazione psicologica all'atto dell'insediamento è molto delicata: si inclina con grande facilità verso il pessimismo e le proteste contro tutto ciò che non è ancora sistemato o di pronto uso.

Il compito dell'Assistente Sociale, a questo punto, non è di difendere quasi d'ufficio questa o quella soluzione, ma invece di chiarire agli assegnatari le forme più corrette, e in definitiva più utili, per presentare le loro istanze, per illustrare le richieste. È questo il momento in cui fra gli assegnatari, sia pur sulla base di rivendicazioni disordinate, avvengono i primi incontri, i primi scambi di pareri, si intrecciano in sostanza i primi fili di quella solidarietà che potrà proiettarsi in seguito nella formazione di una nuova vita sociale.

I «traumi» del primo mese

Si può affermare che le esperienze più traumatiche che una famiglia debba affrontare dopo l'ingresso nella nuova casa avvengono nel primo mese. Le cose cambiano molto, naturalmente, a seconda dell'abitazione che in precedenza essa occupava, e quindi della differenza fra le antiche condizioni di vita e le nuove, con le responsabilità e gli impegni che ne derivano. L'insediamento sarà più o meno difficile, a seconda che rappresenti o meno una novità vivere in un alloggio decoroso, avere dei vicini, assumere la responsabilità dell'amministrazione, e così via. Anche i rapporti tra le famiglie variano a seconda del loro grado di educazione e di maturità. Tuttavia, già in questa fase, la stessa eterogeneità può diventare una risorsa, se per esempio quelli che hanno una certa pratica d'amministrazione mettono la loro esperienza al servizio degli altri e se, beninteso, gli altri non subiscono tale apporto passivamente, o peggio con diffidenza e sospetto.

È evidente l'importanza del Servizio Sociale, in questo delicatissimo periodo di accostamento fra persone a diverso livello sociale e culturale.

Per coloro che prima della consegna non abitavano in veri e propri appartamenti, imparare a vivere in una abitazione civile, mantenendola pulita, convivere con i vicini non più in una deprimente promiscuità all'aperto, ma finalmente una sfera esclusiva di intimità familiare; di accettare d'essere sottoposti a confronti (sul livello economico, sulla pulizia dei bambini, sulla manutenzione del mobilio, ecc.) con le altre famiglie del fabbricato e del quartiere.

Ma molte novità devono affrontare anche le famiglie che già abitavano in propri appartamenti: prima fra tutte, l'avere come padrone di casa un Ente pubblico, una bene individuata persona fisica. Per molti cittadini non c'è mai stata una così concreta e immediata esigenza di iniziare rapporti con un «Ente» pubblico, mai di dover comprendere a fondo gli articoli di una legge e le loro implicazioni dirette e indirette.

Per un paradosso solo apparente, gli assegnatari, anziché mostrarsi inerti, con certe competenze agli Enti, manifestano una spiccata tendenza a scaricare le responsabilità sul pubblico intervento: uno dei motivi di difficoltà nella gestione dell'INACASA consiste nel fatto che molti assegnatari credono spetti agli Enti, e perfino alla INACASA, perfino la manutenzione ordinaria dell'alloggio, le piccole riparazioni, dalla semplice usura, mentre sono restii ad accettare le responsabilità, e soprattutto quelle condominiali.

Allo scadere del primo mese, le Assistenti Sociali hanno potuto notare con qualche disappunto «di avventura» (o meglio inesperienza e mancanza di preparazione) che, sebbene avessero già acquisito il titolo di assegnatarie di alloggio, senza considerare che sarebbero derivate sul bilancio familiare: talora non si tratta di una mancanza di reddito, ma di una errata distribuzione delle spese, in base a cui non si levano la voce «abitazione» tra gli ultimi posti.

A questo proposito è stata rilevata una sensibile differenza tra gli assegnatari a locazione, tra i quali più frequenti sono i fenomeni di morosità, e quelli a riscatto. Questi per lo più hanno una maggiore coscienza del problema dell'abitazione (per il fatto stesso di voler diventare proprietari dell'alloggio), conoscono meglio la Legge ed hanno inserito con maggior chiarezza nei preventivi familiari i vantaggi e i sacrifici conseguenti alla assegnazione.

L'attività amministrativa di casggiato dà modo al Servizio Sociale di tradurre in atto uno dei suoi principi fondamentali, quello della « non sostituzione ». Sarebbe certo assai più agevole per l'Assistente Sociale di un piccolo complesso sostituire gli assegnatari nei loro compiti amministrativi. Molto più difficile, ma estremamente più importante, è insegnar loro ad assumerli in proprio. Questo sforzo per stimolare le responsabilità non è restato senza frutto, come documentano le poche cifre seguenti: in 299 Centri Sociali risultano oggi operanti 720 Comitati di assegnatari. Il dato è ancor più significativo se si aggiunge che la maggior parte di tali Comitati si trova nel Sud e nelle Isole.

In molti casi i Centri Sociali sono stati i luoghi in cui gli assegnatari hanno potuto incontrarsi e unparare a discutere i problemi comuni dell'amministrazione. Questa è stata la prima di molte esperienze d'incontro fra gruppi di interesse.

L'eterogeneità: vantaggi e svantaggi

Secondo un diffuso pregiudizio, la omogeneità di provenienza, di costume, di occupazione tra le famiglie dovrebbe costituire un fattore di per sé positivo per la vita in comune. Molte volte però non è così: la eterogeneità pone senza dubbio difficoltà iniziali più gravi, ma dà in seguito frutti migliori, perché stimola e arricchisce i rapporti tra gente diversa.

È quel che avviene di solito nei complessi INACASA, dove i rigidi criteri di assegnazione, basati unicamente sul grado del bisogno d'alloggio, non potevano non favorire sistematicamente la eterogeneità, la mescolanza di persone e di famiglie diversissime tra loro (Tav. 23).

Sussistono indubbiamente diversità di vario ordine tra le famiglie di impiegati e quelle di operai; la loro incidenza varia tuttavia sensibilmente da regione a regione e a seconda dei particolari criteri adottati per la sistemazione delle famiglie nei vari edifici. Per esempio le Assistenti Sociali hanno rilevato che generalmente le abitazioni a composizione omogenea finiscono per trovarsi più facilmente isolate in seno al quartiere, mentre la mescolanza di impiegati ed operai negli stessi fabbricati contribuisce, pur tra inevitabili frizioni, al progressivo superamento dei cosiddetti pregiudizi di categoria.

Notevole è apparso il distacco tra le famiglie che godono di un reddito di lavoro regolare e quelle che versano in condizioni di disagio per le precarie condizioni di impiego.

Gli aspetti esteriori del « distacco » (soprattutto il modo di tenere l'alloggio e di curare i bambini) provocano, specialmente tra le donne, malumori, pregiudizi, tendenza a rinchiusersi e ad isolare le famiglie più indigenti. Il fenomeno è grave, perché impedisce lo sviluppo dei rapporti di vicinato e può diventare fonte di notevoli inconvenienti nella vita dell'intero quartiere.

In alcuni complessi si sono osservate famiglie che non consentono ai loro bambini di frequentare le scuole materne ed elementari pubbliche, per evitare il contatto con i bambini di ceti « inferiori ». Le Assistenti Sociali hanno notato anche casi di assegnatari d'alloggi INACASA i quali, specie nel primo periodo, cercano di non far sapere che abitano in un quartiere il cui nome può essere legato all'idea di « periferia popolare ». E talvolta gli edifici abitati da dipendenti statali costituiscono isole a sé in mezzo al quartiere.

Le difficoltà ad entrare in rapporto con altre categorie sociali diverse sono differenti a seconda del sesso e dell'età. Di solito gli uomini maturi sono più pronti a stabilire contatti, se non altro perché si trovano impegnati a trattare insieme con i vicini i comuni problemi amministrativi. Anche i giovani appaiono disposti a superare i pregiudizi. Le donne, al contrario, cercano a volte di organizzare la vita familiare in modo da non sentire neppure la necessità dei rapporti con certi vicini.

Il Servizio Sociale tenta via via di allargare il senso della comunità dai gruppi ristretti la cui formazione è risultata quasi sempre possibile anche nelle situazioni più «disperate», includendo anche categorie più chiuse nei pregiudizi e meno portate alla vita di relazione.

Per quanto riguarda la eterogeneità di provenienza, relativamente rari sono gli «incontri» tra cittadini e rurali, ma assai più frequente, soprattutto nel Nord, l'accostamento tra famiglie provenienti da regioni diverse, e spesso lontanissime fra loro per mentalità e livello economico-sociale.

Se si considera che nel 1951 risultava tra gli assegnatari un 64% di famiglie immigrate da altri comuni, con un massimo del 79,4% in Lombardia e Piemonte, e se si pensa che negli ultimi anni le migrazioni interne si sono assai sviluppate, si può avere un'idea della vastità di questo fenomeno. Anche qui i pregiudizi sono meno accentratati tra i giovani, e in alcune regioni stanno scomparendo più rapidamente che in altre. L'intervento del Servizio Sociale tende a individuare e valorizzare quegli interessi comuni che meglio possano aiutare a superare i motivi di divisione. E qui va registrato un effetto comunque positivo dell'intervento dell'INACASA: quali che siano i problemi nati dall'accostamento tra famiglie di diverse regioni, è certo che la creazione dei complessi edilizi ha per lo meno superato il fenomeno negativo della relegazione degli immigrati in quartieri a parte. Per quante difficoltà possano sorgere dalla diversa provenienza degli assegnatari, nel giro di una generazione l'integrazione tra i gruppi sarà quasi un fatto compiuto, e se ne avvantaggeranno i rapporti tra gli immigrati e la città di adozione.

Altro aspetto importante è il grado di affollamento degli alloggi. Nei quartieri INACASA (abitati da famiglie più numerose, di solito, della media nazionale) è provato che non si superi in nessun caso, all'atto dell'assegnazione, un affollamento massimo pari a due persone per stanza utile. Ma la situazione può con l'andare del tempo modificarsi, anche profondamente, in un senso o nell'altro. Un grave inconveniente può essere la presenza di conviventi non a carico, e pertanto non compresi nel computo dei membri del nucleo familiare (ad esempio, un parente collaterale dell'assegnatario, che sopraggiunga con la sua famiglia). Per contro, anche nei complessi INACASA si è notato su più larga scala un fenomeno che è nazionale, e cioè il progressivo abbandono della famiglia patriarcale, e il generale orientamento verso la famiglia unicellulare. Il figlio o la figlia dell'assegnatario tendono ad abbandonare, quando si sposano, il domicilio dei genitori e ad avere un'abitazione propria.

Quando l'affollamento cresce, incide gravemente anche sui rapporti di vicinato: una famiglia troppo numerosa è, agli occhi delle altre, ingombrante e rumorosa; inoltre, la riunione di diverse famiglie troppo numerose in uno stesso fabbricato, provoca un deterioramento più rapido del patrimonio edilizio (Tav. 24).

Esigenze delle varie età

In alcuni complessi, l'abbandono del domicilio paterno, da parte dei giovani che si sposano, sta portando ad un invecchiamento della popolazione. Nella maggior parte dei quartieri, però, si ha una popolazione prevalentemente giovane, perché gli assegnatari sono padri di famiglia non anziani, con figli in età pre-scolare, scolare e giovanile.

La distribuzione della popolazione per età è un altro fattore assai importante per il Servizio Sociale, anche al fine di stabilire una gerarchia di urgenza fra le varie necessità. Se ad esempio sono molto numerosi i bambini in età pre-scolare il problema più urgente è

quello di custodirli durante la giornata (soprattutto se è in aumento, come quasi dovunque, il lavoro extra-domestico delle madri) e ci si occuperà, prima d'ogni altra cosa, di aprire asili nido e scuole materne.

Se vi sono molti giovani e adulti, passano in primo piano i problemi dell'orientamento e dell'addestramento professionale, del primo impiego, d'una sana e costruttiva utilizzazione del tempo libero.

Nell'affrontare le varie necessità secondo una gerarchia delle urgenze, il Servizio Sociale tiene indubbiamente conto, in primo luogo, delle richieste e delle aspirazioni degli assegnatari; ma il principio della « non sostituzione » ha qui dei limiti, per certi problemi che sono meno sentiti dalla popolazione e tuttavia sono particolarmente importanti. Per citare un esempio, le Assistenti Sociali segnalano che le popolazioni meridionali sentono in misura ancora del tutto inadeguata il problema dell'istruzione femminile.

Vita di quartiere

La dislocazione periferica dei quartieri INACASA provoca nella generalità dei casi l'assenza dei lavoratori nelle ore diurne, essendo quanto mai frequente la lontananza dei posti di lavoro dalle abitazioni. È necessario quindi preoccuparsi di stabilire luoghi di incontro tra la popolazione in modo che almeno le donne ed i bambini si debbano allontanare il meno possibile dal quartiere, e vengano a formare in certo modo il tessuto permanente della comunità.

Occorre dire che queste esigenze per lo più sono sentite immediatamente dalle famiglie, e non vi è bisogno di un'opera di sensibilizzazione particolarmente accentuata. Anche qui si è constatato un elevarsi progressivo delle richieste (ad esempio, richiesta di un mercato, di scuole secondarie, di sezioni decentrate degli Enti mutualistici, ecc.).

Naturalmente, non si può dimenticare che tutti gli assegnatari, compresi i bambini, devono essere avviati a far parte della comunità. Il Servizio Sociale non nega affatto, anzi sostiene l'opportunità che i lavoratori cerchino di stabilire rapporti con la città, con l'Azienda, con la propria famiglia, con i luoghi dove impiegare il tempo libero, svolgere attività culturali e politiche, assumere responsabilità politiche e sindacali. Tuttavia, che una parte di questa attività si svolga nel quartiere di residenza sembra ugualmente un'esigenza. È importante creare la comunità di vicinato, sia perché le famiglie non si debbano allontanare per i pasti e per il riposo.

Qui va segnalata la funzione che possono svolgere le sedi dei « Centri Sociali ». Essi fungono in breve vere e proprie istituzioni locali, dove gli abitanti fanno conoscere e liberano quei contatti che sono gli elementi fondamentali nella formazione della comunità di quartiere.

In questi incontri fra persone di diversa cultura, istruzione, interessi comuni, avviene uno scambio culturale, si concretizza la reale democrazia di base, nello scambio tra idee contrastanti possono nascere concreti vincoli di solidarietà fra gli abitanti di un quartiere.

La validità di queste formazioni sociali è dimostrata dal fatto che gli INACASA non solo non vengono considerati come « deprimati », ma quasi sono di esempio al resto della città per la loro alacrità di iniziative, per solidarietà attiva fra gli abitanti.

Nella realtà sociale dei quartieri gli adulti hanno una importante funzione, se la lontananza dai luoghi di lavoro consente loro di dedicare il loro tempo libero a iniziative limitate.

Già si è detto che con l'attribuzione di responsabilità amministrative agli stessi assegnatari, si è fatto un notevole passo avanti verso la formazione di reali rapporti democratici.

Ma frequentemente i gruppi di adulti estendono il loro interesse alle attività sportive, ricreative e culturali. Anzi, vinte le iniziali resistenze, sono spesso gli stessi adulti ad assumere in proprio tali iniziative, richiedendo alle Assistenti Sociali un'assistenza soltanto tecnica.

Soprattutto i giovani, però, si sono dimostrati propensi ad organizzarsi in gruppi per la soddisfazione di esigenze comuni: essi hanno una più larga rosa di interessi, e dispongono in genere di più tempo libero. Numerosi sono i gruppi che si sono formati per seguire iniziative culturali e sportive; e in molti di questi gruppi si è venuto man mano sviluppando un impegno attivo. Oggi si hanno biblioteche gestite dai giovani, nuove associazioni sportive, mostre di arti figurative presso i Centri Sociali, gruppi turistici giovanili.

Diverse associazioni di giovani sono giunte a darsi una vera e propria struttura democratica, con organi elettivi deliberanti ed esecutivi, uno statuto, in qualche caso la pubblicazione di un piccolo giornale.

Il problema scolastico è particolarmente sentito nei nuovi quartieri, e quindi i doposcuola, le attività di cultura popolare, di recupero scolastico, sono tra le iniziative più frequenti nei Centri Sociali, perché la rispondenza della popolazione è sicura. L'azione si estende a indagini sulle cause della renitenza scolastica, e a interventi presso le famiglie per rimuovere tali cause. In prosieguo di tempo, l'Assistente Sociale cerca di aiutare le famiglie con un'opera d'informazione, di chiarimento, di sostegno nel momento cruciale in cui il giovane, terminate le scuole elementari e le scuole d'obbligo, deve scegliere tra proseguire gli studi o avviarsi ad una specializzazione professionale.



Dal quartiere alla città

Come si vede, i problemi dei nuovi quartieri, pur nella loro vastità e complessità, richiedono una serie di interventi capillari, a livello individuale e familiare.

L'obiettivo ultimo del Servizio Sociale resta comunque quello di favorire, al di là dei gruppi d'interesse, la formazione di una vita di comunità a livello dell'intero quartiere. Naturalmente questo obiettivo non avrebbe senso se limitato al complesso INACASA, quando questo è di fatto inserito in una più vasta zona di edilizia pubblica o mista, o in una piccola città di provincia.

Ma si pensi, all'opposto, ai vastissimi quartieri costruiti e pianificati allo scopo di dar loro l'autosufficienza in tutti i settori, in modo da rendere non necessari gli spostamenti della popolazione, tranne che per le esigenze del lavoro quotidiano; quartieri che suggerirebbero il richiamo alla « città satellite » se non fosse per la lontananza dai posti di lavoro. In simili casi, solo lo svilupparsi di una vivissima rete di relazioni all'interno del quartiere può evitare l'isolamento di individui e famiglie che, d'un tratto, hanno dovuto interrompere quasi del tutto i legami con l'ambiente di provenienza e cercano — spesso senza successo — nuovi rapporti. La vita di comunità non sopprime la vita dei gruppi di interesse, al contrario, questi possono collaborare all'attività comune prendendo iniziative in favore del quartiere, e superando lo spirito di « clan d'iniziati » che talora deforma il loro originario carattere.

Infine la comunità di quartiere, come non sopprime i gruppi nel proprio ambito, così non deve isolarsi rispetto alla città, ma cerca di realizzare con essa un tipo di rapporti organici che vada al di là di una somma di rapporti individuali, spesso occasionali e quasi mai disinteressati.

Il quartiere, insomma, può essere — in una seria pianificazione urbana — la forma in cui la vita della città si articola senza disintegrarsi. Il Servizio Sociale è impegnato in tale direzione: con l'aiuto delle amministrazioni locali si potrà raggiungere questo obiettivo, di una città a misura dell'uomo.

Tav. 22 — Canoni mensili per un alloggio INACASA di 5 vani legali

ALLOGGIO	COSTO A VANO (LIRE)		
	400.000	500.000	600.000
A RISCATTO			
Per il piano generale, durata 25 anni	5.680	7.345	9.015
IN LOCAZIONE			
Aliquota 1,50%	2.500	3.125	3.750
Aliquota 1,25%	2.080	2.605	3.125
Aliquota 1, — %	1.667	2.085	2.500
Aliquota 0,75%	1.250	1.560	1.875
Aliquota 0,50%	835	1.040	1.250

N.B. — Non sono comprese le spese per amministrazione e manutenzione degli alloggi.

Tav. 23 — Famiglie assegnatarie di alloggi nei complessi INACASA
(ripartizione dei componenti per provenienza e categoria professionale)

	NORD	CENTRO	SUD	ISOLE	ITALIA
Percentuale immigrati sul complesso dei componenti le famiglie assegnatarie:					
regionali	20,40	16,85	15,00	18,07	18,10
extra-regionali	34,28	31,59	11,88	5,99	24,79
Percentuale ex baraccati o provenienti da campi di raccolta	58,67	47,85	50,26	45,16	50,48
Percentuale popolazione attiva sulla popolazione totale	45,71	36,65	23,49	23,10	32,74
Percentuale impiegati e funzionari sulla popolazione attiva	18,96	29,42	35,99	38,36	27,61
Percentuale operai e manovali sulla popolazione attiva	77,04	63,52	54,09	57,61	66,03

N.B. - Dati ricavati da un'indagine campionaria eseguita nel 1958.

Tav. 24 — Ripartizione per numero di componenti delle famiglie assegnatarie di alloggi, nei complessi INACASA

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	% FAMIGLIE CON NUMERO COMPONENTI						N. MEDIO DEI COMPONENTI PER FAMIGLIA	
	1-2	3-4	5-6	7-8	9 e più	Totale	Complessi INACASA	Popolazione totale ¹
Nord	9,-	52,2	28,-	8,-	2,8	100	4,36	
Centro	6,-	41,7	37,4	11,4	3,5	100	4,76	3,76
Sud	5,2	30,3	34,5	18,8	11,2	100	5,57	4,32
Isole	3,9	30,5	35,2	19,8	10,6	100	4,81	4,07
ITALIA	6,8	42,1	32,8	12,6	5,7	100	4,83	3,8

¹ Nelle città in cui sorgono i complessi INACASA considerati.
N.B. - Dati ricavati da un'indagine campionaria eseguita nel 1958.

Tav. 25 — Numero degli assegnatari INACASA che hanno ottenuto il cambio da « locazione » a « riscatto » e viceversa, a tutto il 31 dicembre 1962

REGIONE	DA « LOCAZIONE » A « RISCATTO »		DA « RISCATTO » A « LOCAZIONE »	
Piemonte e Valle d'Aosta	1.389	1.389		
Liguria	309	309		
Toscana	12	12		
Emilia	1.043	1.043		
Marche	142	142		
Umbria	746	746		
Lazio	77	77		
Abruzzo	1.14	1.14		
Molise	490	490		
Basilicata	399	399		
Calabria	698	698		
Sicilia	541	541		
Sardegna	797	797		
Puglia	695	695		
Basilicata	147	147		
Campania	442	442		
Apulia	1.472	1.472		
Veneto	1.14	1.14		
Totale	15.651	15.651		

Tav. 26 — Sviluppo del Servizio Sociale dell'INACASA dal 1955 al 1962 (numero complessi edilizi e numero Assistenti Sociali)

ANNO	NUMERO COMPLESSI SERVITI				NUMERO ASSISTENTI SOCIALI			
	Nord	Centro	Sud Isole	TOTALE	Nord	Centro	Sud Isole	TOTALE
1955	56	32	39	127	41	26	29	96
1956	70	35	69	174	59	32	49	140
1957	70	35	77	182	77	33	68	178
1958	75	40	87	202	84	42	83	209
1959	81	44	91	216	102	47	96	245
1960	92	43	110	245	107	57	123	287
1961	107	52	133	292	123	69	140	332
1962	132	43	120	295	139	116	148	403

L'Inacasa in cifre

Dai programmi all'attuazione dei piani

Un Piano di così vaste incidenze sociali ed umane come l'INACASA, non può essere descritto con le sole cifre. I suoi punti cruciali (ritmo rapido nonostante ogni difficoltà, mobilitazione degli architetti per studiare le nuove case popolari, graduatorie di assegnazione così meticolose da richiedere qualche volta più tempo della costruzione delle case, sforzo per «inventare» i nuovi quartieri cittadini, istituzione del Servizio Sociale) non esauriscono nelle tabelle e nei prospetti il loro vero significato.

Tuttavia da questo capitolo che si limita a esporre in sintesi, con stile scheletrico, i principali sviluppi quantitativi del Piano — quasi una guida alle numerose tabelle e ai grafici del volume — pensiamo che un risultato si possa ricavare: la riprova numerica, attraverso i dati consuntivi, di quello «spirito» del Piano che abbiamo cercato di presentare al lettore nella Premessa.

I lavoratori interessati al Piano

Erano quelli tenuti a versare il loro contributo dello 0,60 per cento sulla retribuzione; quelli stessi che potevano concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti dal Piano (anche se disoccupati, purché avessero versato il contributo per almeno un mese).

Si può calcolare che nel primo anno del Piano, dei 20 milioni di lavoratori italiani oltre 1/3, e cioè circa 7 milioni, erano interessati all'INACASA. Restavano esclusi tutti i lavoratori agricoli e i lavoratori indipendenti (professionisti, artigiani, commercianti in proprio, ecc.).

Rientravano nell'ambito del Piano tutti i lavoratori dipendenti dei settori dell'industria, del commercio, dei servizi (compresa la Pubblica Amministrazione), dei settori cioè su cui doveva essere indirizzato il principale sforzo per ottenere un miglioramento stabile e strutturale delle condizioni economiche del Paese.

Circa 3/4 di questi lavoratori risiedevano nel Centro-Nord e solo 1/4 nel Sud-Isole (anche se la popolazione del Mezzogiorno rappresentava il 37 per cento della popolazione italiana). La sola Lombardia contava 1/4 dei lavoratori contribuenti. Sul totale citato, i dipendenti da Pubbliche Amministrazioni incidevano con 1.300.000 unità; i piani prevedevano per ogni località contingenti distinti di alloggi per i dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e per i dipendenti da altri datori di lavoro. Il numero dei lavoratori aventi diritto all'assegnazione degli alloggi andò aumentando continuamente, in cifra assoluta e relativa, nei 14 anni.

La disponibilità *

Nei 14 anni la disponibilità del Piano è stata di 930 miliardi, così ripartiti per fonti di entrata e per Settennio:

Disponibilità del Piano in ciascuno dei due Settenni
IN MILIARDI

	PRIMO SETTENNIO	%	SECONDO SETTENNIO	%	TOTALE 14 ANNI	%
Stato	105	32,3	84	13,9	189	20,3
Contributi dei datori di lavoro	122	37,6	246	40,6	368	39,6
Contributi dei lavoratori	78	24,1	157	25,9	235	25,3
Introiti dagli assegnatari e varie	20	6,2	118	19,5	138	14,8
	325	100,1	605	100,1	930	100,1

* Cfr. Tav. 1 e Grafici a pag. 16 e pag. 17

Le entrate dell'INACASA sono dunque praticamente stabili al Secondo Settennio, e ciò pur essendo stata ridotta l'anticipata dallo Stato e benché sia rimasta inalterata dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'apporto tributario è dovuto, oltreché alla ricordata espansione al Piano, all'aumento dei salari; si segnala anche l'apporto introiti dagli assegnatari per rate di riscatto e fitti. Gli introiti naturalmente sviluppandosi col tempo ed assicureranno al Secondo Settennio, un ingente afflusso annuale di fondi al Piano.

Se le disponibilità ora indicate si rapportano ai 2.555 giorni di ciascun anno, si ottengono i seguenti dati sull'apporto giornaliero dell'INACASA:

Contributo giornaliero al Piano di ciascuna fonte di finanziamento
IN MILIONI

	PRIMO SETTENNIO
Stato	41
Datori di lavoro	146
Lavoratori	94
Assegnatari e varie	20
	201

Per i lavoratori si ricavano le cifre di 48 milioni al giorno nel Primo Settennio e 96 milioni al giorno nel Secondo Settennio; queste cifre vanno rapportate al numero medio dei lavoratori contribuenti in ciascuno dei due Settenni, per ottenere il contributo giornaliero di ciascun lavoratore: si è parlato di una sigaretta al giorno.

Il programma dei due Settenni *

Il programma INACASA dei 14 anni comprende costruzioni per un importo di 936 miliardi di lire, di poco superiore quindi alla disponibilità complessiva corrispondenti a 355 mila alloggi con 1.920.000 vani.

Questo imponente complesso di costruzioni è stato ripartito sul territorio nazionale con formule matematiche, in base agli indici stabiliti dalla Legge.

Al Sud-Isole fu assegnato il 38,1 per cento del complesso, e cioè 356 miliardi di costruzioni per 133 mila alloggi con 731 mila vani, come mostra la tabella seguente:

Costruzioni INACASA: Programma dei 14 anni

	MILIONI	ALLOGGI	VANI	MILIONI %
Centro-Nord	580.503	221.594	1.189.894	61,9
Sud-Isole	355.768	133.187	731.042	38,1
	936.271	354.781	1.919.936	100,-

* Cfr. Tav. 1, p. 27. Da - Grassetto a pag. 14.

La quota che l'INACASA doveva riservare al Sud-Isole era di 1/3; in pratica il programma dei 14 anni ha riservato al Sud-Isole il 38,1 per cento, una quota cioè sensibilmente superiore a quella minima prevista dalla Legge.

Percentuale riservata al Sud-Isole nel Programma dei 14 anni, confrontata con altri indici

	LAVORATORI INTERESSATI AL PIANO	QUOTA DI LEGGE	POPOLAZIONE RESIDENTE 1951	POPOLAZIONE RESIDENTE 1961	PROGRAMMA INACASA 14 ANNI
Centro-Nord	75,-	66,7	62,8	63,2	61,9
Sud-Isole	25,-	33,3	37,2	36,8	38,1
	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-

I due importi complessivi assegnati nei 14 anni rispettivamente al Centro-Nord e al Sud-Isole, pari rispettivamente a 580,5 ed a 355,8 miliardi, corrispondono a una assegnazione media di lire 75.000 per ogni lavoratore del Piano nel Centro-Sud e ad una assegnazione doppia, di lire 150.000, per ogni lavoratore nel Sud-Isole.

L'INACASA distribuirà le costruzioni su tutto il territorio nazionale, in ben 5.036 comuni, in modo da portare ovunque i benefici del Piano, come è illustrato nella tabella seguente:

Programma dei 14 anni
(IN MILIONI)

	CAPOLUOGHI	ALTRI COMUNI	TOTALE	N. COMUNI
Centro-Nord	312.453	268.050	580.503	3.319
Sud-Isole	184.824	170.944	355.768	1.717
	497.277	438.994	936.271	5

Nel Primo Settennio l'INACASA riserva addirittura agli «altri Comuni» (e cioè al complesso dei Comuni escluso il Capoluogo) un contingente superiore a quello dei «Capoluoghi».

L'inverso si verifica nel Secondo Settennio:

Programma INACASA dei 14 anni
(in milioni)

	PRIMO SETTENNIO	%	SECONDO SETTENNIO	%	TOTALE 14 ANNI	%
Capoluoghi	1.000.176	49,1	337.701	55,9	497.277	51,1
Altri Comuni	1.072.924	52,1	266.070	44,1	430.994	48,9
	2.073.100	100	603.771	100,0	936.271	100,0

Fra i Capoluoghi che hanno avuto i contingenti più forti, ricordiamo, nel Centro-Nord: Roma, con 57 miliardi di costruzioni, Milano con 41,2 miliardi, Torino con 24 miliardi, Genova con 19 miliardi, ecc.; nel Sud-Isola: Napoli con 47,6 miliardi di costruzioni, Palermo con 19 miliardi, Bari con oltre 11 miliardi, ecc.

Per dare un'idea della capillarità delle costruzioni INACASA, basterà confrontare (Tav. 28, il numero dei Comuni inclusi nel Piano col totale dei Comuni esistenti in ciascuna regione o provincia. Qualche dato indicativo: in Emilia risultano inclusi 314 Comuni su 337, in Puglia 290 su 252, ma il rapporto è altissimo in tutte le regioni.

Attuazione del programma dei 14 anni *

I dati riportati nella presente pubblicazione si riferiscono al 31 dicembre 1962 salvo quelli contabili che si rifanno all'ultimo bilancio pubblicato, chiuso al 30 giugno 1962). A quella data il programma del Primo Settennio era completamente realizzato da tempo; resta da esaminare perciò il grado di attuazione a cui era giunto il programma del Secondo Settennio (Tav. 29).

Al 31 dicembre 1962 per il 91,7 per cento del programma del Secondo Settennio gli stanziamenti erano già stati effettuati (si ricordi che per il Secondo Settennio, mentre il programma venne approvato in blocco, anticipatamente, i fondi vennero via via stanziati solo dove le pratiche preliminari, area e progetto, erano già a punto).

L'84,5 per cento dell'intero programma del Secondo Settennio era stato appaltato e il 72,1 per cento era già ultimato.

Al 31 dicembre 1962 la situazione nelle varie fasi, in percentuale, del programma del Secondo Settennio, era dunque la seguente:

Situazione al 31 dicembre 1962, delle costruzioni del Secondo Settennio

	COSTRUZIONI (MILIONI DI LIRE)	%
Costruzioni ultimate	435,3	72,1
Costruzioni in corso	75,2	12,4
Stanziamenti in corso di appalto	43,3	7,2
Programmi in attesa di stanziamento (area o progetto non ancora forniti)	50,-	8,3
Totale programma	603,8	100,-

* Cfr. Tavv. 9, 10, 11, 16, 29 e Grafico a pag. 98.



L'attuazione del Piano era, in una certa misura, più avanzata nel Centro-Nord che al Sud, come mostra la seguente tabella:

Attuazione del programma del Secondo Setteennio al 31 dicembre 1962

PROGRAMMA	STANZIAMENTI EFFETTUATI	APPALTI RATIFICATI	COSTRUZIONI COMPLETATE
a IMPORTO DELLE COSTRUZIONI IN MILIONI			
Centro-Nord	369.750	340.149	320.738
Sud-Est	254.021	213.462	189.718
	603.771	553.611 *	510.456
b DATI IN PERCENTUALE DEL PROGRAMMA			
Centro-Nord	100,-	92,-	86,7
Sud-Est	100,-	91,2	81,1
	100,-	91,7	84,5

* A. 1961-1962 - ESERCIZIO - A. 1963-1964 - ESERCIZIO

Dal bilancio della Gestione al 30 giugno 1962 si può ricavare un indice sintetico del grado di attuazione del Piano verso il termine dei 14 anni. Quando ancora mancavano 9 mesi al compimento del quattordicennio, esso risultava nel complesso pari al 90,4 per cento.

NOLA CUCINA POP. EDIZIONE

Infatti a tale data (Tab. 16) sui 932,5 miliardi di costruzioni costituenti il programma (Primo e Secondo Settennio), ben 842,6 miliardi, risultavano già eseguiti; deducendo da tale cifra le spese effettuate per aree e progetti «a demanio», le integrazioni, ecc. il Piano risultava eseguito per circa l'85 per cento. Dalla stessa tavola si ricavano i seguenti dati sull'importo dei lavori nei singoli esercizi:

Importo dei lavori eseguiti dall'INACASA nei vari esercizi
(IN MILIARDI)

ESERCIZIO	LAVORI ESEGUITI DALL'INACASA	ESERCIZIO	LAVORI ESEGUITI DALL'INACASA
1950-51	52,4	1956-57	32
1951-52	53,7	1957-58	59,4
1952-53	54,3	1958-59	118,2
1953-54	54,6	1959-60	150,4
1954-55	44,4	1960-61	109,7
1955-56	30,6	1961-62	65,6

Si noti la « tenuta » media di 52-54 miliardi annui, corrispondenti a 22-26.000 alloggi l'anno nel cuore del Primo Settennio (e cioè nel periodo 1951-54) e, analogamente, la cadenza poderosa di 120-140 miliardi, corrispondenti a 40.000 alloggi annui, nel cuore del Secondo Settennio (e cioè nel periodo 1958-61).

Si noterà anche (dalla stessa Tav. 16) come la « programmazione » sia già stata esaurita, per il complesso dei 932,5 miliardi, fin dal 1957, in modo da mettere in moto tutta la macchina periferica per la ricerca delle aree e per la preparazione dei progetti.

Questa « programmazione anticipata » tutto il Secondo Settennio è stato programmato all'inizio, in un biennio, è stato il segreto della rapida attuazione di un Piano così complesso che doveva superare, in migliaia e migliaia di località, difficoltà di ogni genere (vedi Grafico a pag. 98).

Il frutto più importante è stata l'occupazione operata, quella diretta, nei cantieri dell'INACASA, ha raggiunto, al dicembre 1962, i 102 milioni di giornate, di cui 37 milioni nel Sud e nelle Isole.

L'INACASA fra i due Censimenti *

Il decennio 1951-61 è un periodo di forte sviluppo del settore edilizio italiano, che ha registrato un aumento di 4,6 milioni di stanze contro un aumento di 2,9 milioni della popolazione. Il numero medio delle persone per stanza è quindi diminuito da 1,27 a 1,08 come mostra la tabella a pagina seguente.

Pasce fra i due Censimenti la popolazione è aumentata del 7 per cento nel Centro-Nord e solo del 5 per cento nel Sud-Isole, mentre il numero delle stanze è aumentato del 25 per cento nel Centro-Nord e del 28 per cento nel Sud-Isole, il miglioramento nelle condizioni di affollamento è stato più sensibile nel Sud-Isole (19%) che nel Centro-Nord (14%).

L'INACASA, con la rapida realizzazione di un vastissimo piano edilizio, ha dato un efficace contributo a questo miglioramento. Le costruzioni realizzate dall'INACASA nel decennio fra i due Censimenti incidono infatti per il 9,1 per cento sull'incremento totale verificatosi in Italia, e l'incidenza è maggiore, 11,9 per cento, per il Sud-Isole.

* cfr. I. n. 4, 2, 11, 14, 15.

Incremento degli abitanti, delle abitazioni e delle stanze fra gli ultimi due Censimenti
(IN MILIONI DI UNITÀ)

	N. ABITANTI (milioni)	N. ABITAZIONI (milioni)	N. STANZE (milioni)	ABITANTI PER STANZA
a) CENSIMENTO 1951				
Centro-Nord	29,8	7,3	26,8	1,11
Sud-Isole	17,7	4,1	10,5	1,69
	47,5	11,4	37,3	1,27
b) CENSIMENTO 1961				
Centro-Nord	31,9	9,3	33,5	0,95
Sud-Isole	18,6	4,8	13,4	1,38
	50,5	14,1	46,9	1,08
c) INCREMENTO PERCENTUALE FRA I DUE CENSIMENTI				
Centro-Nord	+ 7%	+ 27%	+ 25%	- 14%
Sud-Isole	+ 5%	+ 17%	+ 28%	- 19%
	+ 6%	+ 22%	+ 26%	15%

Incremento delle abitazioni fra i due Censimenti (1951/61)

	ABITAZIONI COSTRUITE DALL'INACASA	INCREMENTO COMPLESSIVO DELLE ABITAZIONI IN ITALIA	%
Centro-Nord	159.398	1.967.314	8,1
Sud-Isole	82.233	693.657	11,9
	241.631	2.660.971	9,1

Le costruzioni aziendali e il piano Aggiuntivo *

Le costruzioni « dirette » delle Aziende per i propri dipendenti sono state una delle iniziative di maggior successo e più note della Legge Fanfani che, naturalmente, ha dato i suoi frutti soprattutto nelle zone industriali (nel Sud-Isole solo il 14,3 per cento).

Costruzioni aziendali: stanziamenti al 31 dicembre 1962 (PRIMO E SECONDO SETTENNIO)

	MILIONI	ALLOGGI	VANI	%
Centro-Nord	90,9	41.479	205.816	85,8
Sud-Isole	14,1	6.375	34.112	14,2
	105,—	47.854	239.928	100,—

* Cg. Tav. 30.

Si pensi al criterio adottato nelle iniziative aziendali (anticipo, nelle costruzioni, dei contributi dell'intero Settennio) e si vedrà come 105 miliardi di costruzioni dirette abbiano significato, all'inizio di ciascun Settennio, una notevole spinta all'interno del Piano, un « volano » dentro al « volano ». Si vede facilmente come le costruzioni aziendali (benché più della metà di esse cada nel Secondo Settennio) abbiano un costo medio in complesso limitato (sulle 440 mila a vano), pur avendo in genere, queste costruzioni, buone caratteristiche, grazie alla speciale collaborazione dell'Azienda.

Mentre le costruzioni aziendali si inseriscono nello schema iniziale del Piano, quelle del piano Aggiuntivo innovano profondamente alcuni aspetti fondamentali, e soprattutto il rapporto fra l'INACASA e l'aspirante assegnatario.

Costruzioni del piano Aggiuntivo: stanziamenti al 31 dicembre 1962.

	MILIARDI	ALLOGGI	VANI
Centro-Nord	171,1	77.112	390.816
Sud-Isole	58,2	26.742	139.112
	165,3	103.854	529.928

L'insieme del piano Aggiuntivo nelle sue tre componenti principali, Cooperative, Aziende, ha raggiunto dunque i 55 mila alloggi, di cui 14 mila sono stati assegnati; anche nel Sud-Isole è sorta una quota notevole (33,0 per cento) di nuove costruzioni.

Incidenza sugli stanziamenti totali delle costruzioni aziendali e del piano Aggiuntivo
al 31 dicembre 1962

IN MILIONI

	STANZIAMENTI PRIMO E SECONDO SETTENNIO		CONTRIZIONI AZIENDALI	%	PIANO AGGIUNTIVO	%
Centro-Nord	511,1	100	90,9	16,5	107,1	18,4
Sud-Isole	135,2	100	14,1	0,4	50,2	17,4
	646,3	100	105, —	11,8	167,3	17,7

Rispetto all'importo totale degli stanziamenti al 31 dicembre 1962, le costruzioni aziendali incidono per l'11,8 per cento e quelle del piano Aggiuntivo per il 18,7 per cento. Il divario è assai minore se riferito al numero d'alloggi o di vani, dato che per il piano Aggiuntivo, appartenente tutto al Secondo Settennio, il costo medio a vano è superiore, e pari a circa 330 mila lire in media; si tenga però presente che per le Cooperative le cifre non comprendono l'impor- to dell'area, anticipato dai Soci.

Alloggi a riscatto e in locazione *

La Legge istitutiva prevedeva che la metà degli alloggi costruiti dalla Gestione fosse assegnata con promesse di vendita; la Legge di rinnovo del Piano per il Secondo Settennio portò questa quota al 66%.

Gli durante il Primo Settennio, però, il Comitato aveva largamente accolto le richieste in favore della destinazione a riscatto di una più larga quota degli alloggi costruiti.

* Cfr. Tav. 29.

Alloggi assegnati a riscatto e in locazione al 31 dicembre 1962

A) PRIMO SETTENNIO					
	N. alloggi	%	N. alloggi	ESIST.	
Centro-Nord	59.462	61,9	36.535		
Sud-Isole	32.005	61,4	20.096	38,6	5
	91.467	61,8	56.631	38,2	
B) SECONDO SETTENNIO					
Centro-Nord	82.258	77,4	24.052	22	
Sud-Isole	38.174	72,6	14.418	27,4	52
	120.432	75,8	38.470	24,2	15
C) TOTALE PIANO 14					
Centro-Nord	141.720	70,1	60.587	29,9	202.307
Sud-Isole	70.179	67,—	34.514	33,—	
	211.899	—	—	—	



Segue: Tav. 27 — Costruzioni prog.

CIRCOSCRIZIONI	MILIONI DI LIRE (milioni)			C
	Catolombi	Altri Comuni	TOTALE	
Belluno	303	759	1	
Padova	2 492	1 625	4 117	
Rovigo	520	1 214	1 7	
Treviso	1 084	2 367		
Venezia	3 231	2 276		
Verona	2 384	975		
Vicenza	1 409	3 900		
Veneto	11 443	12 16		
Gorizia	727	779	1	
Udine	934	3 634	4	
Trieste				
Friuli-Venezia Giulia	1 661	4 1		
Genova	6 059	1 075	7	
Imperia	274	489	7	
La Spezia	1 661	1 7		
Savona	928	1 1		
Liguria	8 922	4 446	13 368	17
Bologna	4 479	1 771	6 250	
Ferrara	1 510	1		
Forlì	885	2 915		
Modena	1 562	1 354		
Parma	1 250	677	1 927	
Piacenza	1 354	521	1 875	
Ravenna		1		
Reggio nell'Emilia	1 1			
Emilia-Romagna	12 811	1		

Tav. 27 — Costruzioni programmate nei due bienni per provincia

CIRCOSCRIZIONI	PRM		
	Capoluoghi		
Alessandria	847	1 27	-
Asti	476	1	-
Cunco	42	1	-
Novara	95	-	-
Torino	8.573	-	-
Vercelli	635	2 77	-
<i>Piemonte</i>	11.907	1	-
<i>Valle d'Aosta</i>	519	-	-
Bergamo	1 170	4	-
Brescia	1 862	-	-
Como	904	-	-
Cremona	692	-	-
Mantova	692	-	-
Milano	16 600	1	-
Pavia	851	1 77	-
Sondrio	202	-	-
Varese	745	-	-
<i>Lombardia</i>	23.71	- 27	-
Bolzano	1 551	-	-
Trento	723	1	-
<i>Trentino-Alto Adige</i>	2.27	-	-

Segue: Tav. 27 — Costruzioni programmate nei due Settenni, per provincia

CIRCOSCRIZIONI	PRIMO SETTENNIO (milioni)			SECONDO SETTENNIO (milioni)			DUE SETTENNI (milioni)		
	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE
Belluno	303	759	1.062	648	1.543	2.191	951	2.302	3.253
Padova	2.492	1.625	4.117	3.381	3.050	6.431	5.873	4.675	10.548
Rovigo	520	1.214	1.734	1.010	1.997	3.007	1.530	3.211	4.741
Treviso	1.084	2.167	3.251	1.790	4.344	6.134	2.874	6.511	9.385
Venezia	3.251	2.276	5.527	6.895	2.671	9.566	10.146	4.947	15.093
Verona	2.384	975	3.359	3.886	1.698	5.584	6.270	2.673	8.943
Vicenza	1.409	3.900	5.309	2.564	4.192	6.756	3.973	8.092	12.065
<i>Veneto</i>	<i>11.443</i>	<i>12.916</i>	<i>24.359</i>	<i>20.174</i>	<i>19.495</i>	<i>39.669</i>	<i>31.617</i>	<i>38.411</i>	<i>64.028</i>
Gorizia	727	779	1.506	1.175	1.126	2.301	1.902	1.905	3.807
Udine	934	3.634	4.568	1.996	5.025	7.021	2.930	8.659	11.589
Trieste				5.615	182	5.797	5.615	182	5.797
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	<i>1.661</i>	<i>4.413</i>	<i>6.074</i>	<i>8.786</i>	<i>6.333</i>	<i>15.119</i>	<i>10.447</i>	<i>10.746</i>	<i>21.193</i>
Genova	6.059	1.075	7.134	12.985	1.861	14.846	19.044	2.936	21.980
Imperia	274	489	763	690	1.023	1.713	964	1.512	2.476
La Spezia	1.661	1.758	3.419	2.845	941	3.786	4.506	2.699	6.485
Savona	928	1.124	2.052	950	1.443	2.393	1.878	2.567	4.445
<i>Liguria</i>	<i>8.922</i>	<i>4.446</i>	<i>13.368</i>	<i>17.470</i>	<i>5.268</i>	<i>22.738</i>	<i>26.392</i>	<i>9.714</i>	<i>36.106</i>
Bologna	4.479	1.771	6.250	9.387	3.153	12.540	13.866	4.924	18.790
Ferrara	1.510	1.406	2.916	3.914	2.733	6.047	4.824	4.139	8.963
Forlì	885	2.915	3.800	1.554	3.305	4.859	2.439	6.220	8.659
Modena	1.562	1.354	2.916	2.555	2.767	5.322	4.117	4.121	8.238
Parma	1.250	677	1.927	2.052	1.219	3.271	3.302	1.896	5.197
Piacenza	1.354	521	1.875	1.269	803	2.072	2.623	1.324	3.947
Ravenna	625	1.458	2.083	1.340	1.938	3.278	1.965	3.396	5.361
Reggio nell'Emilia	1.146	1.198	2.344	1.991	1.786	3.777	3.137	2.984	6.121
<i>Emilia-Romagna</i>	<i>12.811</i>	<i>11.300</i>	<i>24.111</i>	<i>23.462</i>	<i>17.704</i>	<i>41.166</i>	<i>36.273</i>	<i>29.001</i>	<i>65.274</i>

Segue: Tav. 27 — Costruzioni programmate nei due Settenni, per provincia

CIRCOSCRIZIONI	PRIMO SETTENNIO (milioni)			SECONDO SETTENNIO (milioni)			DUE SETTENNI (milioni)			TOTALE COSTRUZIONI DEI DUE SETTENNI	
	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	N° alloggi	N° vani
Abruzzo	412	1.132	1.544	—	5	2.167	1.273	2.477	3.750	1.100	7.400
Basilicata	4.123	2.606	6.729	—	1	13.400	13.711	7.007	20.718	7.000	12.100
Calabria	501	1.100	1.601	—	0	2.340	1.003	2.700	4.300	1.000	7.000
Emilia	1.000	1.000	2.000	2.000	40	3.070	3.300	1.100	7.000	3.000	10.000
Liguria	600	1.000	2.000	1.000	5	3.000	1.700	3.000	5.000	2.400	11.000
Maremma-Carrara	500	—	500	1.000	6	2.170	1.000	2.000	3.000	1.000	7.000
Piemonte	900	1.100	2.000	2.000	5	3.700	3.000	2.700	5.800	2.000	11.000
Puglia	400	—	400	1.000	1	2.000	1.400	1.000	2.400	1.000	6.000
Sardegna	400	—	400	1.000	6	2.000	1.000	1.700	2.700	1.000	7.000
Toscana	9.000	11.000	20.000	20.000	9	30.000	20.000	27.000	47.000	22.000	120.000
Provincia Trento	700	1.000	2.000	1.000	4	3.000	2.000	4.000	7.000	2.000	13.000
Umbria	1.000	—	1.000	1.000	7	2.000	2.000	—	3.000	1.000	6.000
Valle d'Aosta	1.000	2.000	3.000	3.000	1	7.000	3.000	4.000	10.000	4.000	22.000
Venezia	1.000	1.000	2.000	2.000	6	3.000	1.000	1.000	6.700	2.000	13.000
Alto Adige	—	—	—	—	9	1.000	1.000	1.000	2.700	7	7.000
Marche	—	—	—	—	9	1.000	—	—	2.000	—	—
Provincia di Trento	400	700	1.100	1.000	1	3.100	1.000	1.000	3.000	1.000	6.000
Molise	2.000	3.000	5.000	3.000	5	10.000	7.000	9.000	16.000	6.000	30.000
Provincia di Trento	200	1.000	2.000	700	6	3.700	1.000	3.000	4.000	2.000	10.000
Provincia di Trento	100	—	1.000	500	2.000	2.500	700	2.000	2.700	1.000	6.000
Provincia di Trento	300	—	300	600	4	1.277	1.211	700	1.911	—	—
Provincia di Trento	15.000	2.000	17.000	31.000	0	45.000	30.000	6.000	61.000	20.000	100.000
Provincia di Trento	200	—	200	600	4	1.800	900	1.200	2.100	—	—
Totale	10.000	6.000	22.000	44.000	9	54.000	60.000	15.000	76.000	20.000	100.000

Segue: Tav. 27 — Costruzioni programmate nei due Settenni, per provincia

CIRCOSCRIZIONI	PRIMO SETTENNIO (milioni)			SECONDO SETTENNIO (milioni)			DUE SETTENNI (milioni)			TOTALE COSTRUZIONI DEI DUE SETTENNI	
	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	N° alloggi	N° vani
<i>Campania</i>											
Capua	461	795	1.256	1.729	1.448	3.177	2.190	2.243	4.433	1.627	8.782
L'Aquila	592	1.905	2.497	966	2.348	3.314	1.468	4.253	5.721	2.231	11.833
Perugia	563	1.895	2.458	1.564	1.929	3.493	2.077	3.824	5.901	2.234	11.617
Teramo	795	628	1.423	1.902	1.027	2.929	2.697	1.655	4.352	1.620	8.820
	293	597	890	515	809	1.324	808	1.406	2.214	843	4.384
<i>Abruzzo e Molise</i>	2.764	5.320	8.384	6.676	7.561	14.237	9.240	13.381	22.621	8.555	45.436
<i>Apulia</i>											
Avellino	764	1.569	2.333	2.317	2.281	4.598	3.081	3.850	6.931	2.610	14.044
Benevento	1.087	477	1.484	1.987	666	2.653	2.994	1.143	4.137	1.508	8.181
Caserta	551	2.863	3.414	2.447	4.944	7.391	2.998	7.807	10.805	3.985	21.956
Napoli	15.268	12.193	27.461	32.381	17.934	50.315	47.649	30.127	77.776	28.504	157.994
Salerno	1.961	5.142	7.103	3.255	8.689	11.944	5.216	13.831	19.047	7.262	39.403
<i>Emilia</i>	19.551	22.244	41.795	42.387	34.514	76.901	61.938	56.758	118.696	43.869	241.578
<i>Liguria</i>											
Bari	4.462	4.787	9.249	6.832	7.551	14.383	11.194	12.338	23.532	9.117	49.428
Brescia	1.064	692	1.756	2.312	1.709	4.021	3.376	2.401	5.777	2.281	11.712
Foggia	2.074	2.978	5.052	3.472	5.538	9.010	5.546	8.516	14.062	5.585	29.375
Lecco	1.380	2.713	4.093	4.249	6.605	10.854	5.579	9.318	14.897	5.733	30.598
Parma	3.404	1.064	4.468	5.285	1.259	6.544	8.689	2.323	11.012	4.485	23.073
<i>Puglia</i>	12.234	12.234	24.468	22.150	22.662	44.812	34.384	34.896	69.280	27.201	144.186
<i>Sardinia</i>											
Matera	585	692	1.277	1.303	932	2.235	1.888	1.624	3.512	1.371	7.21
Porto	809	1.319	2.128	2.188	2.006	4.194	2.997	3.325	6.322	2.331	12.674
<i>Sicily</i>	1.394	2.011	3.405	3.491	2.938	6.429	4.885	4.949	9.834	3.702	19.111

Segue: Tav. 27 — Costruzioni programmate nei due Settenni, per provincia

CIRCOSCRIZIONI	PRIMO SETTENNIO (milioni)			SECONDO SETTENNIO (milioni)			DUE SETTENNI (milioni)			TOTALE COSTRUZIONI DEI DUE SETTENNI	
	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	Capoluoghi	Altri Comuni	TOTALE	N° alloggi	N° vani
Catanzaro	1.173	2.880	4.053	3.479	5.312	8.791	4.652	8.192	12.844	4.899	26.403
Cosenza	1.067	2.667	3.734	3.925	4.107	7.932	4.992	6.614	11.666	4.281	22.784
Reggio di Calabria	1.760	2.348	4.108	4.681	3.155	7.736	6.441	5.403	11.844	4.409	23.960
<i>Calabria</i>	<i>1.000</i>	<i>7.895</i>	<i>11.895</i>	<i>12.085</i>	<i>12.374</i>	<i>24.459</i>	<i>16.085</i>	<i>20.269</i>	<i>36.354</i>	<i>13.589</i>	<i>73.147</i>
Agrigento	336	1.552	1.888	1.426	2.618	4.044	1.762	4.170	5.932	2.319	12.355
Caltanissetta	577	1.101	1.678	1.341	2.122	3.563	1.918	3.323	5.241	2.000	10.650
Catania	2.307	1.154	3.461	7.367	3.447	10.804	9.674	4.591	14.265	5.108	29.060
Enna	252	840	1.092	1.133	1.166	2.699	1.385	2.406	3.791	1.396	7.623
Messina	2.622	1.154	3.776	5.918	2.872	8.790	8.540	4.026	12.566	4.398	25.860
Palermo	5.770	1.416	7.186	13.293	1.103	14.496	19.063	2.619	21.682	7.947	47.497
Ragusa	241	755	996	582	1.108	1.370	823	1.543	2.366	861	4.978
Siracusa	707	944	1.731	1.938	1.145	3.183	2.725	2.189	4.914	1.903	11.259
Trapani	608	1.409	2.097	1.022	2.107	3.529	1.630	3.996	5.626	2.075	11.590
<i>Sicilia</i>	<i>13.500</i>	<i>10.405</i>	<i>23.905</i>	<i>34.020</i>	<i>18.108</i>	<i>52.478</i>	<i>47.520</i>	<i>28.863</i>	<i>76.383</i>	<i>28.007</i>	<i>160.872</i>
Cagliari	1.843	3.263	5.106	5.257	3.860	9.117	7.100	7.123	14.223	5.289	29.012
Nuoro	263	526	789	711	1.492	2.203	974	2.018	2.992	1.056	6.126
Sassari	905	1.095	2.000	1.793	1.592	3.385	2.698	2.687	5.385	1.919	10.801
<i>Sardegna</i>	<i>3.011</i>	<i>4.884</i>	<i>7.895</i>	<i>7.761</i>	<i>6.944</i>	<i>14.705</i>	<i>10.772</i>	<i>11.828</i>	<i>22.600</i>	<i>8.264</i>	<i>45.939</i>
Centro-Nord	103.322	107.431	210.753	209.131	160.619	369.750	312.453	268.050	580.503	221.594	1.188.894
Sud-Est	56.254	65.493	121.747	128.570	105.451	234.021	184.824	170.944	355.768	133.187	731.042
ITALIA	159.576	172.924	332.500	337.701	266.070	603.771	497.277	438.994	936.271	354.781	1.919.936

Tav. 28 — Numero dei Comuni inclusi nei piani del 1° e del 2° Settore
(per provincia)

CIRCOSCRIZIONI	COMUNI IN COMPLESSO	P. 1°	P. 2°
Alessandria	190	1	1
Asti	120	1	11
Cuneo	250	1	1
Novara	11	12	1
Torino	11	101	11
Vercelli	100	1	1
<i>Piemonte</i>	1	1	1
<i>Aosta</i>	1	1	1
Bergamo	211	1	1
Brescia	207	1	1
Como	11	11	1
Cremona	117	1	1
Mantova	70	1	1
Milano	117	1	1
Pavia	11	1	1
Sondrio	78	1	1
Varese	11	1	1
<i>Lombardia</i>	1	1	1
Bolzano	111	1	1
Trento	227	1	1
<i>Trentino-Alto Adige</i>	1	1	1

NELLA FOTO:

Anche i materiali edilizi, se opportunamente trattati, possono essere usati secondo le loro specifiche caratteristiche cromatiche, per personalizzare l'architettura dei singoli edifici da « Suggestioni cromatiche » - Fasc. n. 2, pag. 25.
Cronaca - P. 1 - Unità d'abitazione Italsider - Costruzione in acciaio - Progettazione Architetto G. R. Giarrà

Segue: Tav. 28 — Numero dei Comuni inclusi nei Piani del 1° e del 2° Settennio (per provincia)

CIRCOSCRIZIONI	COMUNI IN COMPLESSO	COMUNI INCLUSI				
		Primo Settennio	Secondo Settennio	Solo nel Primo Settennio	Solo nel Secondo Settennio	In uno o in entrambi i Settenni
Catanzaro	150	102	82	43	23	125
Cosenza	155	97	64	50	17	114
Reggio Calabria	96	73	51	28	6	79
Calabria	410	272	197	121	46	318
Agropoli	43	31	22	13	3	34
Capomonte	22	22	18	4	—	22
Catania	55	30	32	12	14	44
Enna	20	20	13	7	—	20
Messina	107	37	46	12	20	57
Palermo	80	57	42	27	12	69
Ragusa	12	10	10	2	2	12
Syracusa	19	14	11	5	2	16
Trapani	23	21	16	6	2	23
Aquila	370	242	210	88	55	297
Cagliari	161	70	50	31	14	81
Nuoro	90	23	47	6	30	53
Sassari	76	52	19	36	3	55
Sardegna	335	145	116	73	47	189
Centro-Nord	3.511	2.690	2.569	745	644	3.319
Sud-Est	2.484	1.435	1.164	555	293	1.717
ITALIA	7.995	4.125	3.733	1.300	937	5.036

N.B. — Il numero dei Comuni in complesso si riferisce alla data del 31 dicembre 1957.

Segue: Tav. 29 — Attuazione del programma del 1° e del 2° Settennio

CIRCOSCRIZIONI			
Belluno	—	—	—
Padova	6.431	2.131	—
Rovigo	1.007	—	—
Treviso	6.131	2.137	—
Venezia	9.731	—	—
Verona	5.731	—	—
Vicenza	6.731	—	—
Veneto	39.990	13.411	7
Gorizia	2.301	7	—
Udine	7.021	2.347	—
Trieste	5.797	1.85	—
Friuli-Venezia Giulia	15.110	4.090	27
Genova	—	—	—
Imperia	1.7	—	—
La Spezia	—	—	—
Savona	4	—	—
Liguria	22.730	7.2	—
Bologna	—	—	—
Ferrara	6.047	—	—
Forlì	4.059	1.770	—
Modena	5.022	—	—
Parma	—	—	—
Piacenza	2.072	—	—
Ravenna	3.271	—	—
Reggio nell'Emilia	—	—	—
Emilia-Romagna	—	—	—

Tav. 29 — Attuazione del programma del 2° Settennio nelle varie fasi, per provincia, al 31 dicembre 1962

DESCRIZIONE	PROGRAMMI			STANZIAMENTI			APPALTI			COSTRUZIONI ULTIME			ALLOGGI ASSEGNATI		
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	A riscatto	In locazione	TOTALE
Assunzione	3.002	1.775	7.316	3.002	1.772	6.791	3.803	1.356	7.322	3.331	1.190	6.426	1.013	254	1.267
Ass.	1.002	468	2.000	1.000	468	2.115	1.320	452	2.531	1.320	452	2.531	401	48	449
Comuni	2.000	1.000	3.316	2.002	1.000	3.776	2.653	952	5.141	2.440	875	4.725	806	127	933
Nuova	5.200	1.775	10.000	5.200	1.775	10.000	4.547	1.610	8.694	3.615	1.293	6.982	1.152	407	1.559
Trasf.	24.000	1.000	40.000	24.000	1.000	40.000	18.168	6.326	30.528	16.472	5.762	30.539	5.390	1.178	6.568
Varie	4.000	1.775	9.201	4.000	1.775	7.117	3.759	1.315	7.101	2.938	1.039	5.611	1.115	207	1.322
Totale	43.146	13.117	60.154	43.146	13.117	70.154	4.250	12.011	61.317	30.116	10.611	56.814	9.877	2.221	12.098
Trasf. (1962)	1.000	468	2.000	1.000	468	2.520	1.616	536	3.002	1.616	536	3.002	478	78	556
Benigno	2.000	1.000	13.112	2.000	1.000	13.115	6.911	2.535	13.182	6.682	2.467	12.828	2.134	354	2.488
Brescia	6.000	1.000	19.211	6.000	1.000	17.323	8.109	2.989	16.440	7.788	2.888	15.884	2.460	448	2.908
Como	7.000	2.775	14.000	7.000	2.775	13.759	6.807	2.406	12.992	6.550	2.324	12.550	2.231	154	2.385
Cremona	2.000	1.000	4.000	2.000	1.000	4.001	2.338	861	4.477	2.338	861	4.477	663	174	837
Monza	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	1.960	2.693	975	5.363	2.693	975	5.363	632	340	972
Milano	44.000	13.117	60.000	44.000	13.117	70.825	4.834	12.521	63.857	32.269	11.750	59.925	10.629	1.666	12.295
Parma	4.000	1.000	8.221	4.000	1.000	6.735	3.119	1.263	6.441	2.603	1.019	5.197	921	204	1.125
Sanremo	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.533	1.403	481	2.549	1.173	405	2.147	289	104	393
Varie	3.000	3.141	10.333	3.000	3.141	14.616	7.985	2.987	15.532	7.903	2.966	15.423	2.298	688	2.986
Totale	80.000	32.271	168.026	80.000	32.271	148.197	74.499	27.018	140.833	69.999	25.655	133.794	22.257	4.132	26.389
Brescia	4.447	1.481	7.907	4.447	1.481	6.458	3.533	1.177	6.356	3.369	1.131	6.107	973	148	1.121
Trasf.	4.000	1.250	7.150	4.000	1.250	6.302	3.382	1.061	6.048	3.273	1.031	5.877	706	326	1.032
Totale (1962)	8.447	2.731	15.057	8.447	2.731	12.760	6.915	2.238	12.404	6.642	2.162	11.984	1.679	474	2.153

Segue: Tav. 29 — Attuazione del programma del 2° Settennio nelle varie fasi, per provincia, al 31 dicembre 1962

CIRCONSCRIZIONI	PROGRAMMI			STANZIAMENTI			APPALTI			COSTRUZIONI ULTIME			
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Vani
Belluno	2.191	650	3.705	1.991	610	3.111	1.844	548	3.124	1.339	401	2.286	
Padova	6.431	2.132	12.366	6.567	2.246	11.904	6.757	2.242	13.004	6.739	2.236	12.000	1.1
Rovigo	5.007	990	5.695	2.834	991	5.033	2.849	947	5.398	2.571	865	4.911	
Treviso	6.133	2.176	12.621	5.876	2.089	10.483	5.816	2.064	11.971	4.880	1.755	10.116	1
Venezia	9.506	3.300	18.151	8.336	3.040	15.803	8.165	2.817	15.494	7.920	2.735	13.041	
Verona	5.584	1.918	10.909	5.076	1.903	9.515	5.301	1.851	10.365	5.232	1.825	10.220	1
Vicenza	6.706	2.208	12.365	6.682	2.436	12.911	6.680	2.184	12.230	5.789	1.910	10.696	1
Totale	99.669	13.413	75.812	37.362	13.315	68.748	37.412	12.653	71.586	34.470	11.727	66.324	
Gorizia	2.301	786	4.324	2.079	721	3.643	2.091	715	3.933	2.091	715	3.933	
Udine	7.021	2.347	13.378	6.571	2.294	12.307	6.229	2.082	11.867	6.004	2.016	11.491	1.10
Trieste	5.797	1.855	9.646	4.986	1.808	9.402	4.785	1.532	7.966	3.780	1.199	6.235	1
Emilia-Venezia Giulia	15.119	4.988	27.348	13.636	4.823	25.451	13.105	4.329	23.766	11.875	3.930	21.659	2.4
Genova	14.846	4.460	24.531	13.753	5.058	26.807	14.885	4.472	24.596	9.559	3.226	17.741	
Imperia	1.713	539	3.018	1.512	474	2.512	1.036	326	1.826	795	258	1.111	
La Spezia	3.286	1.368	7.388	3.731	1.398	6.800	2.607	942	5.087	2.210	796	3.298	
Savona	2.493	847	4.573	2.372	776	4.113	2.222	788	4.255	1.780	649	3.505	
Liguria	22.738	7.214	39.510	21.368	7.706	40.232	20.750	6.528	35.764	14.344	4.929	26.991	
Bologna	12.540	4.161	22.054	11.852	4.195	20.950	12.209	4.052	21.475	11.376	3.807	20.171	
Ferrara	6.047	2.237	11.856	5.806	2.112	10.740	5.542	2.050	10.865	5.466	2.020	10.706	1.1
Forlì	4.859	1.776	9.412	5.024	1.854	9.455	5.099	1.865	9.884	5.060	1.853	9.821	1.1
Modena	5.322	1.877	10.323	4.905	1.825	9.130	4.788	1.689	9.259	4.205	1.491	8.201	1
Parma	3.271	1.108	6.094	3.186	1.144	5.943	3.193	1.082	5.951	3.156	1.071	5.900	
Piacenza	2.072	748	3.964	2.016	713	3.505	1.813	655	3.471	1.813	655	3.471	
Ravenna	3.278	1.140	6.041	3.198	1.130	5.765	3.283	1.142	6.053	3.041	1.066	5.900	
Reggio nell'Emilia	3.777	1.361	7.349	3.711	1.355	6.775	3.290	1.186	6.404	3.191	1.159	6.200	
Emilia-Romagna	41.166	14.408	77.093	39.698	14.328	72.328	39.217	13.721	73.362	37.308	13.122	70.173	

Segue: Tav. 29 — Attuazione del programma del 2° Settennio nelle varie fasi, per provincia, al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	PROGRAMMI			STANZIAMENTI			APPALTI			COSTRUZIONI ULTIME			ALLOGGI ASSEGNATI		
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	A riscatto	In locazione	TOTALE
Arezzo	2.107	828	4.305	2.107	823	4.526	2.010	791	4.113	1.991	781	4.061	392	396	788
Firenze	13.549	4.801	25.925	10.735	3.642	18.574	8.522	3.019	16.303	8.227	2.916	15.746	2.671	331	3.002
Grosseto	2.343	956	5.067	2.567	938	5.158	2.424	912	4.834	2.344	882	4.675	612	292	904
Livorno	4.675	1.788	9.298	4.596	1.766	9.536	4.601	1.761	9.157	4.272	1.639	8.523	1.463	486	1.949
Lucca	3.683	1.451	7.400	3.581	1.419	7.663	3.389	1.327	6.768	3.047	1.211	6.176	609	609	1.218
Massa-Carrara	2.175	738	4.132	2.164	751	3.831	2.216	752	4.221	2.216	752	4.221	551	201	752
Pisa	3.765	1.385	7.202	3.523	1.327	6.901	3.331	1.227	6.380	2.616	984	5.117	741	344	1.085
Pistoia	2.015	684	3.831	2.067	699	3.495	2.034	691	3.870	1.870	640	3.584	461	224	685
Siena	2.062	757	4.164	2.062	756	4.158	1.924	707	3.889	1.924	707	3.889	483	232	715
<i>Toscana</i>	36.574	13.388	71.324	33.402	12.121	63.842	30.451	11.187	59.535	28.507	10.512	55.992	7.983	3.115	11.098
Perugia	4.583	1.558	8.569	4.218	1.536	7.373	3.807	1.295	7.122	3.342	1.136	6.248	625	578	1.203
Termi	2.463	919	4.871	2.388	928	5.289	2.423	905	4.796	2.387	894	4.738	636	269	905
<i>Umbria</i>	7.046	2.477	13.440	6.606	2.464	12.662	6.230	2.200	11.918	5.729	2.030	10.986	1.261	847	2.108
Ancona	4.064	1.468	7.781	4.038	1.533	8.125	4.112	1.486	7.875	3.879	1.405	7.446	1.122	353	1.475
Ascoli Piceno	1.918	687	3.710	1.892	689	3.445	1.772	636	3.434	1.666	596	3.218	441	183	624
Macerata	1.561	547	3.009	1.528	547	2.899	1.609	565	3.107	1.507	533	2.932	299	266	565
Pesaro e Urbino	3.143	1.099	6.045	2.877	1.063	5.421	2.826	989	5.440	2.792	979	5.384	478	529	1.007
<i>Marche</i>	10.686	3.801	20.545	10.335	3.832	19.890	10.319	3.676	19.856	9.844	3.513	18.980	2.340	1.331	3.671
Frosinone	3.799	1.330	7.182	3.046	1.098	5.930	2.338	819	4.423	1.939	693	3.742	517	244	761
Latina	2.569	880	4.752	2.497	857	4.456	2.396	821	4.433	1.408	490	2.646	390	144	534
Rieti	1.277	437	2.448	1.281	450	2.520	1.149	394	2.206	1.027	347	1.943	232	138	370
Roma	45.411	14.347	80.343	42.020	15.349	82.884	39.003	12.324	62.014	32.733	10.398	58.229	10.704	681	11.385
Viterbo	1.417	498	14.588	1.216	441	2.471	1.181	415	9.407	1.047	365	2.117	277	88	365
<i>Lazio</i>	54.473	17.492	109.313	50.060	18.195	98.261	46.067	14.773	82.483	38.154	12.293	68.677	12.120	1.295	13.415

Segue: Tav. 29 — Attuazione del programma del 2° Settennio nelle varie fasi, per provincia, al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	PROGRAMMI			STANZIAMENTI			APPALTI			COSTRUZIONI ULTIME			ALLOGGI		
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	A riscatto	In locazi	
Campobasso	3.177	1.068	5.875	2.840	947	5.303	2.766	931	5.120	2.026	684	3.762	532	218	
Ghieti	3.314	1.161	6.269	3.497	1.228	6.140	2.797	981	5.298	2.289	805	4.347	551	298	
L'Aquila	3.493	1.162	6.042	3.307	1.198	6.290	3.339	1.112	5.782	3.156	1.061	5.517	736	351	
Pescara	2.929	988	5.533	2.575	941	4.798	2.416	816	4.570	2.384	807	4.519	582	234	
Teramo	1.324	448	2.330	1.022	365	2.044	1.004	340	1.768	607	217	1.128	248	86	
<i>Abruzzi e Molise</i>	14.237	4.827	26.049	13.241	4.679	24.584	12.322	4.180	22.538	10.462	3.574	19.273	2.649	1.187	
Avellino	4.598	1.572	8.646	6.477	2.106	12.004	4.122	1.395	7.673	2.769	962	5.291	674	351	
Benevento	2.653	848	4.749	4.255	1.252	7.512	2.481	794	4.446	1.880	608	3.405	367	268	
Caserta	7.391	2.467	14.062	7.166	2.372	13.283	5.657	1.889	10.767	4.021	1.385	7.894	804	749	
Napoli	50.315	16.288	94.471	46.722	15.037	83.703	44.975	14.558	84.436	35.006	11.460	66.468	9.923	1.768	
Salerno	11.944	4.103	22.977	10.897	3.611	18.844	10.046	3.452	19.331	8.205	2.856	15.994	1.948	1.002	
<i>Campania</i>	76.901	25.278	144.905	75.517	24.378	135.346	67.281	22.088	126.653	51.881	17.271	99.052	13.716	4.113	17
Bari	14.383	5.048	28.269	14.028	4.745	25.148	11.780	4.029	22.562	8.399	2.927	16.391	1.997	727	
Brindisi	4.021	1.500	7.650	3.794	1.469	7.786	3.769	1.406	7.171	3.348	1.252	6.385	848		
Foggia	9.010	3.337	17.686	7.419	2.724	14.710	6.854	2.539	13.457	6.699	2.489	13.191	1.706	711	
Leccé	10.854	3.934	21.244	9.377	3.352	17.767	8.545	3.098	16.729	7.130	2.629	14.197	1.517	1.211	
Taranto	6.544	2.498	12.740	5.605	2.038	11.210	4.621	1.765	9.002	3.735	1.433	7.308	1.083		
<i>Puglia</i>	44.812	16.317	87.589	40.223	14.328	76.621	35.569	12.837	68.921	29.311	10.730	57.472	7.151		
Matera	2.235	803	4.256	2.160	749	5.243	1.880	676	3.583	1.378	529	2.804	345		
Potenza	4.194	1.384	7.750	3.834	1.279	6.907	3.468	1.145	6.412	2.285	733	4.273	359		
<i>Basilicata</i>	6.429	2.187	12.006	5.994	2.028	12.150	5.348	1.821	9.995	3.663	1.262	7.077	904		

Segue: Tav. 29 — Attuazione del programma del 2° Settennio nelle varie fasi, per provincia, al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	PROGRAMMI			STANZIAMENTI			APPALTI			COSTRUZIONI ULTIME			ALLOGGI ASSEGNATI		
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	A riscatto	In locazione	TOTALE
Catanzaro	3.701	1.000	17.025	7.630	2.797	15.384	6.920	2.438	13.409	4.977	1.785	9.818	1.615	621	2.236
Cosenza	5.932	2.611	14.142	6.445	2.297	13.322	5.609	1.847	9.974	3.219	1.088	5.875	1.999	646	1.645
Reggio di Calabria	7.736	2.503	14.465	6.889	2.417	12.280	6.473	2.161	12.102	5.130	1.723	9.649	1.451	399	1.850
Calabria	24.459	6.208	15.635	21.364	7.411	40.986	19.002	6.446	35.485	13.326	4.596	25.342	4.065	1.666	5.731
Agrigento	4.044	1.480	7.992	3.215	1.164	6.281	2.935	1.075	5.805	2.255	837	4.520	503	246	749
Caltanissetta	4.565	1.252	6.702	2.734	952	5.046	2.248	790	4.266	1.546	565	3.051	445	229	674
Catania	10.004	3.501	21.072	3.933	2.983	15.213	7.148	2.361	13.930	5.109	1.703	10.048	1.113	368	1.481
Enna	2.609	910	3.000	2.624	887	4.968	2.245	757	4.239	1.141	419	2.346	248	122	370
Messina	3.790	2.719	17.129	5.917	2.080	11.232	4.363	1.350	8.505	2.043	627	3.950	1.320	264	1.584
Palermo	14.496	4.747	30.362	12.606	4.337	26.022	11.324	3.709	24.109	8.682	2.888	18.772	2.011	579	2.590
Ragusa	1.470	418	2.675	1.400	458	2.290	1.208	369	2.362	1.119	345	2.208	308	61	369
Siracusa	3.133	1.136	7.271	2.903	990	5.148	2.592	926	5.926	2.311	842	5.389	558	70	628
Trapani	3.529	1.143	6.744	3.213	1.076	5.810	3.190	1.034	6.101	2.762	911	5.375	818	199	1.017
Sardegna	12.476	17.174	105.581	13.754	14.927	82.010	37.253	12.371	75.243	26.968	9.137	55.659	7.324	2.138	9.462
Cagliari	9.117	3.013	17.203	8.264	2.966	16.016	8.541	2.928	16.120	7.502	2.522	14.375	1.609	860	2.469
Nuoro	2.203	705	4.301	1.701	553	3.207	1.582	507	3.093	1.305	429	2.617	279	195	474
Sassari	1.385	1.028	6.168	3.402	1.125	5.625	2.820	857	5.142	2.229	960	4.140	477	281	758
Sardegna	14.705	4.746	27.672	13.369	4.644	24.848	12.943	4.192	24.355	11.036	3.641	21.132	2.365	1.336	3.701
Centro - Nord	999.750	127.847	701.412	340.149	124.102	635.903	320.831	110.870	595.826	288.604	101.020	545.376	82.258	24.052	106.310
Sud - Isole	214.021	79.032	449.437	213.462	72.395	396.545	189.718	63.935	363.190	146.647	50.211	285.007	38.174	14.418	52.592
ITALIA	603.771	206.879	1.150.849	553.611	196.497	1.032.448	510.549	174.805	959.016	435.251	151.231	830.383	120.432	38.470	158.902

* Importo degli stanziamenti al netto di esonerative integrazioni.

Segue: Tav. 30 — Costruzioni aziendali del 1° Setteennio e del 2° Sette

CIRCOSCRIZIONI	PRIMO			
	Milioni			
Belluno	73	12	1	
Padova	268	15	225	
Rovigo	65			
Treviso	341	1		
Venezia	814			
Verona	213			
Vicenza	760	68	11	
<i>Veneto</i>	1.531	1.321		
Gorizia	182			
Udine	333	1		
Trieste				
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	515	280		
Genova	2.645	1		
Imperia	49			
La Spezia	232	124	1	
Savona	577		1	1
<i>Liguria</i>	3.497	1.224		
Bologna	479	261	29	
Ferrara	242	117		
Forlì	150	79		
Modena	118	61		
Parma	126	67		
Piacenza	111	62		
Ravenna	121	59		
Reggio nell'Emilia	105			
<i>Emilia-Romagna</i>	1.452		7	

Tav. 30 — Costruzioni aziendali del 1° Settennio e del 2° Settennio e costruzioni del piano Aggiuntivo - Stanziamenti al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	COSTRUZIONI AZIENDALI									COSTRUZIONI DEL PIANO AGGIUNTIVO		
	PRIMO SETTENNIO			SECONDO SETTENNIO			TOTALE 14 ANNI			Milioni	Alloggi	Vani
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani			
Alessandria	308	180	835	758	302	1.480	1.066	482	2.315	1.528	516	2.529
Avi	54	30	141	85	34	156	139	64	297	725	250	1.150
Cuneo	232	148	673	393	157	785	625	305	1.458	756	259	1.295
Novara	784	421	2.040	1.191	458	2.336	1.975	879	4.376	1.073	366	1.867
Orino	5 575	3.308	15.058	4.271	1.723	8.615	9.846	5.031	23.673	5.892	2.242	11.210
Vercelli	928	495	2.471	765	318	1.654	1.693	813	4.125	1.147	396	2.059
<i>Piemonte</i>	7 881	4.582	21.218	7.463	2.992	15.026	15.344	7.574	36.244	11.121	4.029	20.110
<i>Valle d'Aosta</i>	342	160	844	66	44	202	408	204	1.046	643	232	1.067
Bergamo	897	528	2.386	1.347	534	2.670	2.244	1.062	5.056	1.277	439	2.195
Brescia	1.464	875	4.342	1.310	508	2.743	2.774	1.383	7.085	2.857	1.022	5.519
Como	1.451	843	3.788	1.442	585	2.983	2.893	1.428	6.771	2.761	951	4.850
Cremona	189	114	515	363	191	917	552	305	1.432	789	261	1.253
Mantova	121	66	352	366	143	715	487	209	1.067	951	329	1.645
Milano	7.426	3.909	17.870	11.388	4.586	22.013	18.814	8.495	39.883	12.537	5.057	24.274
Pavia	413	238	1.099	251	106	509	664	344	1.608	1.015	335	1.608
Sondrio	103	62	267	270	103	494	373	165	761	420	131	628
Varese	934	536	2.425	1.028	416	1.997	1.962	952	4.422	2.258	764	3.667
<i>Lombardia</i>	12.998	7.171	33.044	17.765	7.172	35.041	30.763	14.343	68.085	24.865	9.289	45.639
Bolzano	340	173	847	453	151	785	793	324	1.632	1.342	434	2.257
Trento	122	74	363	234	92	478	356	166	841	377	108	562
<i>Trentino-Alto Adige</i>	462	247	1.210	687	243	1.263	1.149	490	2.473	1.719	542	2.819

Segue: Tav. 30 — Costruzioni aziendali del 1° Settennio e del 2° Settennio e costruzioni del piano Aggiuntivo - Stanziamenti al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	COSTRUZIONI AZIENDALI									
	PRIMO SETTENNIO			SECONDO SETTENNIO			TOTALE 14 ANNI			
	Millioni	Vani	Vanetti	Millioni	Vani	Vanetti	Millioni	Vani	Vanetti	Millioni
Belluno	73	12	194	146	50	296	219	100	100	100
Padova	263	155	775	377	150	795	64	305	75	100
Rovigo	65	32	168	115	43	229	180	87	27	100
Treviso	311	176	922	398	153	790	709	334	100	100
Venezia	344	184	2.100	2.340	897	4.664	1.113	1.541	1.704	1.541
Verona	213	93	551	263	105	525	476	199	100	100
Vicenza	760	363	2.110	728	290	1.569	1.488	663	1.670	1.488
Veneto	2.534	1.321	6.850	4.367	1.705	6.868	6.901	3.030	3.711	3.030
Gorizia	132	90	455	226	96	450	408	100	914	100
Udine	433	190	930	306	120	648	639	110	1.578	100
Trieste				1.107	411	2.137	1.107	411	2.137	1.107
Friuli-Venezia Giulia	515	280	1.385	1.639	627	2.211	2.154	600	4.629	1.639
Genova	2.645	1.300	6.687	4.217	1.660	7.98	6.862	2.960	15.485	4.334
Imperia	49	24	120	60	24	127	109	43	247	413
La Spezia	232	124	601	250	100	490	482	244	1.091	1.126
Savona	571	294	1.491	831	222	1.177	1.402	516	2.668	1.000
Liguria	3.497	1.742	8.199	5.358	2.006	10.592	8.855	3.748	19.491	6.650
Bologna	479	261	1.297	857	490	2.450	1.336	751	3.747	3.690
Ferrara	242	117	606	583	224	1.142	825	341	1.745	1.343
Forlì	150	79	383	301	124	632	451	203	1.015	1.250
Modena	118	61	304	222	84	420	340	145	724	1.002
Parma	126	67	323	373	146	759	499	213	1.082	1.193
Piacenza	111	62	279	365	117	585	476	179	764	751
Ravenna	121	59	304	255	101	515	376	160	1.19	1.072
Reggio nell'Emilia	105	53	262	300	84	420	405	137	600	1.000
Emilia-Romagna	1.452	759	3.758	3.256	1.370	6.923	4.708	2.129	10.600	12.415

Segue: Tav. 30 — Costruzioni aziendali del 1° Settennio e del 2° Settennio e costruzioni del piano Aggiuntivo - Stanziamenti al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	COSTRUZIONI AZIENDALI						COSTRUZIONI DEL PIANO AGGIUNTIVO					
	PRIMO SETTENNIO			SECONDO SETTENNIO			TOTALE 14 ANNI					
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani
Verona	509	33	26	172	1	374	271	121	642	514	176	7 252
Lecco	771	179	1 944	1 217	1	514	2 018	872	4 458	4 992	1 422	62
Grugliasco	422	160	2 211	1 011	284	1 562	953	444	2 383	519	175	62
Legnano	367	140	2 241	1 011	421	2 273	1 970	861	4 514	844	29	373
Monza	42	20	110	232	93	502	274	113	612	215	69	208
Milano-Castella	112	37	279	141	166	847	513	223	1 126	683	208	2
Brescia	210	126	630	525	239	1 243	743	365	1 873	729	238	225
Padova	12	6	30	26	8	40	32	14	70	784	245	1
Napoli	33	26	110	328	136	748	383	162	887	502	162	1
Torino	2 518	1 267	6 462	1 639	1 40	10 103	7 157	3 175	16 565	9 782	2 15	5 55
Parma	119	13	421	114	56	269	263	119	590	891	275	320
Reggio	203	100	432	173	69	393	466	235	1 225	627	20	17
Como	412	229	1 153	317	125	662	729	354	1 815	1 518	481	2 1
Arezzo	301	148	774	124	50	265	433	198	1 038	1 221	429	2 274
Assisi	17	26	155	92	37	135	149	66	340	603	184	20
Assisi-Roma	2	12	48	55	22	117	75	34	165	306	153	1
Modena	64	32	161	205	2	130	269	114	579	67	212	1
Perugia e Umbria	446	221	1 157	430	141	985	926	412	2 122	1 606	978	5 1
Macerata	12	30	150	110	44	248	172	74	398	579	169	1
Imperia	10	1	33	31	12	62	41	18	5	100	264	1 27
La Spezia	17	36	181	70	26	157	127	64	348	442	144	78
Rimini	304	1 01	9 691	7 431	2 951	15 935	11 335	4 399	25 626	21 112	7 493	10 362
Ravenna	110	56	296	96	36	202	200	94	566	510	161	302
Verona	4 343	2 648	10 451	7 742	1 671	16 594	11 875	5 119	26 947	24 223	3 221	44 400

Segue: Tav. 30 — Costruzioni aziendali del 1° Settennio e del 2° Settennio e costruzioni del piano Aggiuntivo - Stanziamenti al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	COSTRUZIONI AZIENDALI									COSTRUZIONI DEL PIANO AGGIUNTIVO		
	PRIMO SETTENNIO			SECONDO SETTENNIO			TOTALE 14 ANNI					
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani
Campobasso	35	18	96	70	2	157	105	46	253	987	299	1.674
Chieti	26	13	65	25	1	50	51	23	115	895	260	1.300
L'Aquila	10	6	30	77	3	164	87	37	194	1.028	315	1.620
Pescara	133	70	339	182	6	331	315	135	670	733	242	1.234
Teramo	—	—	—	86	3	190	86	34	190	326	100	560
<i>Abruzzi e Molise</i>	204	107	530	440	16	892	644	275	1.422	3.969	1.216	6.388
Avellino	31	18	90	85	3	199	116	53	289	985	279	1.590
Benevento	53	34	170	20	6	384	75	98	554	564	169	1.014
Caserta	144	60	331	155	7	420	299	135	751	1.382	405	2.268
Napoli	2.501	1.228	6.415	3.849	1.61	8.882	6.350	2.843	15.297	18.492	5.901	32.456
Salerno	201	111	522	151	6	336	352	172	858	1.402	394	2.167
<i>Campania</i>	2.932	1.451	7.528	4.260	1.85	10.221	7.192	3.301	17.749	22.825	7.148	39.495
Bar	307	151	795	480	19	1.018	787	343	1.813	2.537	758	4.017
Brindisi	29	14	74	70	3	159	99	44	233	494	156	827
Foggia	176	92	450	103	4	216	279	132	666	1.300	384	2.074
Lecce	44	18	102	155	6	329	199	80	431	1.668	455	2.412
Taranto	37	18	94	140	5	308	177	74	402	1.026	297	1.634
<i>Puglia</i>	593	293	1.515	948	38	2.030	1.541	673	3.545	7.025	2.050	10.964
Matera	47	22	116	20	3	56	67	30	172	455	127	889
Potenza	56	30	165	70	2	151	126	58	316	962	294	1.588
<i>Basilicata</i>	103	52	281	90	3	207	193	88	488	1.417	421	2.477

anio e costruzioni del piano Aggiuntivo - Stanziamenti al 31 dicembre 1962

ANNO			COSTRUZIONI DEL PIANO AGGIUNTIVO			
TOTALE 14 ANNI						
Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani
157	105	45	253	917	299	1 074
50	51	23	115	105	260	1 090
164	87	37	194	1 025	315	1 020
141	115	135	670	733	232	1 234
199	66	34	190	526	100	590
892	644	275	1 422	3 969	1 216	6 135
199	116	53	289	965	279	1 500
344	77	94	354	564	169	1 014
419	279	135	751	1 502	405	2 205
8 302	6 370	2 843	15 297	18 492	5 901	32 376
336	352	172	853	1 492	344	2 167
19 221	7 192	3 301	17 749	22 825	7 148	39 497
1 018	707	343	1 813	2 537	758	4 617
179	29	44	213	494	156	1 127
216	279	132	666	1 300	384	2 073
329	124	89	431	1 668	455	2 412
308	177	74	402	1 026	297	1 631
2 030	1 541	673	3 545	7 025	2 050	10 964
56	67	30	172	455	127	1 159
151	126	58	316	962	294	1 588
207	193	88	488	1 417	421	2 477

NELLA FOTO:

Si avrà cura di pensare i tipi edilizi in modo tale che
spezzata, oppure usati anche isolatamente articolando la compo-
continui che sfalsati, e variando opportunamente il numero dei
norme per la progettazione urbanistica - Fasc. n. 2, pag. 24
Napoli - Complesso residenziale « La Loggia » - Progett.

Segue Tav. 30 — Costruzioni aziendali del 1° Settennio e del 2° Settennio e costruzioni del piano Aggiuntivo - Stanziamenti al 31 dicembre 1962

CIRCOSCRIZIONI	COSTRUZIONI AZIENDALI						COSTRUZIONI DEL PIANO AGGIUNTIVO					
	PRIMO SETTENNIO			SECONDO SETTENNIO			TOTALE 14 ANNI					
	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani	Milioni	Alloggi	Vani
Catanzaro	220	113	566	200	80	440	420	193	1.006	2.149	655	3.603
Cosenza	51	26	130	370	138	858	421	174	988	2.181	599	3.474
Reggio di Calabria	136	70	352	123	50	265	259	120	617	1.554	465	2.465
Calabria	407	209	1.048	693	270	1.563	1.100	487	2.611	5.884	1.719	9.542
Agrigento	49	30	150	102	11	217	151	71	367	670	197	1.064
Caltanissetta	33	18	240	135	11	286	218	102	526	845	245	1.299
Catania	113	54	312	160	60	306	273	114	618	2.328	654	3.335
Enna	43	18	106	—	—	—	43	18	106	623	176	986
Messina	103	54	299	75	30	162	183	84	461	1.982	571	3.083
Palermo	327	152	817	215	85	510	542	237	1.327	3.471	966	5.796
Ragusa	35	16	83	40	16	80	75	32	163	794	222	1.110
Siracusa	57	18	90	215	86	447	252	104	537	1.376	406	2.112
Trapani	69	36	180	75	49	265	144	85	445	1.047	311	1.679
Siracusa	1.64	426	2.277	1.017	421	2.273	1.881	847	4.550	13.136	3.748	20.464
Cagliari	709	349	1.328	615	271	1.463	1.324	620	3.291	2.595	840	4.536
Nuoro	—	—	—	95	38	220	95	38	220	422	119	690
Sassari	24	12	66	85	34	170	109	46	236	931	279	1.395
Sardegna	733	361	1.894	795	343	1.853	1.528	704	3.747	3.948	1.238	6.621
Centro - Nord	17.200	20.027	96.313	53.769	21.452	109.503	90.969	41.479	205.816	107.097	36.949	189.545
Sud - Isole	5.836	2.899	15.073	8.243	3.476	19.039	14.079	6.375	34.112	58.204	17.540	95.951
ITALIA	43.036	22.926	111.386	62.012	24.928	128.542	105.048	47.854	239.928	165.301	54.489	285.496

Il volto delle nuove case

documentazione sulla progettazione architettonica
ed urbanistica dell'INACASA

A introdurre il lettore nella seguente rassegna illustrativa delle costruzioni INACASA, potrà riuscire utile un richiamo sintetico che inquadri a grandi linee quella che fu l'impostazione urbanistica e edilizia del Piano. Il materiale qui raccolto costituisce un panorama solo parziale e sommario delle realizzazioni di quattordici anni (e non sminuisce quindi il valore delle opere per necessità non illustrate); tuttavia sarà sufficiente a dimostrare come una vasta gamma di forme urbanistiche sia andata via via perfezionandosi col passare del tempo, alla ricerca di un carattere stilistico sempre più decisamente italiano. Al di fuori di qualsiasi influenza esterna, che potesse alterare le linee tipiche del nostro paesaggio urbano e rurale, gli architetti del Piano, mentre hanno maturato il frutto di quella tradizione che diede alle nostre città il loro volto caratteristico, hanno però interpretato questa tradizione attraverso la ricerca di nuove soluzioni, valide anche da un punto di vista generale di articolazione urbanistica e di proporzionamento dei servizi.

Nel corso d'attuazione della Legge istitutiva (la quale prevedeva la costruzione di edifici popolari inseriti per singoli lotti nelle maglie dei Piani Regolatori), apparve necessaria, agli Organi del Piano, una impostazione ex-novo di tutto il problema, che consentisse di realizzare complessi organici e coordinati sempre più vasti.

In un primo periodo le difficoltà furono ardue, soprattutto perché non era ancor stato definito con chiarezza il grado di differenziazione della tipologia urbanistica. In seguito, a mano a mano che veniva maturando la caratterizzazione della scala urbanistica, i progetti furono dimensionati secondo uno schema teorico, che era vincolato dall'entità dei finanziamenti concessi alle singole località.

Alla prova dei fatti, tale schema risultò sostanzialmente il più valido per un concreto inserimento delle nuove costruzioni nei tessuti urbani. Ciò avvenne secondo un criterio di gradualità: partendo dal nucleo edilizio, si passava alla « unità di abitazione » (meglio individuabile, attualmente, come « unità di quartiere » o « unità urbana »), concepita come un raggruppamento edilizio autosufficiente di 1500 abitanti in media, con un'attrezzatura

di servizi di prima necessità, quali scuola materna e Centro Sociale. Infine, si giungeva al « quartiere residenziale » o « complesso residenziale » inteso come un raggruppamento urbano di un minimo di 5.000 abitanti, dei relativi servizi primari (sotto forma di più unità associate) e dei servizi collettivi di quartiere, che costituivano il nucleo base del complesso: gruppo scolastico, scuola materna ed elementare, gruppo parrocchiale, gruppi di negozi, aree per il gioco dei bambini, Centro Sociale. Questi servizi di base furono integrati da altri a carattere sociale, quali ambulatori, centri sportivi, centri commerciali, delegazioni comunali, uffici di polizia e carabinieri ecc.

Altro elemento determinante per la caratterizzazione dei complessi INACASA è il tessuto edilizio cittadino in senza dubbio l'adozione dei limiti massimi di densità per la popolazione, dai 500 abitanti per ettaro nel Primo Settennio, ai 300 del Secondo Settennio salvo qualche caso di complessi inseriti entro Piani Regolatori particolareggiati.

Infine, va sottolineata l'evoluzione che si osserva lungo l'arco dei due Settenni nelle soluzioni planimetriche urbanistiche ed edilizie, evoluzione diretta a una ricerca formale e spaziale, e al tempo stesso a una maggiore organicità d'impostazione, ottenuta seguendo direttive differenti di studio. Tali direttive però convergono tutte in una ricerca di forme e caratteristiche che rispettano la tradizione delle nostre città. Infatti dall'esame dei grafici realizzati nei quattordici anni del Piano si potrà constatare come i vari progetti siano stati impostati, pur nel rispetto delle norme generali, con criteri completamente diversi, giungendo di volta in volta a soluzioni dalla chiara impostazione razionale, romantica, geometrica. Tuttavia un principio comune ha sempre guidato i progettisti: il rispetto del paesaggio, affinché sia la città veduta che il grande complesso non risultassero avulsi dalla natura circostante, ma in essa armoniosamente inseriti.

Avvertenza

Il materiale illustrativo è stato ordinato in funzione della scala urbanistica adottata dall'INACASA. Dall'esame dei grandi complessi residenziali si scende alle unità di abitazione, e infine ai piccoli nuclei edilizi ed alle unità edilizie. Alcuni complessi intermedi fra quartiere e unità d'abitazione, posti in zone di espansione delle città, sono stati inseriti fra i grandi complessi residenziali, poiché in essi fu adottata, almeno in parte, l'attrezzatura dei quartieri veri e propri. Nell'interno delle divisioni suddette, il materiale si troverà ordinato per provincia, secondo l'ordine alfabetico.

Le scale metriche dei grafici, generalmente adottate, sono le seguenti:

Planimetrie: rapporti 1 : 4000 — 1 : 2000

Piante: rapporti 1 : 400

A proposito della « scala urbanistica » dei quartieri residenziali, dei complessi e delle unità d'abitazione, si veda, a pag. 439 un estratto riprodotto da uno studio del compianto Arch. Adalberto Libera.

Esempi di complessi residenziali da pag. 172 a pag. 285

Esempi di unità di abitazione da pag. 286 a pag. 349

Esempi di nuclei ed unità edilizie da pag. 350 a pag. 397

Complesso residenziale «Borgo Panigale»

Settennio I

Il complesso sorge su un'area di 11 ha. circa, dove la via Emilia Ponente, che, allargandosi a partire dal centro storico, è percorsa un'ampia strada di penetrazione, si incontra alla periferia della città. La strada, di circa 200 m. a nord dell'Emilia, è il punto di partenza di una serie di strade che si diramano verso ovest. I pubblici servizi sono concentrati in un unico edificio a tre piani che funge da nucleo centrale. Gli edifici sono concentrati in due gruppi: uno a tre piani e uno a due piani. Gli edifici sono concentrati in due gruppi: uno a tre piani e uno a due piani. Gli edifici sono concentrati in due gruppi: uno a tre piani e uno a due piani.



PROGETTISTI

Casati G.
Legnani A.
Santini F.
Vaccaro G.
Umberto



1. Planimetria generale - 2. Veduta piazzale principale - 3. Veduta degli edifici ad H - 4. Pianta piano tipo e schema di copertura degli edifici ad H - 5. 6. Pianta e prospetti delle schiere - 7. Veduta della scuola materna realizzata dal Comune.

BOLOGNA

Complesso residenziale « via Cavedone »

Settennio II


L'area di ha. 20 su cui sorge il quartiere è incluso nel P. R. P. Il terreno è pianeggiante e ubicato nella zona di espansione della città.

L'intero quartiere di 5164 vani pari a 968 alloggi è impostato su una edilizia che si può definire a « corte attrezzata ». La corte è delimitata volumetricamente da quattro fabbricati lineari a tre piani.

Lo spazio libero interno è riservato agli abitanti della corte, opportunamente suddiviso in relazione alle varie attività degli adulti e dei ragazzi. Il tipo edilizio è semplificato al massimo e la planimetria dei fabbricati è impostata modularmente in modo da unificare il più possibile gli elementi costruttivi.

Il quartiere si distingue inoltre per uno studio accuratissimo del progetto in funzione della organizzazione del cantiere, per la revisione di alcune opere di finitura e impianti unificati e prefabbricati generali per l'intero quartiere, per l'esecuzione di appalti scorporati con conseguenti economie sulle forniture.


Il complesso è dotato di scuola elementare, scuola materna, centro sociale, Chiesa, edificio commerciale, mercato.

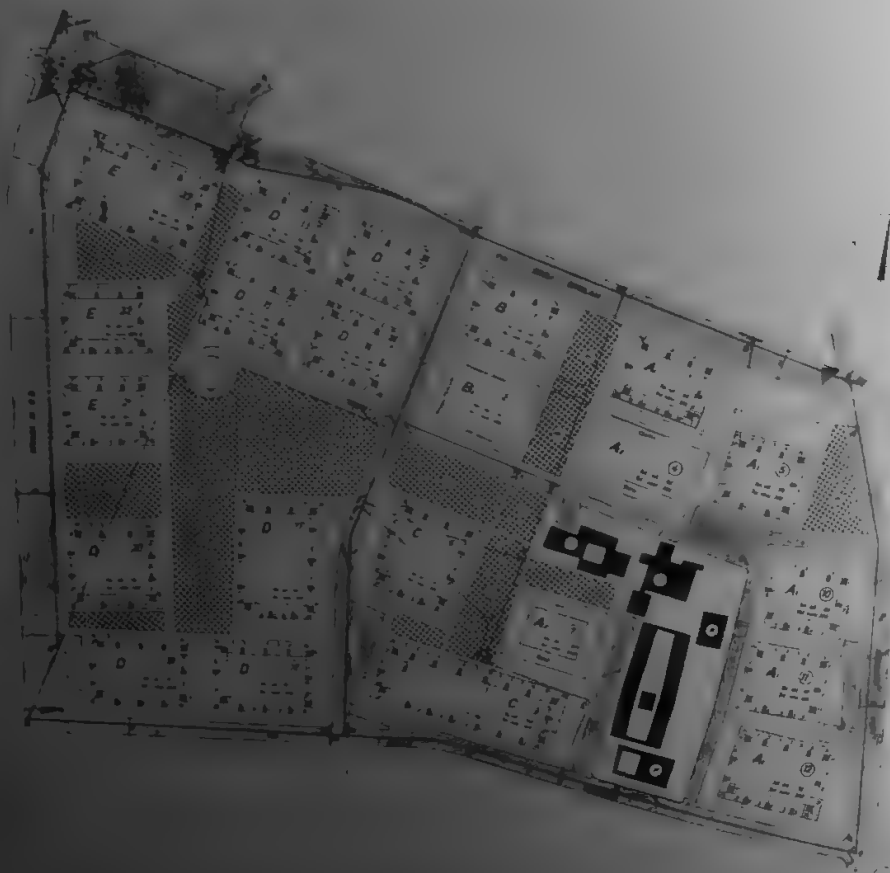

PROGETTISTI

Gorzi F.
Capogrossi
Bazzani L.
Carini M.
Cazzucchi
Danzon S.
Durante A.
Esposito A.
Vittoria M.








2



3

1. Planimetria generale - 2, 3. Tipo di corte -
Pianta tipo e prospetti - Veduta dall'esterno -





4

5

6





4. Alloggi tipo a
5, 6, 7 vani -
Particolari dei
 prospetti - 5. So-
luzione d'angolo
- Particolari dei
 prospetti - 6. In-
terno della corte
- 7.8. Passaggio
fra due corti -
Veduta esterna
del complesso -
9. Particolari del-
le sistemazioni
esterne delle corti
- Dettagli archi-
tettonici e parti-
colari costruttivi
- 10. Particolare
architettonico



10



8

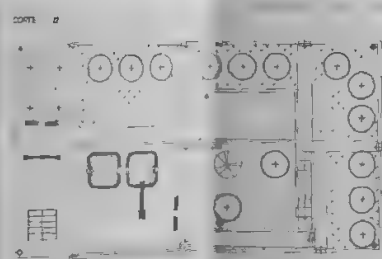




11







12





13

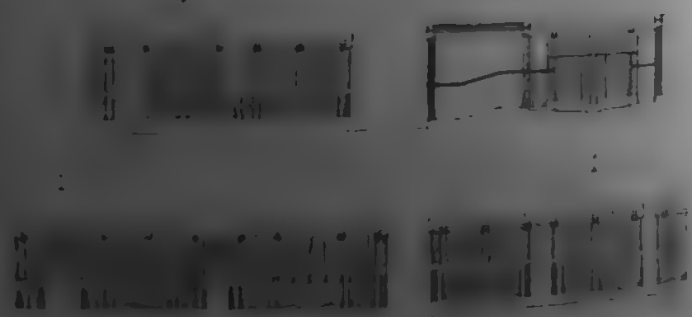

11, 12, 13. Opere
parrocchiali rea-
lizzazione della
Curia - 14. Scuo-
la elementare (a
cura del Comune)
piano piano terra
- prospetto - se-
zione - 15. Scuo-
la materna (a cu-
ra del Comune)
- 16. Centro so-
ciale - prospetto
e sezione - piano
piano terra, pian-
ta primo piano.

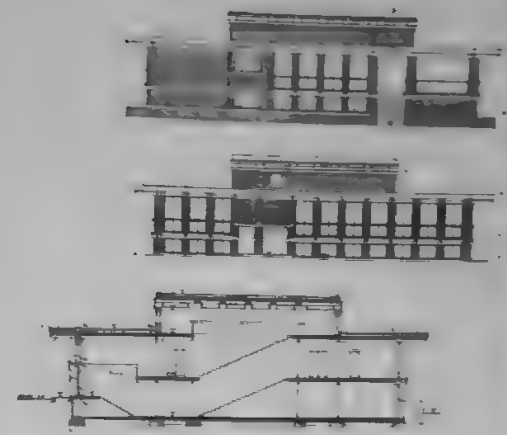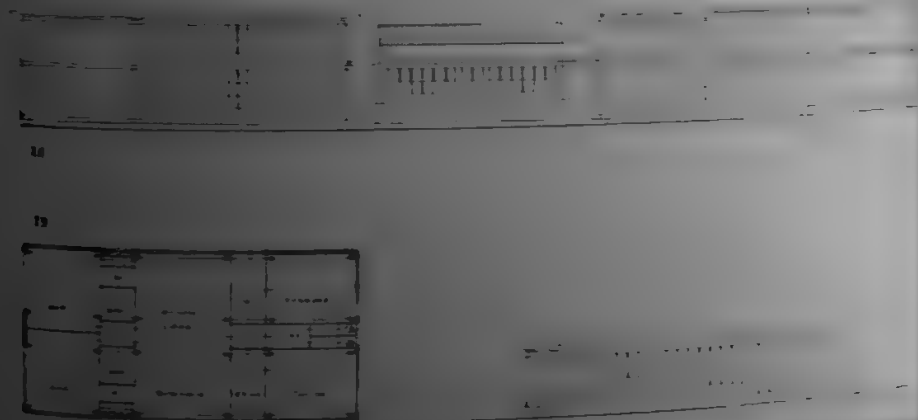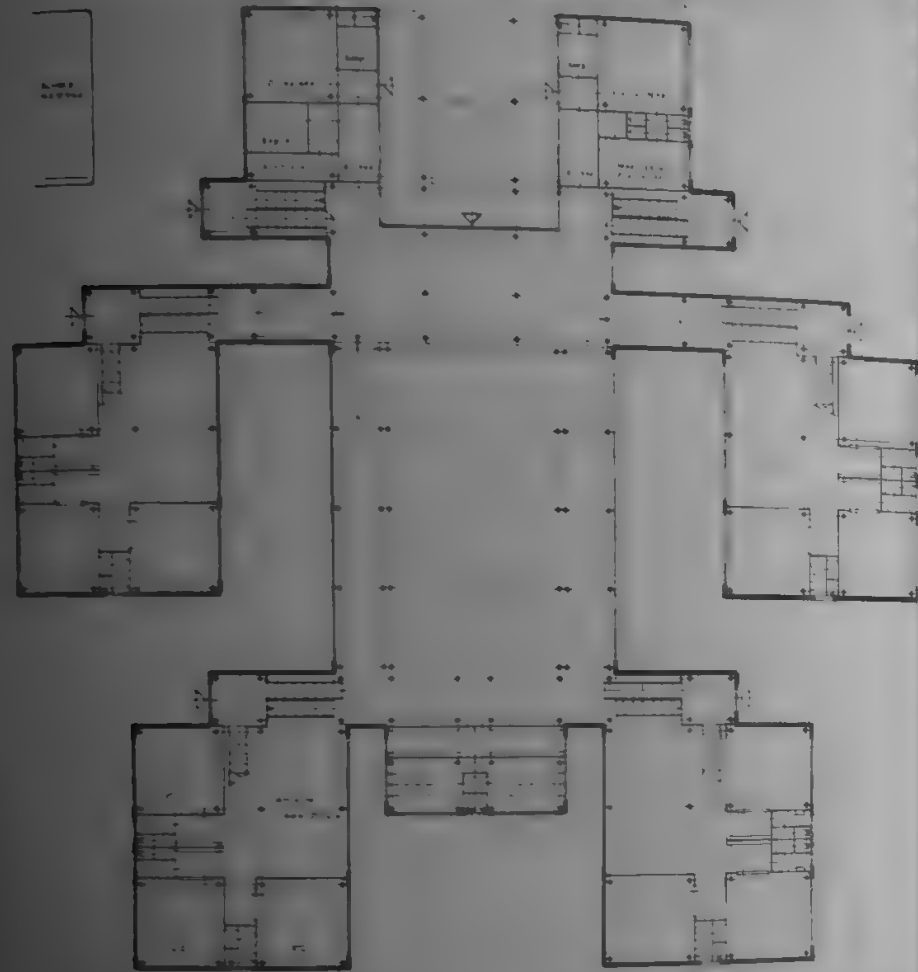

16

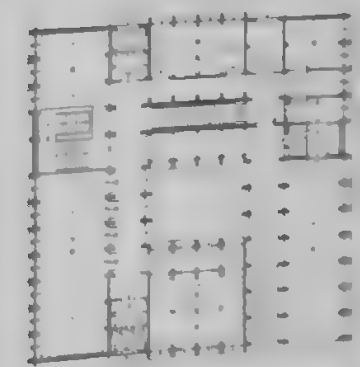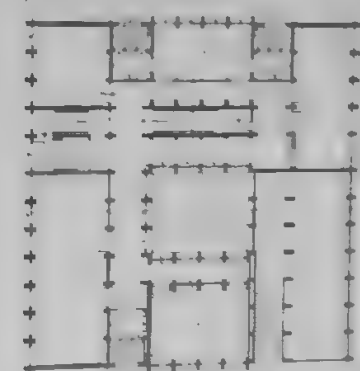

Complesso residenziale « S. Donato »

Settembre 11

Il quartiere sorge su un'area pianeggiante di circa 10 ettari, a km 1,5 circa dal centro ed è collegato alla città dalla via S. Donato. L'area è stata scelta per la sua inserita in un tessuto urbano privo però di servizi essenziali. Il quartiere perciò assolve a funzione fondamentale di « centro servizi » della zona. La rete viaria è costituita da una strada principale che attraversa il quartiere prevista dal P.R. adottata senza alcuna variante, dalla piazza principale e da una piazza di servizio.

I fabbricati destinati a servizi (scuola, chiesa, centro culturale, ecc.) sono situati nel nucleo; si è preferito invece caratterizzare le strade con edifici a nuovo, con portici e forniti di un notevole numero di negozi e punti vendita. I servizi amministrativi sono sulla strada principale. La piazza principale è caratterizzata da una piazza pubblica.


I fabbricati sono affacciati su grandi spazi aperti, tutti a verde, caratterizzati volta per volta da particolari funzioni. Oltre ai servizi citati sono previsti: una scuola materna e l'asilo nido, una chiesa, un centro culturale, un centro sportivo, un centro di servizi. Il complesso è composto di 2400 var.

PROGETTISTI:

Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia



1. Planimetria generale - 2. Veduta aerea verso Sud - 3. Pianta piano tipo dell'edificio in linea e due soluzioni di prospetto relative - 4. Veduta di una strada interna - 5. Pianta piano tipo di un edificio a torre - 6. Veduta degli edifici porticati lungo una strada interna - 7. Schema e particolari costruttivi - 8. Profili urbanistici.

OGGETTISTI:
 operanti a Ar-
 stetti e Inge-
 neri di Reggio
 Emilia

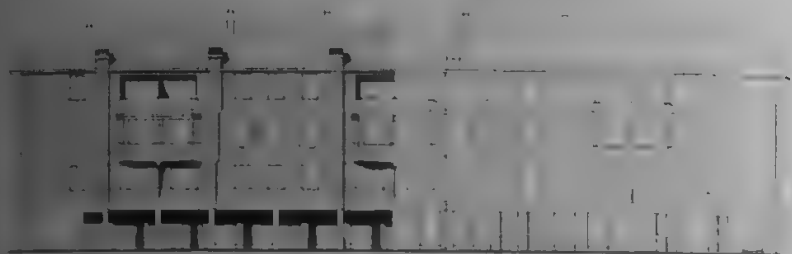

6

7

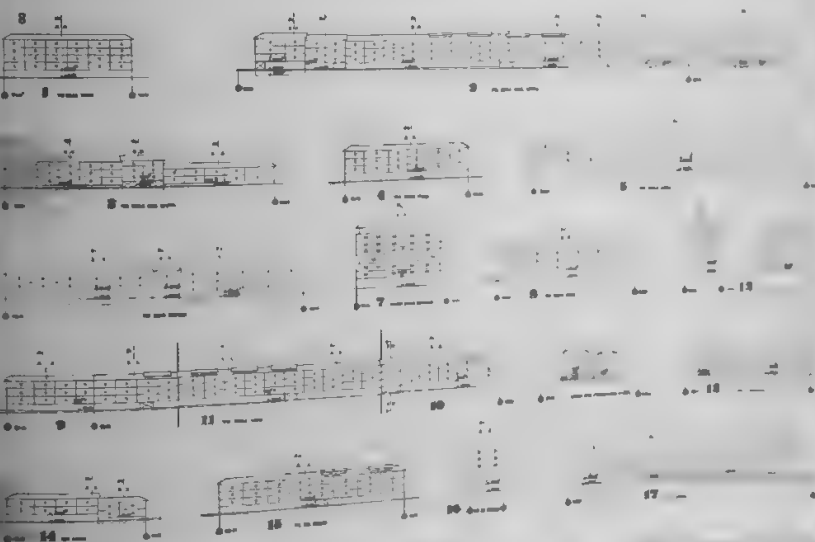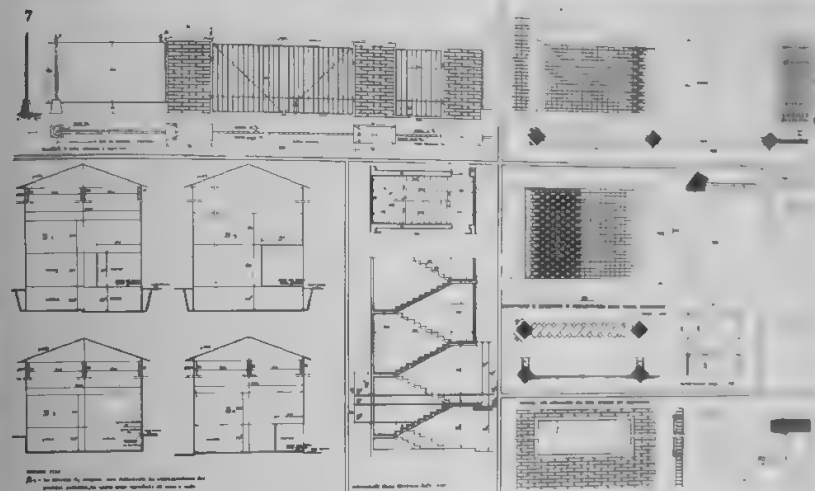

Complesso residenziale « Bingia Pernis »
Settimane 11


Section II

L'area di Borgia Petrus di In ha molta lambuta a nord da un sistema stradale che la collega alla zona industriale compresa tra le vie di S. Giulio e S. Carlo. Per la sua posizione, la caratteristica del complesso, che comprende 741 alloggi per 1.713 abitanti, sta nel fatto che è costruita al massimo che le strade e gli spazi verdi vengono orientati a direzione N-S-E per sfruttare il vento dominante di maestrale spesso assai forte. E' un caso di scelta del vento dominante per la scelta del luogo di tenere per le gradazioni per i passeggeri. Al fine di ottenere la massima protezione del riparo del sole durante l'anno per gli ospiti, i padiglioni per la sosta dei passeggeri sono disposti in modo che, in caso di forte vento, possano essere chiusi per adattare di volta in volta per seguendo la propria attività industriale hanno mantenuto attitudini agricole per antica tradizione.

La Chiesa ha quindi commercializzato quella struttura di centro sociale più esposta, facendone un centro di
un grande vaso di pompieri e unghie, alla stessa tempo a tirare, a ripulire da quella di...
tipicamente abducati, rispetto alla zona commerciale.




22



3

[illegible]

3

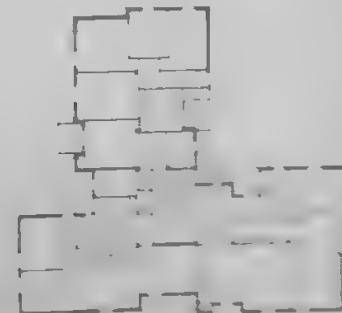

Complesso residenziale «Zia Lisa I»

Settembre '11

L'area di 21 ha è situata nel settore nord occidentale della città, ed è attualmente collegata ad essa da una strada a traffico veicolare.


Da questa area partono due strade carrabili tangenti al confine orientale e occidentale dell'area. Le strade di penetrazione residenziale assicurano a tutti gli alloggi un accesso carrabile diretto.

Nella parte alta del terreno, il quale esistente ha costituito un elemento determinante per la scelta della posizione del centro del quartiere. Gli edifici pubblici sono: la Chiesa parrocchiale, la scuola elementare, la scuola materna, l'aula per il centro sociale e due mercati.


I tipi edilizi previsti sono: la casa a due piani a schiera con orto e la casa in linea a 4 piani per complessivi 1.400 alloggi e 7.000 vani. I progetti illustrati sono quelli realizzati dal gruppo Valori.

PROGETTISTI

Valori M.
Capogruppo comitato
Braschi A.
Cervino G.
Carofalo G.
Rofondi G.
H.
R.
Capogruppo
G.
Cotterelli F.
R.
Magni A.
G.
G.
Capogruppo
Condorelli G.
Pristera G.
Pristera S.
D'Agata P.
Priolo M.
Capogruppo
Bertan G.
Boccardo S.
Drugo A.
Rubino D.
Toden M.



2


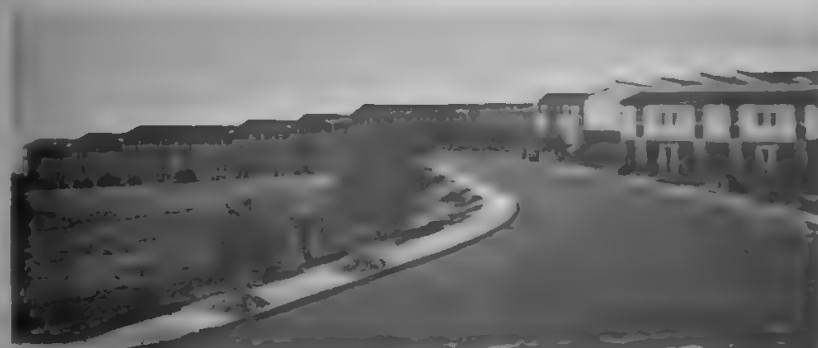


3



4

Planimetria generale - 2. Prospetti lungo l'asse del quartiere - 3. Vedute d'insieme - 4. Pianta e prospetto degli edifici in linea.

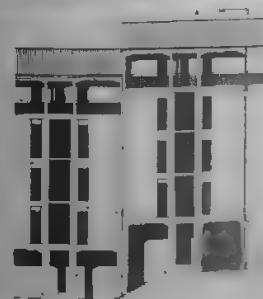

Complesso residenziale «Barco»

Settennio II

L'area di ha. 16 destinata al complesso posta nella zona Barco, a nord-ovest di Ferrara, completamente pianeggiante, è collegata alla città di Ferrara dalla Statale n. 16 Bologna-Venezia e dallo stradone Bertoni, cui ad essa tangenziale in massima parte. Questa strada ed una spina prevista quasi ortogonale ad essa hanno determinato la sistemazione urbanistica del quartiere. Infatti su questo elemento di spina si sviluppano gruppi di edifici racchiusi intorno a spazi verdi concepiti non come «cortili» chiusi, ma come volumi aperti. Pertanto gli edifici quasi tutti in corteo sono disposti intorno alle zone verdi, mentre si è cercato di differenziare i singoli edifici e di denominare i singoli appartamenti. I servizi generali del quartiere comprendono: centro sociale, scuola elementare, mercato, scuola materna, Chiesa, cinema e centro commerciale, tutti disposti lungo la spina centrale del complesso, che prevede 1410 vani in 658 alloggi.


PROGETTISTI

Giordani P. L.
Caporaso
Cassi S.
Laghi P.
Cassio
Loreti G.
Ghe P.
-giam A.



1


1. Planimetria generale - 2. Veduta di un gruppo di edifici - 3. Particolare di un edificio verso l'ingresso - 4. 5. Sezione planimetrica e prospetti di un ambiente-giardino - 6. Pianta piano tipo e prospetto sull'ingresso di un edificio continuo a catena - 7. Veduta di un ambiente-giardino - 8. Dettaglio architettonico

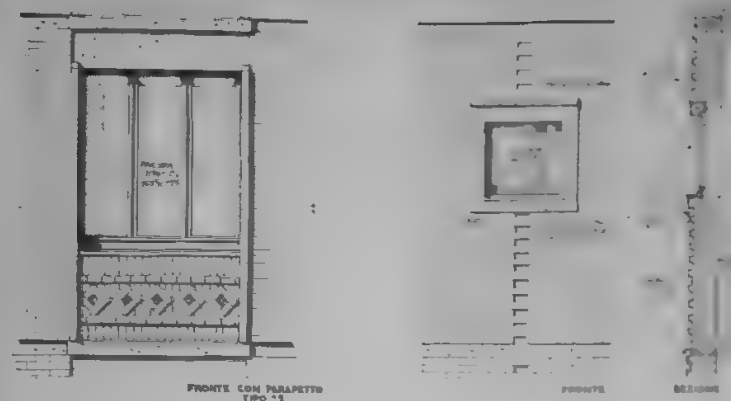

FRONTE CON PARAPETTO TIPO 1

FRONTE


SEZIONE



PARAPETTO TIPO 2
FINESTRA TIPO A TRE ANTE

SEZIONE

FINESTRA TIPO B
BAGNO

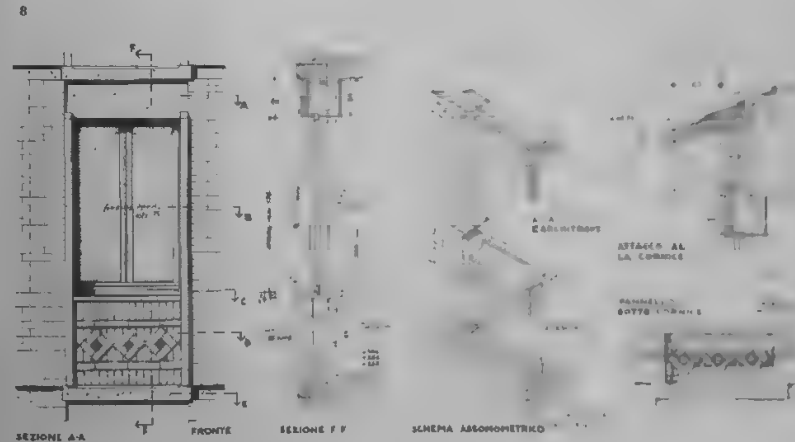


SEZIONE A-A

FRONTE

SEZIONE F-F

SCHEMA ASSONOMETRICO



SEZIONE C-C



SEZIONE D-D



SEZIONE E-E



FINESTRA TIPO ATTACCA ALLA CORONA - PANNELLI


[illegible]

Complesso residenziale «Barco»

Settembre 11



Il sito di via IV Novembre è destinato al complesso posto nella zona Barco, a nord-ovest di Ferrara, completamente pianeggiante, e delimitato dalla via IV Novembre, dalla Strada 16 Bologna-Venezia e dallo stradone Benivoglio. L'area è circondata da edifici esistenti. Questo complesso di edifici è previsto quasi ortogonale ad essa hanno dimensioni di 100 metri di lunghezza e di 100 metri di larghezza. L'area su questo elemento di spina si sviluppano gruppi di edifici a tre piani, con corti chiuse, ma come volumi aperti. Per questo complesso sono previste alcune zone verdi, mentre si è cercato di differenziare i volumi edili in base alla loro destinazione d'uso.

L'insieme generale del complesso è organizzato in modo elementare, mercato, scuola materna, Chiesa, sono disposti tutti disposti lungo la spina centrale del complesso, che prevede

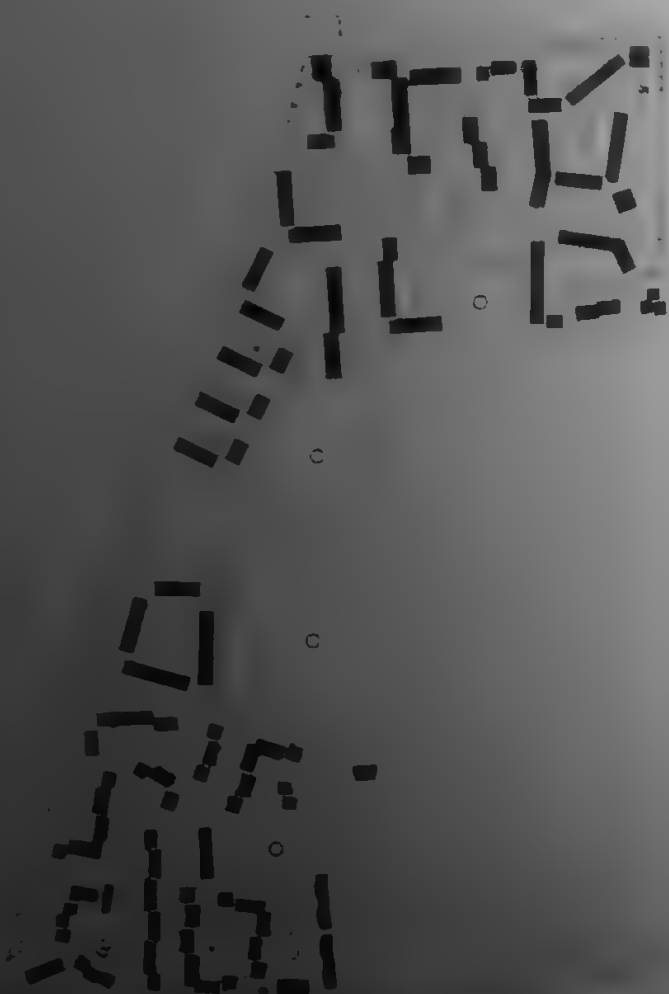

Archit.
Lec.
Lec.
Lec.
Lec.


1. Planimetria generale - 2. Veduta di un gruppo di edifici - 3. Particolare di un edificio verso l'ingresso - 4, 5. Sezione planimetrica e prospetto di un ambiente-giardino - 6. Pianta piano tipo e prospetto sull'ingresso di un edificio continuo a catena - 7. Veduta di un ambiente-giardino - 8. Dettagli architettonici.

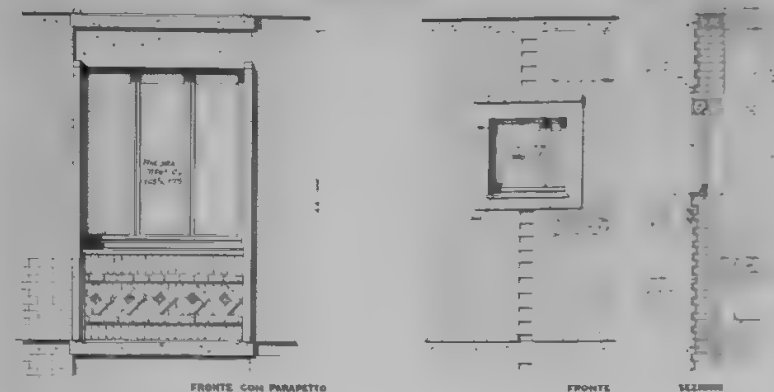

PARAPETTO TIPO 2.
FINESTRA TIPO A TRE ANTE

SEZIONE

BAGNO

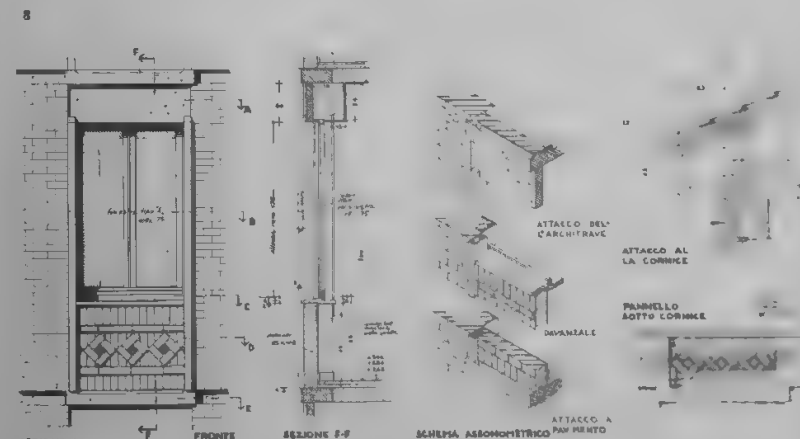

ATTACCO DEL C'ARCHITAVE


ATTACCO AL LA CORNICE

PANNELLO SOTTO CORNICE

DEVIANTE

ATTACCO A

SCHEMA ASSONOMETRICO PAVIMENTO



SEZIONE D-D

PARAPETTO TIPO 1.

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D


SEZIONE E-E

FINESTRA TIPO-ATTACCO ALLA CORNICE-PANNELLI

Nel verde ci sono i prati e i pascoli, i boschi e le foreste, i fiumi e i laghi, le zone di caccia e di pesca, le riserve naturali, le aree protette, le zone di interesse scientifico, storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale, ecc. I vari edifici comprendono 9.000 vani per abitazione, 1.000 vani per attività commerciali, 1.000 vani per attività artigianali, 1.000 vani per attività industriali, 1.000 vani per attività di servizio, ecc. Le varie attrezzature comprendono 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, ecc. Le varie attrezzature comprendono 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, 1.000 posti letto, ecc.



Bellucci R.
Del Debbio E.
Di Castro A.
Fagnoni R.
Manciaci S.
Pagni A.
Pastorini S.
Pellegrini M.
Poggi F.
F.
Iaccaro S.
d'ufficio

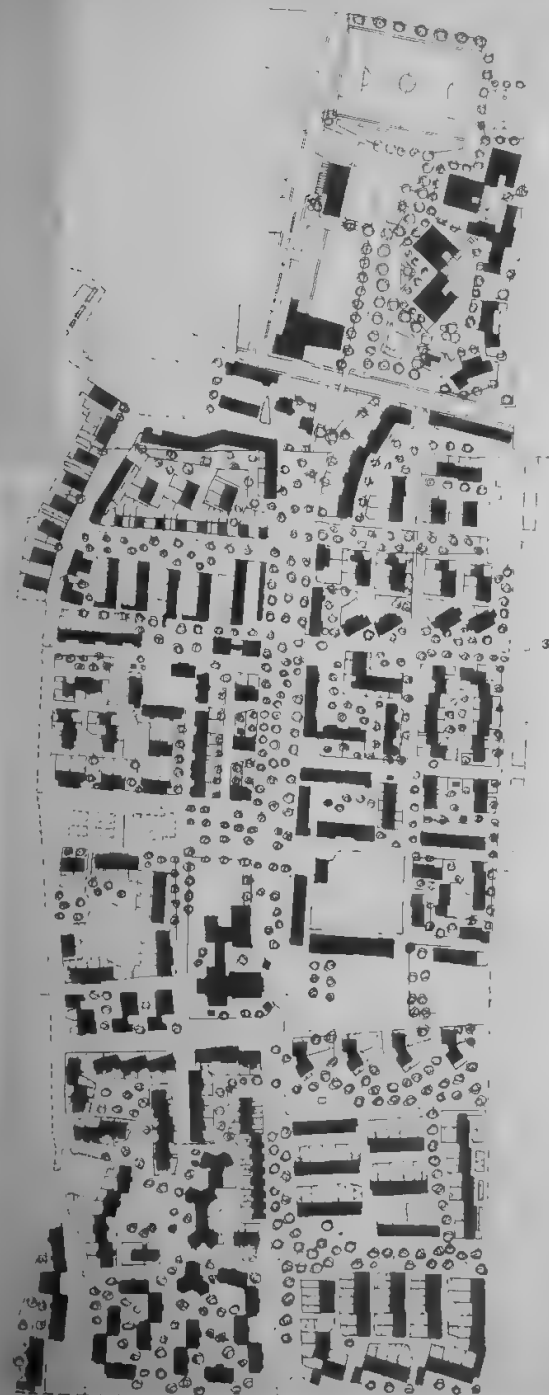

1. Veduta aerea dell'intero quartiere - 2. Veduta del quartiere dalle Cascine - 3. Planimetria generale e inserimento nella città.

Complesso residenziale «S. Giusto»

Settembre 11

PROGETTISTI:

Quaroni
Capogrossi

M.

De Carlo A.

L.

edotti A.



Detti E.
Capogrossi

A R


M R

A

Il quartiere sorge alla periferia di Prato, in un lotto di terreno di 13,5 ha. L'edilizia è collegata alla rete stradale principale è assicurata dalla via di S. Giusto dalla quale si distacca anche la principale via di penetrazione al quartiere stesso. La consistenza edilizia è di 3.852 vani, ripartiti su tre livelli di vari alloggi: gli alloggi sono raggruppati intorno a delle corti di dimensione tale da rendere possibile una vita collettiva senza peraltro creare delle vere e proprie separazioni fra una parte e l'altra del quartiere. La rete di strade e spazi pedonali, percorsi e congiunge tutte le unità abitative e passano tra le corti e le corti. Le singole corti sono racchiuse tra edifici di varia altezza ma basandosi sul tipo a pianta quadrata con scala centrale e quattro alloggi sfalsati di 80 cm. ed il tipo rettangolare con due alloggi sfalsati di 160 cm. e scala intermedia. Il quartiere è provvisto di tutti i servizi collettivi, secondo la sua dimensione e cioè: la scuola elementare, due scuole materne, due asili nido, il centro sociale, la chiesa, il mercato e negozi.

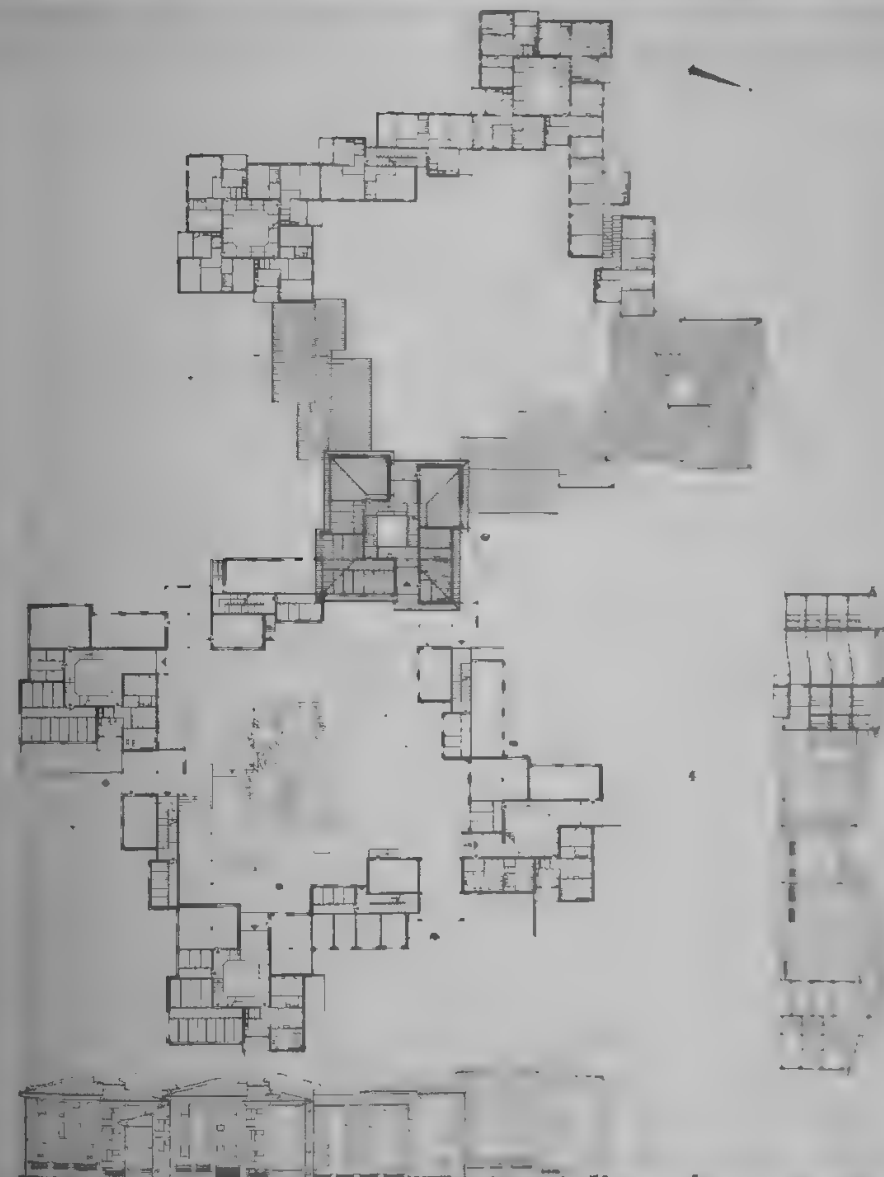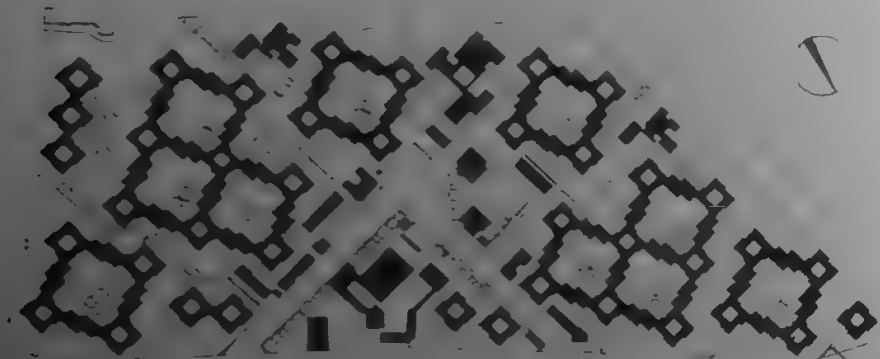

1. Planimetria generale - 2. 3. Vedute prospettiche e schema di una corte - 4. Schema planimetrico e prospetti di un gruppo di corti - 5. Plastico del quartiere.

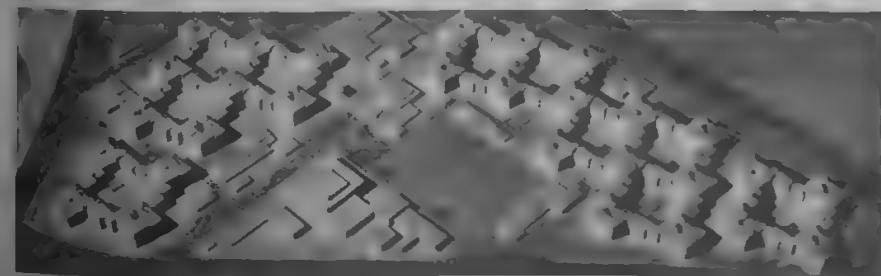

Complesso residenziale « La Cava »

Settennio II


Il complesso è ubicato lungo la via Emilia a 2 km. circa dal centro urbano di Forlì su un'area di 10,6 ha. La disposizione degli edifici è tale da creare, lungo le strade, una calibrata varietà di spazi, caratteristica delle città emiliane. In tale continua variazione si vieta infine a determinare uno spazio più ampio o piazza, dove sono sistemati negozi e mercato. Delle attrezzature comuni oltre la scuola e la Chiesa, limitrofi al nuovo insediamento, fa parte un centro sociale, progettato dall'Arch. Gandolfi, con caratteristiche costruttive particolari che hanno permesso la prefabbricazione di alcuni elementi, quali ad esempio pilastri in c.a. tutti della dimensione di cm. 12 X 24, e le scale interne metalliche, eseguite in officina e montate sul posto con semplice bullonatura. Il complesso comprende per ora 307 alloggi per 1.524 vani, su un totale di 3.800 vani.







PROGETTISTI

Gandolfi, G.
Capogruppo
Arnaboldi, R.
Casali, F.
Casarini, F.
Giubileo, I.
Mezzasalma, F.

1. Planimetria generale - 2. Veduta parziale del quartiere - 3. Prospetto e pianta di un edificio di linea - 4. Pianta e prospetti dell'edificio I - 5. Particolare del Centro Sociale - 6. Particolare di un edificio - 7. Veduta d'insieme del Centro Sociale - 8. 9. Prospetti e piante del Centro Sociale dell'architetto Gandolfi - 10. Particolari dello schema di montaggio degli elementi costruttivi del Centro Sociale.

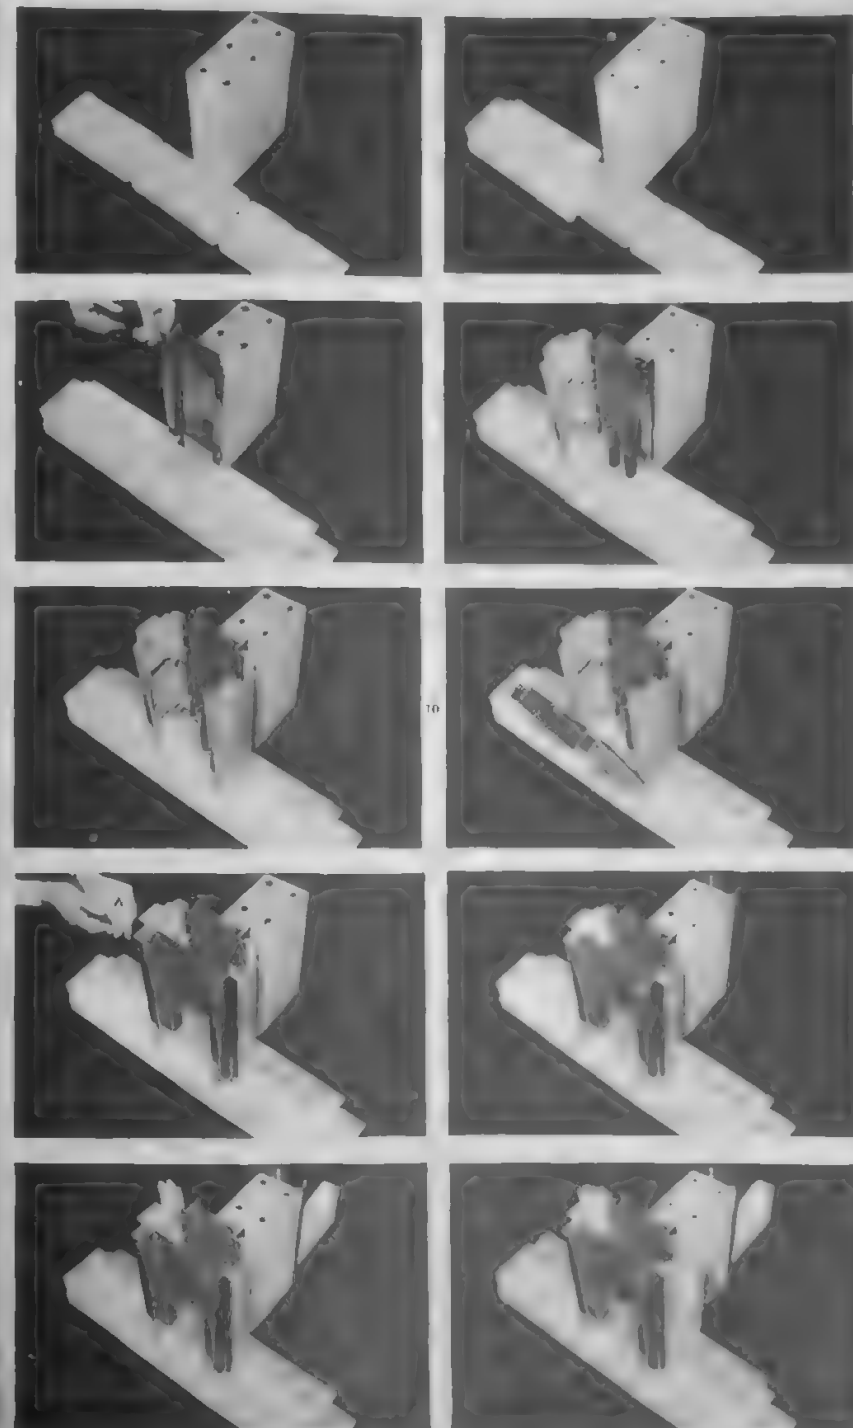

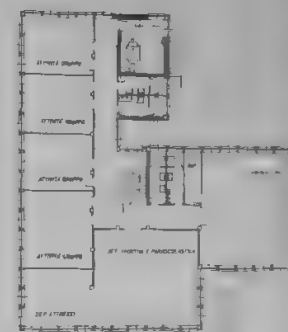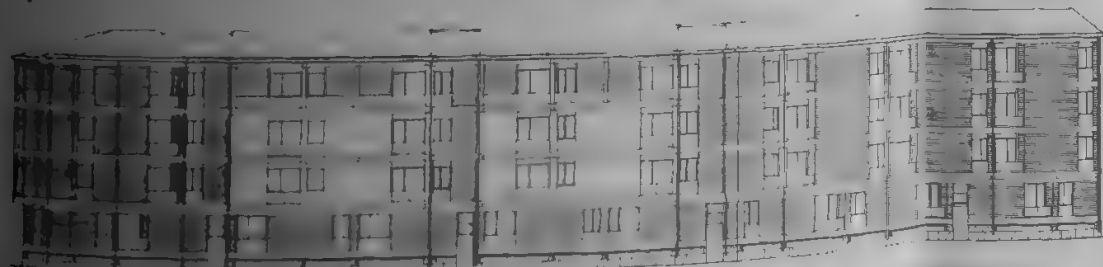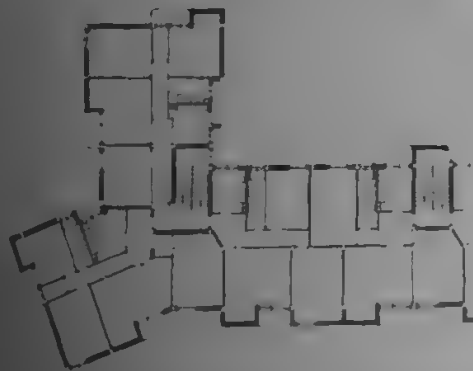[illegible]

Complesso residenziale « Forte Quezzi »

Settembre 11

Il quartiere si snoda sulle colline sovrastanti la città sotto la cinta delle mura antiche a nord-est della città, in posizione dominante a circa 6 km. dal centro storico. Il piano è stato studiato per ottenere una conformazione d'insieme semplice, omogenea, armonicamente inserita nel paesaggio, collocando pochi edifici, assai ampi, spaziosi ed adatti alle curve di livello della collina, con tutti gli alloggi aperti verso il panorama. Gli edifici sono cinque in tutto, di cui due lunghi circa 600 m. disposti su un'area di 33 ha. circa contenenti 820 alloggi per 4.300 vani.

Due di essi si adattano a loro volta, mediante un piano intermedio porticato con funzione di strada. I tre piani superiori ed i tre inferiori al porticato sono stati concepiti, come due edifici a se stanti, e come tali trattati anche nei collegamenti verticali che sono gli unici indipendenti dagli altri.



La servitù di disposizione del quartiere sono: la Chiesa ed annessa, due scuole elementari e numerosi negozi disposti sotto gli edifici.



PROGETTISTI:

Daneri L. C.
Capogruppo coord.
Grossi Bianca L.
Oddi V.
Surace F.
Zappa G.
Puzelli E.
Capogruppo coord.
De Maestri R.
Fortunato G.
Innocenti M.
Gaggero G.
Andreati C.
Capogruppo
Caroli G.
Corte D.
Matali Q.
Tavoletti M.
Tassinari P.
Morozzo Della
Rocca R.
Capogruppo
Braccialini M.
Coltroneo G.
Dasso M.
Datta D.
Spina G.
Pateri M.
Capogruppo
Chiglione V.
Loi E.
Loi M.
Testoni M.

1. Planimetria generale e schizzo prospettico del complesso.
2, 3. Pianta di alcune cellule abitative - 4. Veduta panoramica del complesso - 5. Soluzione per il punto di veduta di un edificio - 6. Veduta della città da completo

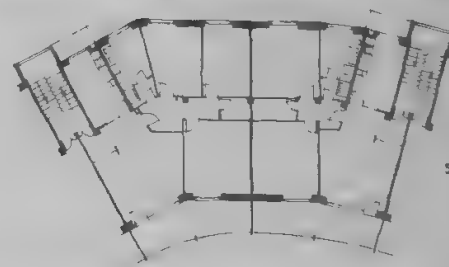

Complesso residenziale «Barbanella»

Settennio II


PROGETTISTI

Pierotti E.
Caporizzo
Dati I.
Mazzucchi F.
Palma A.

Il quartiere è ubicato a sud-ovest della via Aurelia, nella zona di espansione, a circa km. 1,5 dal centro della città ed occupa un'area di 7 ha.

Lo schema stradale è articolato su un anello periferico per la circolazione di veicoli, da cui si dipartono stradine di penetrazione che si attestano su piccole piazze inserite in una vasta fascia pedonale al centro del quartiere: su questa fascia sono sistemati: centro sociale, negozi e mercato nonché scuola elementare e scuola materna con ampia zona verde. La Chiesa è ubicata presso l'anello di scorrimento ed è collegata al centro del quartiere.

Tutti gli edifici sono sollevati da terra di m. 2,50 in modo da formare un portico nel quale sono ricavati gli ingressi e la rimessa per motorette; due di essi a cinque piani dominano l'intero complesso, gli altri sono a tre-quattro piani. Fanno eccezione tre gruppi di case a due piani, senza porticati, ai bordi del quartiere. Complessivamente il quartiere comprende 400 alloggi per 2.027 vani.




3

4




5




6



7

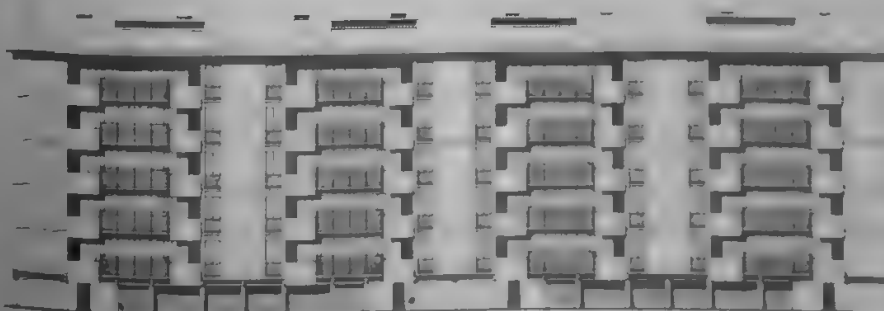


1. Planimetria generale - 2. Rapporto città-quartiere - 3. Prospetto di casa continua a portico - 4. Pianta delle case a schiera - 5. Pianta del piano terra e tipo della casa continua - 6. Prospetto delle case a schiera - 7. Pianta tipo e prospetto della casa abitato

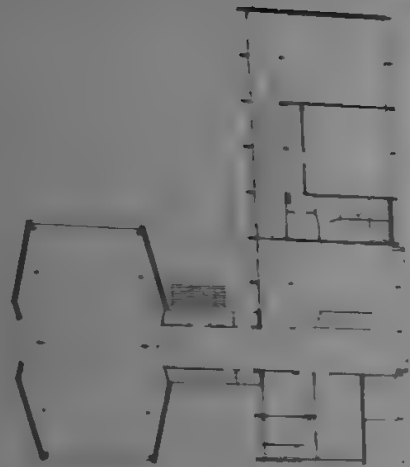


11

10

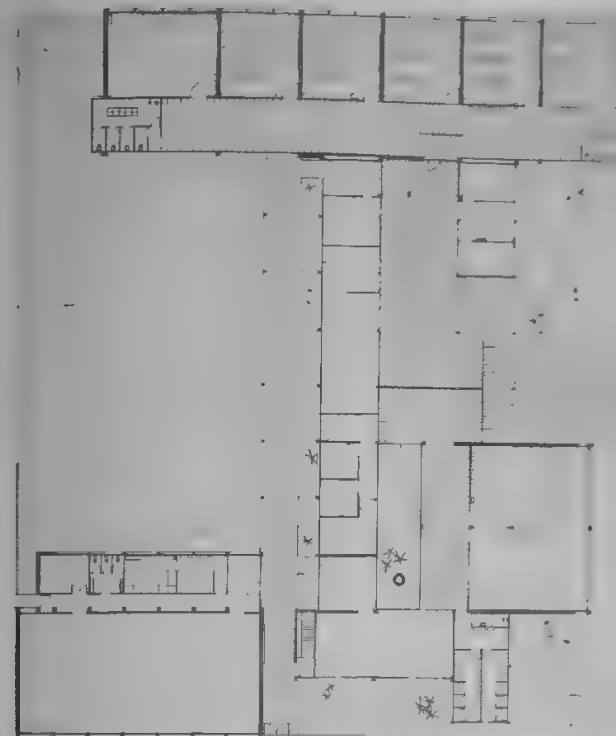

12



13



- 8. Pianta piano terra e primo piano del Centro Sociale - 9. Veduta panoramica del complesso - 10. Scorcio della casa continua a portici - 11. Veduta parziale del complesso - 12. Pianta del piano terreno e prospetto della scuola realizzata dal comune - 13. Pianta del edificio dei negozi - 14. Pianta generale e planisisco del complesso religioso (realizzazione della Curia)

Complesso residenziale "Bellavista"

settembre 11


11000 11357

11000 11357

Il complesso residenziale rientra nel quadro urbanistico del P.R. di Ivrea che prevede un gruppo di quartieri a vocazione mista, con un collegamento con i settori industriali. L'area di 12 ha, adiacente parallelamente alla strada nazionale per Torino e convenientemente distaccata da colline e zone rurali, è percorsa da forme quasi triangolari. Il complesso è costituito da un'area di circolazione da cui partono le strade residenziali che conducono ai vari gruppi di case, dove tra loro da giardini con spazi riservati al gioco dei bambini. L'edilizia è stata costruita in unione con la zona verde centrale dove sono sistemati i servizi collettivi quali il centro sociale, la scuola materna, la Chiesa, i negozi, oltre a botteghe artigiane ed uno spazio per attività ricreative o simili. Sono stati realizzati diversi tipi di alloggi da 3 a 7 vani. Nel complesso sono state disposte le abitazioni più grandi in case a schiera (duplex) e in case a schiera. In caso di sviluppo il complesso potrebbe essere ampliato costruendo 840 alloggi per 1482 vani.



Planimetria generale
della zona per
la casa alla
vita.





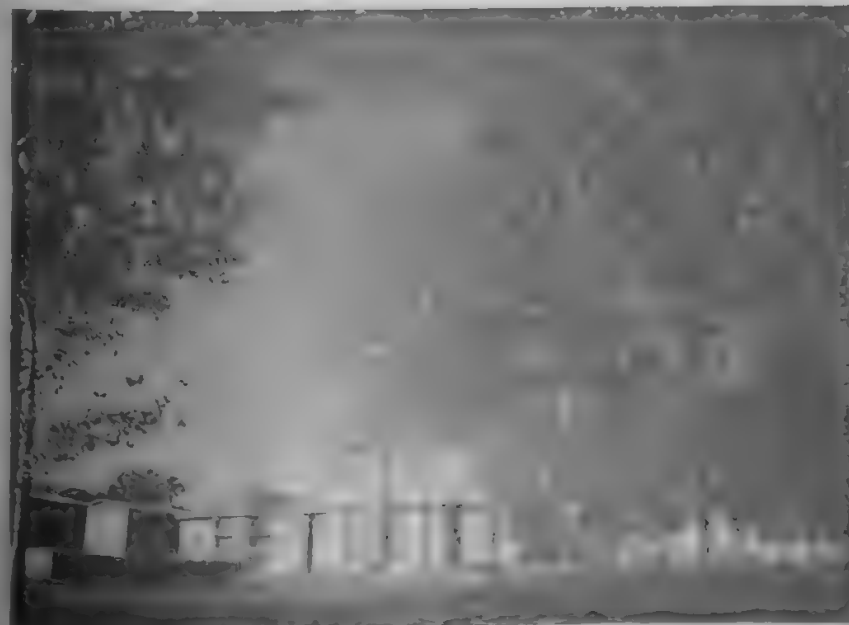




3



4

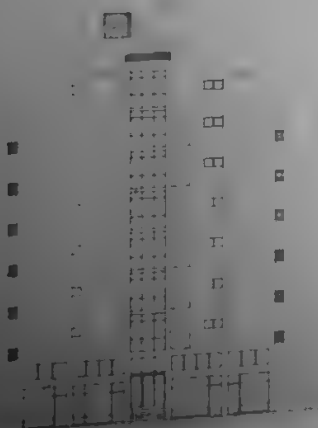

5



3. L'edificio a torre visto dalla zona alberata - 4. Piano piano tipo dell'edificio a torre nel quale, sezione e prospetto dell'ingresso - 5. Casa continua. Piano piano terra e piano tipo e prospetti - 6. Veduta parziale delle case continue.

Complesso residenziale « S. Rosa »








Settennio II

Il piano urbanistico del complesso, realizzato nel I e II Settennio su un'area di ha. 13,6, si articola su una strada longitudinale larga 30 m. fiancheggiata da case alte e da portici, che hanno accentuato il carattere urbano del complesso. Altre case multipiani si dispongono intorno ad un vasto spazio interno, destinato ai giochi dei bambini. In questo spazio si è creato un parco con alberi e fiori, e si è creato un giardino con alberi e fiori. Le case alte e quelle a schiera sono costruite in pietra locale e il carparo. Gli edifici comprendono circa 150 appartamenti, hanno una notevole diversità architettonica ma tutti con l'aspetto della pietra locale e il carparo. Una rete stradale di servizio, a carattere residenziale, serve il complesso degli edifici.

Rossi De Paoli P.
Capogruppo civico
Ferranti R.
Mainardi A.
Mainardi L.
Nati A.
Barletti B.
Capogruppo
Antonaci O.
Aralle F.
Febbri M.
Tempesta A.
Ciorla F.
Colaninno A.
Dall'Olio C.
M. F.
P. F.
Russo P.



1. Planimetria generale - 2. 3. 4. Pianta e prospetti di case a schiera - 5. Pianta piano tipo e prospetto di un edificio in linea - 6. Veduta aerea verso ovest - 7. Insieme di alcune case a schiera - 8. Veduta della piazza della fontana - 9. Pianta piano tipo e prospetti dell'edificio a nastro con il portico.

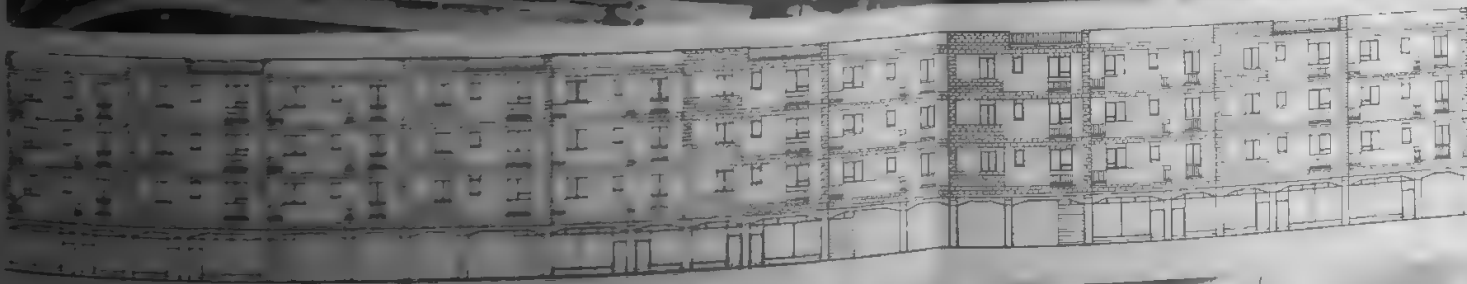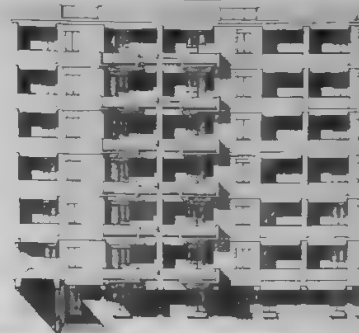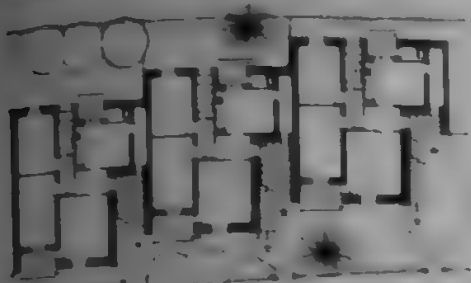


LIVORNO

Complesso residenziale «Coteto» Settennio II



Il complesso è ubicato alla periferia di Livorno, verso sud, in una fascia di terreno di 8,2 ha. compresa tra la via Roma-Pisa e la via Aurelia. È costituito da due unità collegate tra loro da una fascia di verde e da una zona di servizi collettivi. Gli edifici della unità ad est sono distribuiti lungo il perimetro in modo che il complesso non contrasti troppo vivamente con l'edilizia privata prevista dal P.R. per gli isolati vicini all'interno si trovano gli spazi pedonali riservati alla vita e lottica sempre articolati ma chiaramente delimitati. La seconda unità a ovest presenta edifici ancora più articolati disposti sul lato. Tra edifici ad est piano segue la zona di accordo tra le due unità, gli altri fabbricati sono previsti a 1,4 piani. I vani totali delle due unità sono 2.686, gli alloggi 542. I servizi collettivi sono costituiti da Chiesa, scuola materna, centro sociale, mercato e negozi.




PROGETTISTI

Fagnoni R.
Capogruppo
Bianchini E.
Cambi E.
Lawley A.
Spadolini P. I.
Barucci P.
Capogruppo
Cari A.
Di Gaddo B.
Melogroni C.
Reggiani P.
Todini L.




1. Planimetria generale - 2. Veduta parziale del complesso - 3. Veduta di una corte - 4. Pianta piano tipo e prospetto della casa torre - 5. Pianta piano tipo e prospetto della casa articolata -


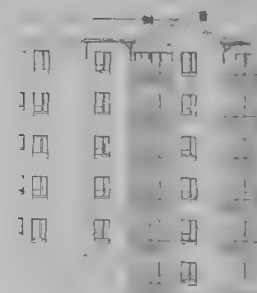
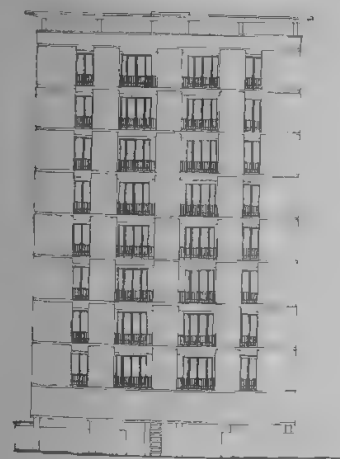





Pianta a quota (sotto) m. 10
edifico a quota m. 10 m.
edifico a quota m. 10 m.




di quota m. 10 m.
edifico a quota m. 10 m.
edifico a quota m. 10 m.

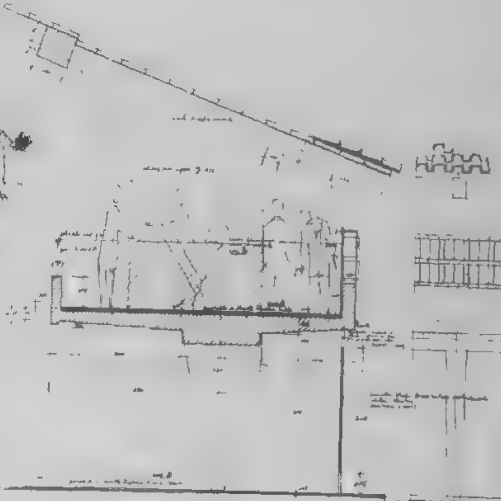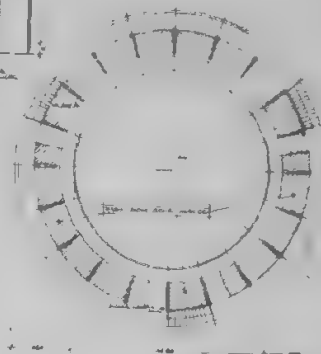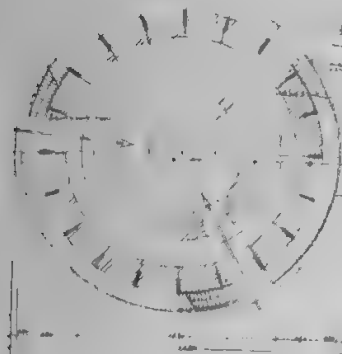

6. Pianta piano
tipo e prospetto
di una casa iso-
lata - 7. Partico-
lare di una corte
- 8. Particolare
del gruppo ne-
goci e del porti-
cato (arch. R. Fa-
gnoni) - 9, 10, 11.
Pianta, particola-
ri e vedute pro-
spettiche del mer-
cato (arch. R. Fa-
gnoni) realizzato
e cura del Co-
mune.



Veduta prospettica del ballatoio superiore



MILANO - CESATE

Complesso residenziale « Cesate »

Settimio I

Il complesso progetta su un'area di 20 ha, e prima a 15 km circa a nord di Milano, lungo la ferrovia Milano-Saronno, e collegato alla città per mezzo della Ferrovia Nord e di un tronco disteso che passa a 1 km dalla città, e lungo l'arteria del Naviglio. Il progetto si propone di intervenire la zona di Cesate, distante 1 km. Il complesso residenziale è stato progettato in modo da essere distribuito e su un'edilizia di tipo moderno, con l'obiettivo di creare un nuovo quartiere residenziale, con una scuola materna, il centro sociale, la chiesa e la casa. Sono stati realizzati 3.330 vani in 574 alloggi.




PROGETTISTI


Albini F.
Albini G.
Belgioioso L.
Castiglioni E.
Gardella I.
Ferruzzi E.
Rogers E.

1. Veduta aerea del complesso verso nord.
2. Planimetria generale e inserimento nella città.
3. Veduta lungo la via del centro.
4. Pianta piano tipo della casa ballatoio.
5. Pianta e prospetti di vari tipi di case a schiera.
6. Veduta aerea verso ovest.
7. Veduta di uno spazio interno.
8. Particolare di un edificio a schiera.
9. Pianta e prospetti di un tipo di case a schiera.

10. Veduta della Chiesa dell'Architetto Gardella (realiz. Curio).
11. Pianta della scuola elementare degli architetti Belgioioso, Ferruzzi e Rogers (realiz. Comune).
12. Veduta generale della scuola.

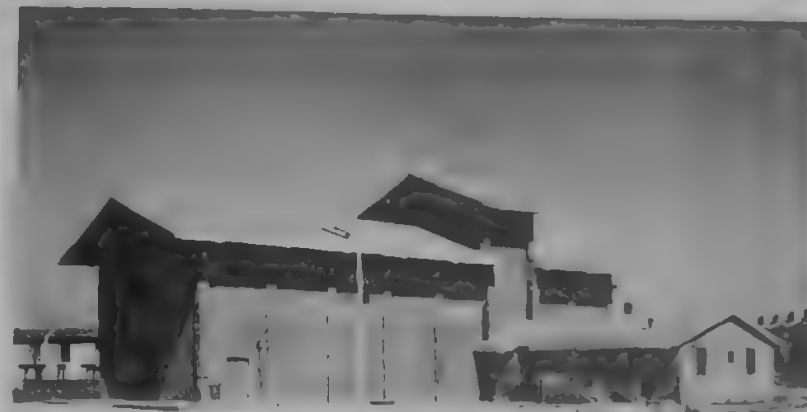

10




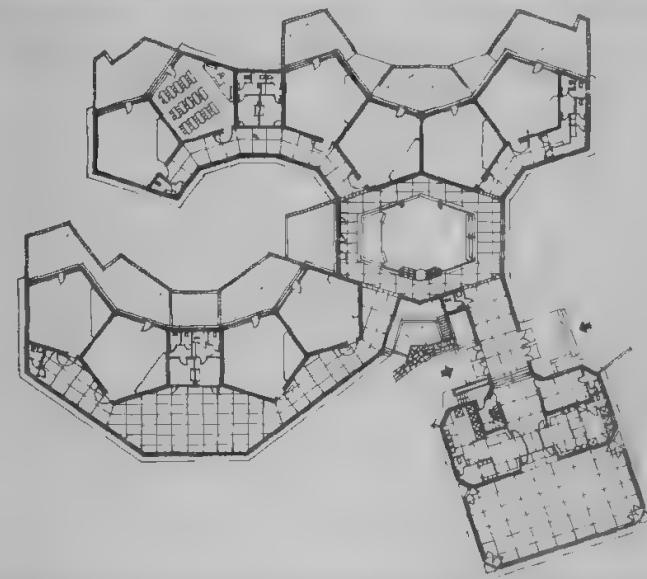


12



Albini F.
Albrecht G.
Belgiovanni L.
Castiglioni E.
Cardella I.
Peregrini E.
Ruggi E.

Albini F.
Albrecht G.
Belgiovanni L.
Castiglioni E.
Cardella I.
Perezzutti E.
Ruggieri E.

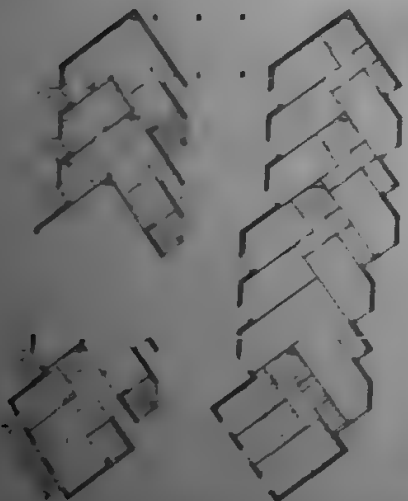



Complesso residenziale « via Feltre » Settembre 11


Il quartiere sorge su un'area di circa 23 ha., contigua alla città e delimitata dalle vie Crescenzago, Feltre, nuova via di P. R. ed il fiume Lambro: a nord-est dell'area sorge l'ampia distesa verde del Parco Lambro che il P. R. prevede di far espandere nel quartiere senza soluzione di continuità. Il nuovo insediamento è articolato in quattro nuclei che compongono un sistema di vie, piazze, porticati e corti semiaperte dove sono sistemati i principali servizi di quartiere. Un primo nucleo ha la funzione di sutura col tessuto cittadino, operando un graduale passaggio tra l'edilizia non pianificata al confine ovest e l'edilizia alta e geometrica, mentre regolata degli altri nuclei interni al quartiere, costituiti da edifici a dieci piani con porticato, disposti in modo da racchiudere spazi aperti lasciando tuttavia aperta ad ogni alloggio la visuale sul verde. La formazione di questi tre nuclei ad alta densità ha permesso di liberare al massimo il suolo per destinarlo a parco pubblico. Il centro principale del quartiere è collocato nel primo nucleo lungo via Crescenzago, articolato nei due organismi del centro religioso e di quello commerciale; le scuole elementari e la scuola materna sono opportunamente sistemate negli spazi verdi fra i nuclei, isolate dal traffico. Un centro sportivo è inoltre ubicato nella propaggine del parco. Complessivamente sono stati costruiti 1.725 alloggi per un totale di 9.387 vani.

PROGETTISTI

Pollini G.
Capogruppo coord.
Albrici G.
Boschetti G.
Ceretti V.
Figini L.
Bacciocchi M.
Capogruppo
Attili C.
Mantovani A.
Baldisseri L.
Capogruppo
Matteotti M. P.
Di Tocco V.
Duca B.
Salva E.
De Carlo G.
Capogruppo
De Carli C.
Gregotti V.
Mansani E.
Gardella I.
Capogruppo
Antonio N.
Ferrieri A.
Menghi R.
Giordani G.
Capogruppo
Colpi G.
Donatelli R.
Malaguzzi I.
Sgrella E.
Mangiarotti A.
Capogruppo
Bassi C.
Monti Bertani A.
Morassuti B.
Papini P.
Viganò V.
Terzaghi M.
Capogruppo
Clerici F.
Faglia V.
Fiocchi A.
Fratelli E.
Magnaghi A.
Trolli P. I.
Capogruppo
Bettioni G.
Kraus N.
Piccaluga E.
Varisco
Capogruppo
Fretta G.
Guerci M.
Monnet G.
Perogalli C.

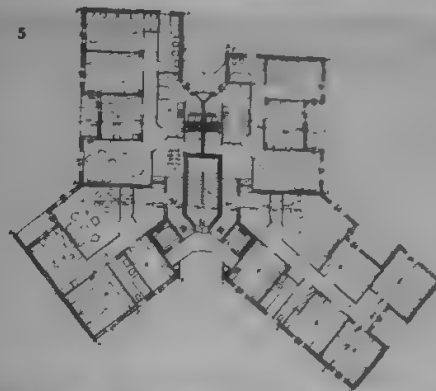

1. Planimetria generale - 2. Piano tipo di una torre - 3. Veduta aerea del complesso - 4. Complesso scolastico realizzato dal Comune - 5. Soluzione di testata degli edifici continui: piante piano tipo e prospetto sulla scala - 6. Edificio continuo: piante piano tipo






- 8. Soluzione di
modo di uno de-
gli edifici conti-
nuo: pianta piano
tipo e prospetto
nord - 9. Pianta
a diverse quote di
un edificio conti-
nuo - 10. Strada
interna del quat-
tiere - 11. Veda-
ta parziale della
via Feltrina.

MILANO

Complesso residenziale «Harrar» Settennio I

Il quartiere sorge nella zona di S. Siro, alla periferia della città; è collegata con essa da alcune linee tranviarie esistenti che permettono alla popolazione di gravitare completamente, per il lavoro, su Milano. Il quartiere è attraversato da una grande via di P.R., mentre alcune zone dell'area, di 13,7 ha. sono vincolate a verde. Il complesso è stato impostato su due tipi edilizi fondamentali, grandi case collettive multipiani e piccole case unifamiliari di un piano fuori terra, raccolte in *insular*: ciò rappresenta un sistema di fusione dei due modi più tipici di abitare. Gli edifici, con posti di 14, alloggi pari a 4.800 vani, circondano un parco pubblico nel quale sorgono la scuola e l'asilo, ed il centro sociale. I negozi commerciali sono previsti in una area meno baricentrica ma direttamente accessibile dalla strada principale.

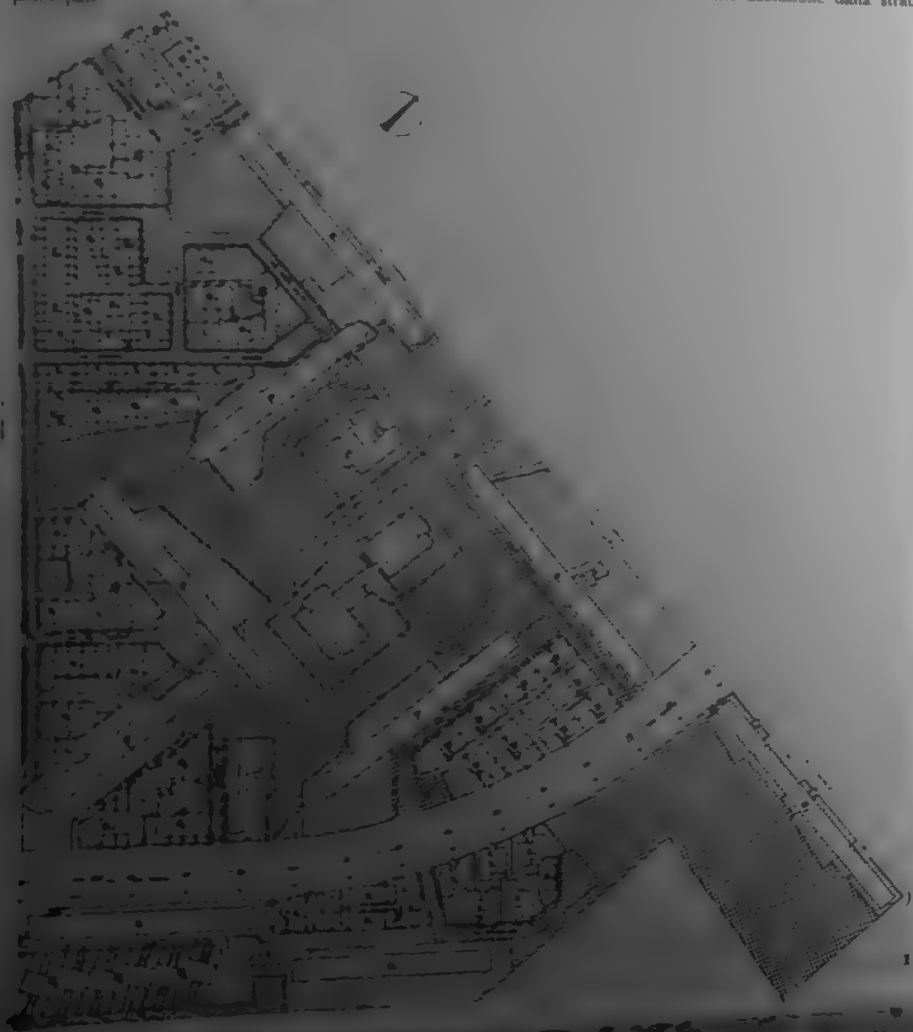


PROGETTISTI:

Bottoni P.
Chessa P.
Figini L.
Urbani
Gho C.
Morini M.
Pollini G.
Urban
Poni G.
Urban
Reggio G.
Rossi A.
Tedeschi M.
Teuerotto M.
Verucio T.
Villa C.








2

1. Planimetria generale - 2. Veduta aerea del complesso - 3, 4. Piani dei duplex e di un alloggio tipo dell'edificio continuo a Sud prospiciente il gruppo scolastico.




3






5

6



7



8

9



5 Pianta, prospetto e sezioni delle cellule abitative nelle a. m. s. - 6. Il centro del quartiere - 7. Esempio di piante tipiche del complesso - 8. Veduta di una strada a. m. s. delle a. m. s. - 9. Il centro centrale del quartiere - 10. Uno degli edifici del Co-

Complesso residenziale « Vialba »

Settembre 11

Il quartiere che sorge a nord-ovest della città, a contatto dell'autostrada per Bergamo a circa 5 km. dal centro cittadino, si sviluppa attorno ad una grande strada residenziale che costituisce il centro di vita e lungo la quale si snoda una teoria di negozi posti sotto i portici delle case. Il quartiere, pensato in una zona di alta densità abitativa, è dotato per ora di 6.800 vani in 1.200 alloggi. Per tale ragione i servizi (scuola, centro sanitario, centro di ricreazione, centro di cultura, centro di sport, centro di servizi) sono distribuiti in modo da essere facilmente raggiungibili da tutti i piani, disposti intorno a spazi verdi di varia grandezza. Il complesso è costituito da case a schiera, da case a corte, da case a corte con giardino, da case a corte con giardino e da case a corte con giardino. La scuola materna è situata nel centro del quartiere.







PROGETTISTI

Ceratti E.
Capogruppo coord.
Baini F.
Geri G.
Monti G. E.
Monti G.
Moro G.
Lingeri P.
Capogruppo coord.
Lingeri P. C.
Lingeri A.
Terragni E.
Terragni G.
Latu V.
Capogruppo
Giacchi F.
Latu G.
Pencola G.
Polo B.
Minioletti G.
Capogruppo
Braxi G.
Chiodi G.
Morini M.
Capogruppo
Malchiodi G.
Ravagnani M.
Vulso C.
Vincenzi A.
Tedesco M.
Capogruppo
Caccia Dome-
niconi L.
Valenti A.
Valenti G. P.
Zanuso M.

1. Veduta aerea del complesso -
2. Planimetria generale -
3. Sviluppo planimetrico dell'edificio a nastro sulla via principale (rapp. 1:800) -
4. Planimetria e prospetto della casa continua sulla via principale -
5. Casa a torre stellata pianta tipo e prospetto -
6. Veduta della via a portici principale -
7. Strada interna del complesso.

Cerutti E.
 Capogruppo *non*
 Bassi F
 Gai G
 Monti G E
 Monti G.
 Moro G.
 Lingieri P.
 Capogruppo *non*
 Lingieri P C
 Lingieri A.
 Terragni E
 Terragni G
 Lato V
 Lato V
 Lato P F
 Lato G
 Perini G.
 Perini G.
 Pini B
 Morini G
 Lato V
 Pini G
 Chiodi G
 Morini M
 Lato V
 Morini G
 Ragagnani M
 Lato C
 Lato V
 Lato V
 Capogruppo
 Lato V Dom
 Morini L
 Valentini A
 Valentini G P
 Zambino M

dal
ita e
una
servizi
sono
torri
erna.

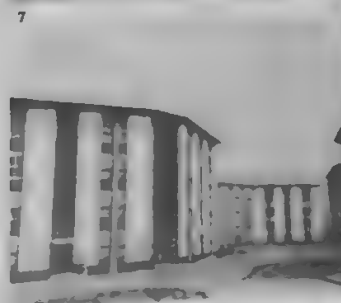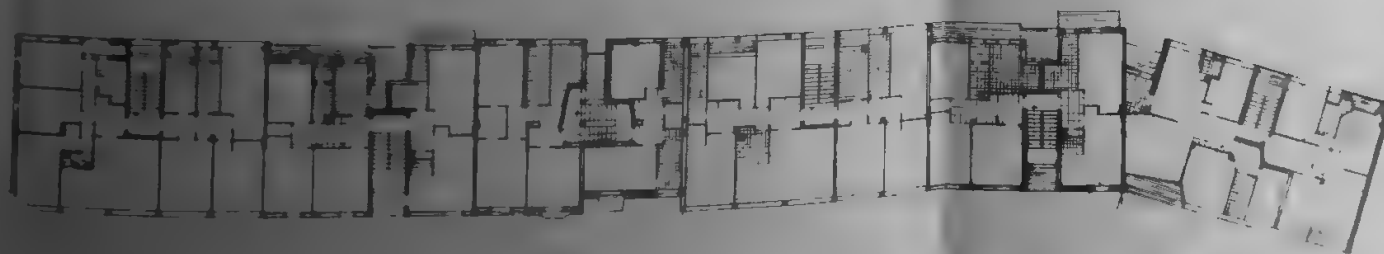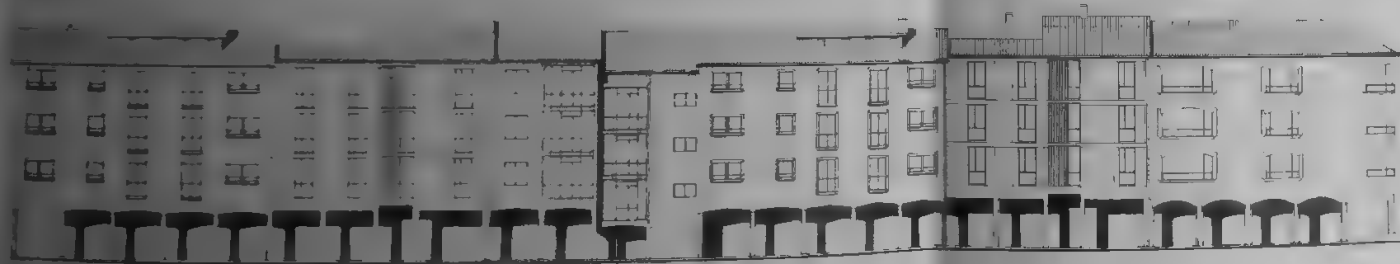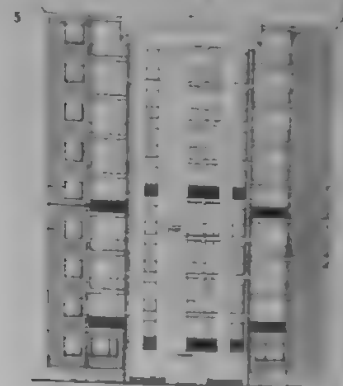

NAPOLI

Complesso residenziale «Secondigliano» Settennio II

L'area su cui sorge il quartiere è confinante con la provinciale da Aversa a Napoli, coincidente con il primo tratto della strada statale Appia. Il complesso è situato nella zona di porta Capuana da una tranvia principale e con la porta Capuana della città. Il complesso è costituito da un unico blocco di edifici, impostato su tre livelli di altezza, ed è collegato da una strada principale. La disposizione dei edifici è tale da creare un'area libera, sufficiente per la sistemazione di un giardino. Il quartiere è un complesso di edifici di uguale altezza a quattro piani. Ad ogni edificio corrisponde un gruppo di edifici.



1

PROGETTISTI
Cocchi C
Capogruppo concilio
Berilli N
Capuano P
Ragocino M
Tagliatella D
Valente D
Capobianco M
Capogruppo
Capobianco A
Francion V
Isabella F
Mariglia A
Rubino G
Lo Cuero E
Capogruppo
Giliberti C
Pugliese A.M
Pugliese T
Nicolini G
Capogruppo
Allegria F.
Bompiani M
Gini R
Del Vecchio D
Pacevovini D
Capogruppo
Caporrio O
Chinca P
Paciello S
Capogruppo
Angriziani M
Carpini L
Cuscatto U.
Nunziata M
Stigli M
Rupoli M
Capogruppo
Perrillo F
D'Aleone F
Ruvicchio R
Capogruppo
Albini G.
Albini U'

2



1. Veduta aerea
del complesso
lungo la Via Ap-
pia Nuova - 2.
L'area metra gene-
rale - 3. Veduta
centrale del quar-
tiere residenziale





4. Pianta e prospetto di un edificio in linea articolata. 5. Pianta di altri edifici del complesso. 6. Veduta d'una parte del quartiere con alcune sistemazioni esterne. 7. Pianta tipo e prospetto di un edificio in linea articolata. 8. Vedute parziali lungo la via principale e degli spazi interni al quartiere residenziale.



Complesso residenziale « Soccavo Canzanella »

Settennio II

Il quartiere, costituito complessivamente di 7.900 vani in 1.425 alloggi, si compone di tre zone che sorgono su un'area di ha. 26 circa: una pianeggiante, compresa tra la strada Milano-Agnano e la nuova via di P.R.; due disposte su di un colle in ripida salita verso il Vomero e separate tra loro con la nuova strada collegante quella di P.R. con il Vomero. Delle tre zone, quella progettata dai gruppi Fiorentino-Sterbini si trova sulla sinistra di detta strada e comprende 1.736 vani in 278 alloggi. L'elemento conduttore del settore illustrato è costituito da una strada interna, parte pedonale e parte carrabile, la quale si svolge, salendo lungo il dorso delle colline, parallelamente alla nuova strada automobilistica di collegamento con il Vomero. Questa strada interna, con una serie di spazi differenti, costituisce il centro dell'unità. Nel settore è previsto un centro con negozi allineati intorno ad uno spazio quadrato ed alloggi al piano superiore. I tipi edilizi sono tre: uno in linea continua che fa da motivo conduttore delle sopradette strade interne, uno a torre che puntualizza o conclude alcuni spazi; l'ultimo tipo infine, porticato e con negozi e alloggi al pianterreno, che conclude il settore nella strada verso il Vomero.



V.M. 117

De Luca G.

Coordinatore

Fiorentino G.

Capogruppo

Amisano L.

Insolera I.

Limentani C.

Quistelli A.

Zani G.

Sterbini G.

Capogruppo

Azzione E.

Corona E.

Incorvata G.



Novelli F.

Volpe S.

1. Planimetria generale del complesso - 2. Progetti urbanistici del settore Fiorentino-Sterbini (zona nord-est) - 3. Veduta aerea dell'intero complesso - 4. Veduta parziale della zona nord-est - 5. Pianta e prospetti di un edificio in linea della zona nord-est - 6. Pianta piano tipo di un edificio in linea

PROGETTI

De Luca G.
Coordinatore
Fiorentino M.
Capogruppo
Anversa L.
Insolera I.
Limentani C.
Quistelli A.
Zani G.
Sterbini G.
Capogruppo
Ascione E.
Corona E.
Incorvata G.
Novelli F.
Volpe S.



Il Planimetria di
una del om
nopo: Pro
mazione del
di questo
completo come
regio. La Via
tra l'altra del
mio interesse
il quale per
de area, ha
avuto la sua
la profeta di
risale al 1911
la area una
mura di Pion
e due altri di
che si in la

Complesso residenziale « via Forcellini »
Settennio II

Settennio II

1. Area destinata alla costruzione del quartiere si trova a sud-est della città, ai margini di essa.
 2. L'area suddetta accoglie un complesso, sulla superficie di circa 21 ha., comprendente 4.370 vani in 795 alloggi.
 3. Il collegamento del quartiere col centro urbano è ottenuto con la via Forcellini, mentre la via Colleoni ha la funzione di collegamento del complesso stesso con le attuali zone industriali e commerciali.
 4. All'imbocco di via Forcellini sorge a nord il centro sociale, a sud un gruppo di edifici articolato in una piazzetta comprendente negozi e mercato. La continuità tra questi elementi è realizzata mediante portici.
 5. Il complesso religioso sorge al centro del quartiere. Le due strade residenziali maggiori si concludono in due slarghi sui quali prospettano due edifici scolastici.
 6. I campi di svago per i ragazzi sono stati decentrati in zone periferiche, uno per ogni settore del nucleo.
 7. I tipi edilizi del quartiere sono costituiti da edifici a treigli, da cinque piani, edifici continui a tre piani, case a schiera con alloggi su due piani, fabbricati isolati a tre piani.





PROGETTIO

Vallet V
Caporuzzo G
Bendillon E
Cristofari C
Gusic F
Negri A
Tombola G
Cecchi M
Caporuzzo
Rene A
Zabai G
Mazzi H
Brunetti J
Caporuzzo
Baroni G
De Ben A
Majore S
Maraschini C
Scimen G
Mansueti F
Caporuzzo
Miozzo G
Oddino A
Ronchi P



1. Planimetria generale - 2. Pianta tipo dell'edificio articolato a tre alloggi - scale - 3. Veduta aerea del complesso - 4. 5. Due esempi di piani tipo di due edifici riottari

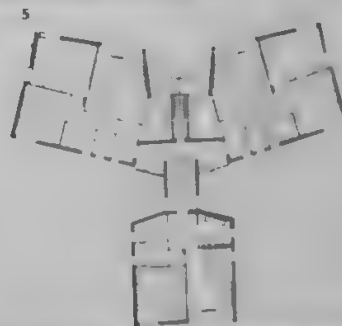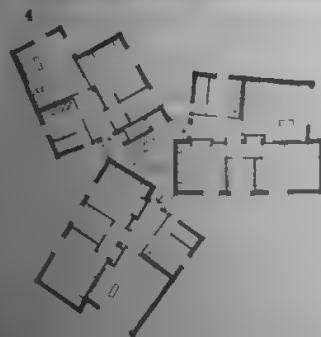





6



7

8



6 Veduta parziale degli edifici articolati -
7 Strada e portici - 8 Veduta parziale dalle schiere - 9, 10. Pianta e prospetto della schiera - 11 Veduta aerea del settore delle case a schiera - 12 Schema di composizione delle schiere

CRISTINA 1950 - 1951

1951 - 1952


12

PIACENZA

Complesso residenziale « Galleana II »

Settennio II

Questo complesso, pur essendo di limitata entità (412 alloggi per complessivi 2.224 vani) ha caratteristiche tali da poter essere assimilato ad un quartiere in espansione autosufficiente. Infatti, determinano queste caratteristiche, sia la prossimità di nuove arterie previste dal P.R. e direttamente innestate alle strade nazionali, sia la dotazione di servizi comuni piuttosto notevoli. Infatti dei 10 ha. circa 4 sono stati assorbiti dai servizi: sono previsti la scuola media, l'elementare, la materna, l'asilo nido, i negozi, gli uffici, una stazione di servizio e un Motel, il tutto integrato da ampi spazi verdi, la Chiesa parrocchiale ad opera della curia, la sala spettacoli ed il centro sociale sono stati progettati dall'Arch. De Scarpi con la collaborazione dell'Ing. F. Pacci. I tipi edilizi comprendono soltanto case a tre piani.

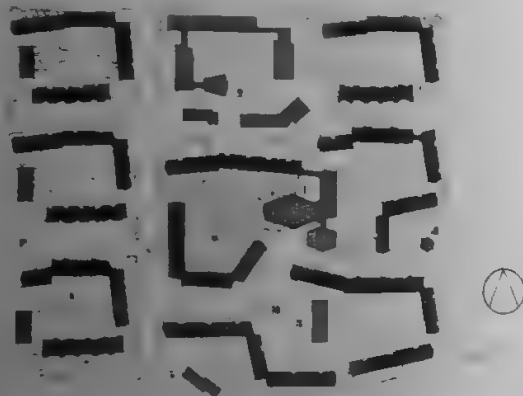

PROGETTISTI

De Scarpi E.
Caporaso
Alt. Mazz. L.
Bruni A.
Guerrini C.
Interlandi C.
Mortignoni C.
Mortignoni C.
Mignone R.
Terni L.

1. Planimetria generale
2. Piano di studio
3. Gruppo di case a schiera
4. 5. Particolare di prospetto delle case a schiera
6. Pianta relativa
7. Pianta, sezione e prospetto dell'edificio sulla piazza della Chiesa






PRIMA





La casa
è un
edificio
a tre
piani
con
un
cortile
interno
e un
giardino
esterno.

caratteristica
questo tipo
di abitazioni
è la loro
disposizione
in un
quadrato
o rettangolo
con un
cortile
interno.



1. Vista dall'alto del giardino
2. Vista dall'alto del cortile
3. Vista dall'alto del giardino
4. Vista dall'alto del cortile
5. Vista dall'alto del giardino
6. Vista dall'alto del cortile
7. Vista dall'alto del giardino
8. Vista dall'alto del cortile
9. Vista dall'alto del giardino
10. Vista dall'alto del cortile
11. Vista dall'alto del giardino
12. Vista dall'alto del cortile
13. Vista dall'alto del giardino
14. Vista dall'alto del cortile
15. Vista dall'alto del giardino
16. Vista dall'alto del cortile
17. Vista dall'alto del giardino
18. Vista dall'alto del cortile
19. Vista dall'alto del giardino
20. Vista dall'alto del cortile
21. Vista dall'alto del giardino
22. Vista dall'alto del cortile
23. Vista dall'alto del giardino
24. Vista dall'alto del cortile
25. Vista dall'alto del giardino
26. Vista dall'alto del cortile
27. Vista dall'alto del giardino
28. Vista dall'alto del cortile
29. Vista dall'alto del giardino
30. Vista dall'alto del cortile
31. Vista dall'alto del giardino
32. Vista dall'alto del cortile
33. Vista dall'alto del giardino
34. Vista dall'alto del cortile
35. Vista dall'alto del giardino
36. Vista dall'alto del cortile
37. Vista dall'alto del giardino
38. Vista dall'alto del cortile
39. Vista dall'alto del giardino
40. Vista dall'alto del cortile
41. Vista dall'alto del giardino
42. Vista dall'alto del cortile
43. Vista dall'alto del giardino
44. Vista dall'alto del cortile
45. Vista dall'alto del giardino
46. Vista dall'alto del cortile
47. Vista dall'alto del giardino
48. Vista dall'alto del cortile
49. Vista dall'alto del giardino
50. Vista dall'alto del cortile
51. Vista dall'alto del giardino
52. Vista dall'alto del cortile
53. Vista dall'alto del giardino
54. Vista dall'alto del cortile
55. Vista dall'alto del giardino
56. Vista dall'alto del cortile
57. Vista dall'alto del giardino
58. Vista dall'alto del cortile
59. Vista dall'alto del giardino
60. Vista dall'alto del cortile
61. Vista dall'alto del giardino
62. Vista dall'alto del cortile
63. Vista dall'alto del giardino
64. Vista dall'alto del cortile
65. Vista dall'alto del giardino
66. Vista dall'alto del cortile
67. Vista dall'alto del giardino
68. Vista dall'alto del cortile
69. Vista dall'alto del giardino
70. Vista dall'alto del cortile
71. Vista dall'alto del giardino
72. Vista dall'alto del cortile
73. Vista dall'alto del giardino
74. Vista dall'alto del cortile
75. Vista dall'alto del giardino
76. Vista dall'alto del cortile
77. Vista dall'alto del giardino
78. Vista dall'alto del cortile
79. Vista dall'alto del giardino
80. Vista dall'alto del cortile
81. Vista dall'alto del giardino
82. Vista dall'alto del cortile
83. Vista dall'alto del giardino
84. Vista dall'alto del cortile
85. Vista dall'alto del giardino
86. Vista dall'alto del cortile
87. Vista dall'alto del giardino
88. Vista dall'alto del cortile
89. Vista dall'alto del giardino
90. Vista dall'alto del cortile
91. Vista dall'alto del giardino
92. Vista dall'alto del cortile
93. Vista dall'alto del giardino
94. Vista dall'alto del cortile
95. Vista dall'alto del giardino
96. Vista dall'alto del cortile
97. Vista dall'alto del giardino
98. Vista dall'alto del cortile
99. Vista dall'alto del giardino
100. Vista dall'alto del cortile

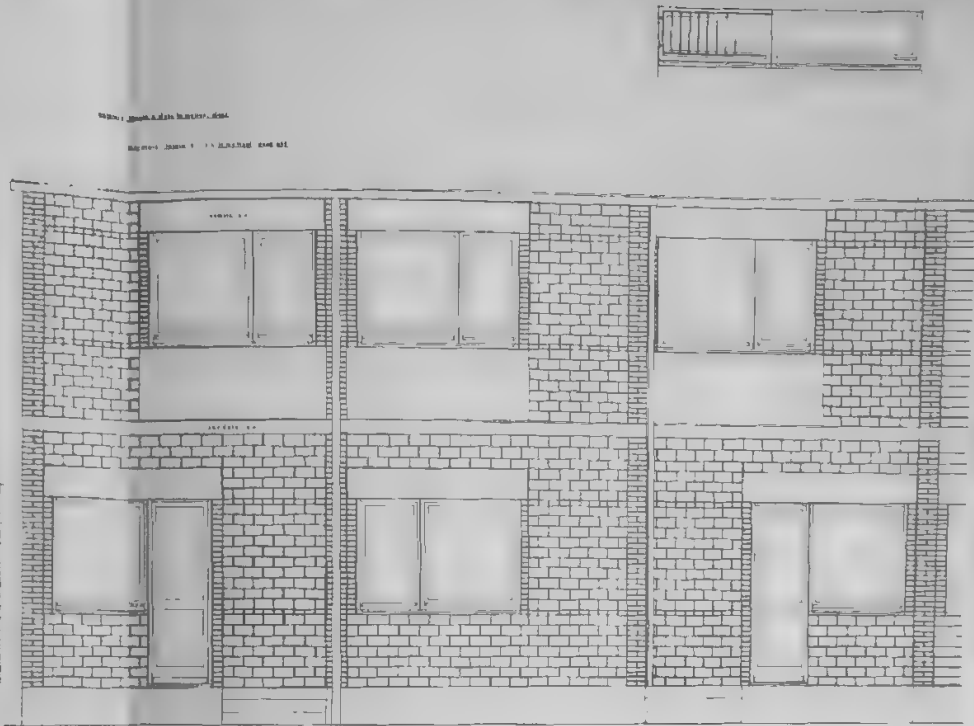

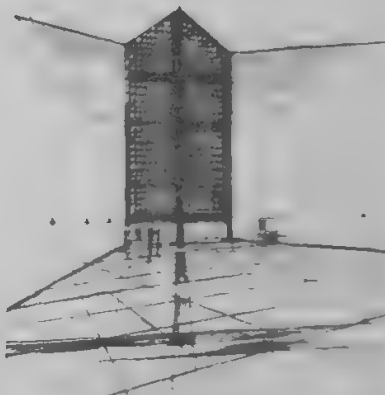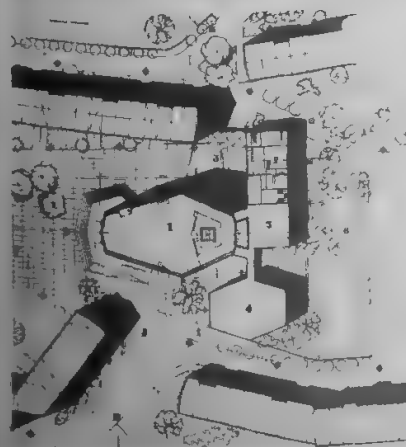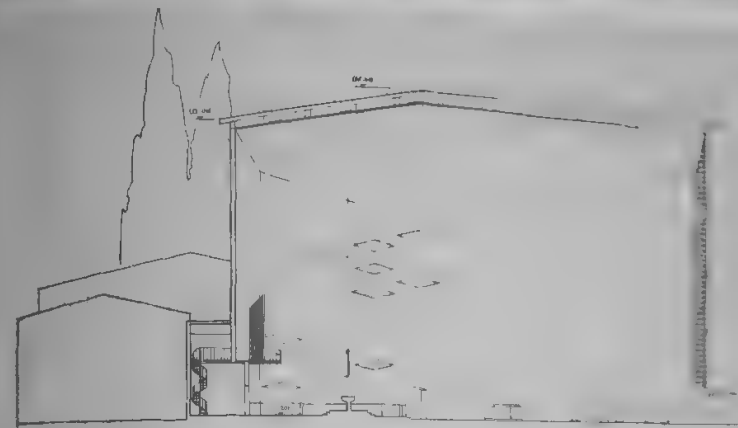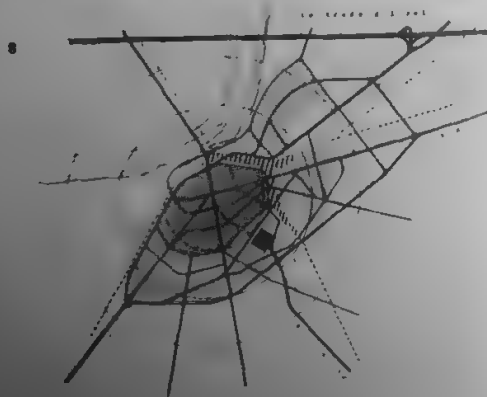

7. Interno di una corte - 8. Interno del quartiere nella città
9, 10. Sezione, planico e planimetria della Chiesa e schizzo prospettico dell'interno


Complesso residenziale « Borgo Montanara »
Settennio II

Settennio II

« Borgo Montanara » occupa un'area di circa 13,5 ha. e comprende 4.200 vani in 852 alloggi. Il suo schema viario è impostato su strade veicolari di penetrazione poste ai margini del terreno lungo gli assi N-S orientati via Montanara con la nuova tangenziale sud della città e su una strada che penetra da via Montanara sino al centro del quartiere.


Un sistema di strade pedonali collega i vari ambienti residenziali ed il centro con le relative attrezzature collettive senza interferire con le strade veicolari. Si è pensato ad un unico centro, snodato in diversi ambienti (commerciale, assistenziale, religioso) che costituisce la tipica piazza del borgo emiliano. Un complesso di negozi aperti su un ampio spazio interno, un edificio a negozi del tipo "galleria".

Un complesso di negozi aperti su un ampio spazio interno, un edificio a negozi ed abitazioni, un cinema, la Chiesa con le relative attrezzature, la scuola, l'asilo e il centro sociale costituiscono i servizi collettivi.





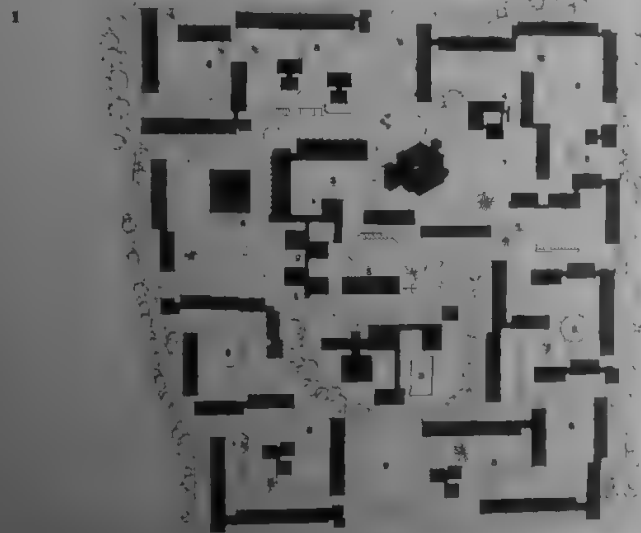


778

Pravda
Tuzet

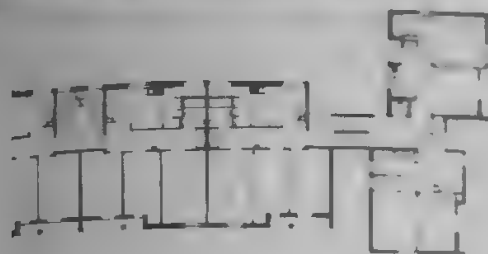

•

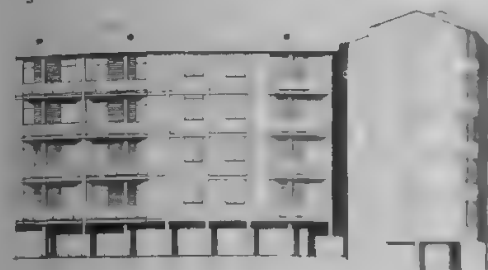[illegible]

RAVENNA

Complesso residenziale « Trieste »

Settennio I e II

Questo nuovo quartiere, in parte realizzato, posto in prosecuzione del quartiere nel quale sorge il nucleo realizzato nel I Settennio di 510 vani e collegato ad esso mediante la via Tommaso Gulli, è costituito da 7.525 vani distribuiti in 1.505 alloggi su 22 ha. È prevista autosufficienza essendo fornito dei serviz. più importanti: scuola elementare e materna, Chiesa, negozi, mercato ed attrezzature sportive ed infine il centro sociale progettato dall'arch. Gandolfi. Le vie principali di penetrazione sono state portate il più possibile al limite del quartiere riducendo ad una quella di attraversamento. Una piazza esclusivamente pedonale raccoglie il centro sociale, la Chiesa, il cinema, e numerosi negozi. Essa è posta lungo il percorso pedonale che collega da un'estremo all'altro il quartiere, e serve, mediante l'adozione di un solo sovrappassaggio stradale, tutti i servizi più importanti. Su questa rete viaria sono inseriti gli edifici, per conservare le caratteristiche delle città emiliane, nelle quali gli spazi si aprono e si chiudono in un susseguirsi di variabilissimi risultati prospettici. Gli appartamenti sono ordinati a pochi tipi, le strutture portanti sono in cemento armato ed il materiale usato come paramento esterno è principalmente il mattone a faccia vista; gli infissi in ferro finestra sono unificati.

PROGETTI

Settore
e Via Lucca
Gandolfi G.
Settore
e Trieste
Gandolfi G.
Capovilla
Aracchi R.
Gandolfi G.
Casoni L.
Capovilla
Bazzani G.
Calanchi R.
Montini P.
Orlandi M.



1



242


1. Particolare architettonico dell'edificio A -
2. Planimetria generale - 3. Particolare del portico dell'edificio A -
4. Soluzione di testata dell'edificio A verso la Chiesa - 5. Piano tipo e prospetto nord dell'edificio A -
Casa continua -

243

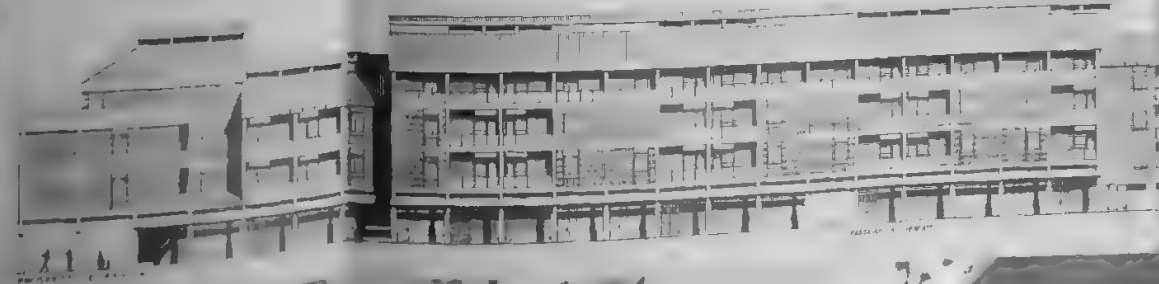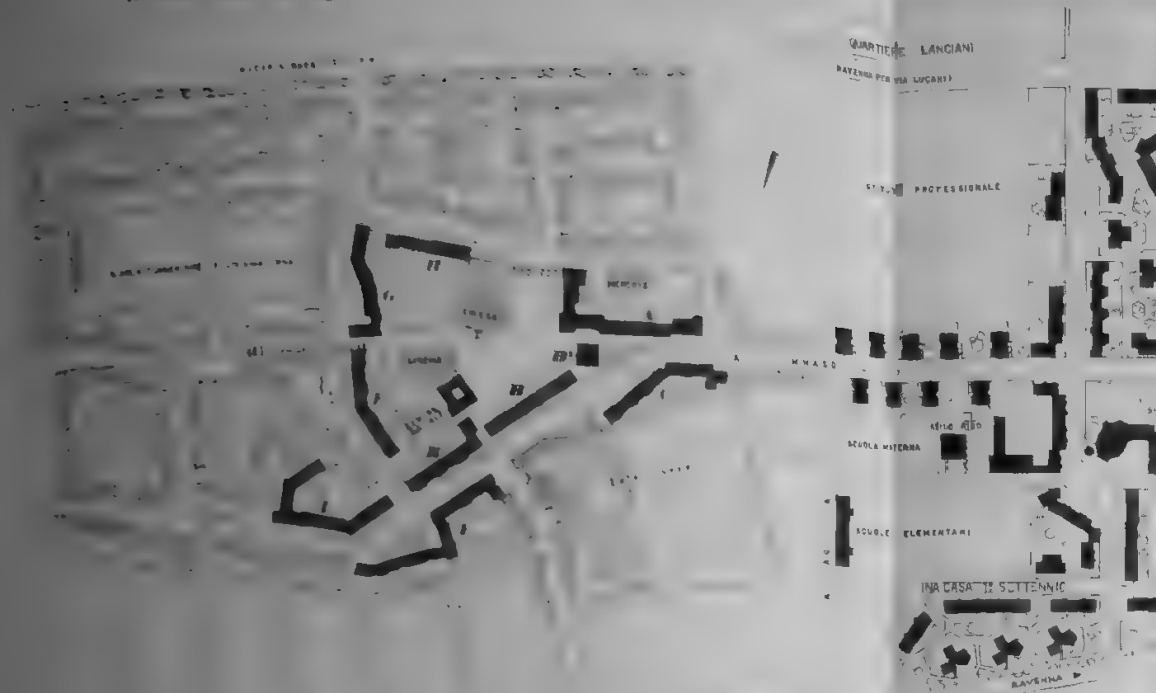



6

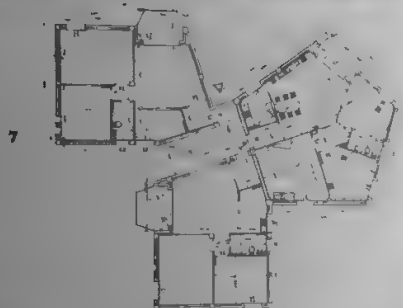

7



f. v. d.
 10. 11.
 12. 13.
 14. 15.
 16. 17.
 18. 19.
 20. 21.
 22. 23.
 24. 25.
 26. 27.
 28. 29.
 30. 31.
 32. 33.
 34. 35.
 36. 37.
 38. 39.
 40. 41.
 42. 43.
 44. 45.
 46. 47.
 48. 49.
 50. 51.
 52. 53.
 54. 55.
 56. 57.
 58. 59.
 60. 61.
 62. 63.
 64. 65.
 66. 67.
 68. 69.
 70. 71.
 72. 73.
 74. 75.
 76. 77.
 78. 79.
 80. 81.
 82. 83.
 84. 85.
 86. 87.
 88. 89.
 90. 91.
 92. 93.
 94. 95.
 96. 97.
 98. 99.
 100. 101.
 102. 103.
 104. 105.
 106. 107.
 108. 109.
 110. 111.
 112. 113.
 114. 115.
 116. 117.
 118. 119.
 120. 121.
 122. 123.
 124. 125.
 126. 127.
 128. 129.
 130. 131.
 132. 133.
 134. 135.
 136. 137.
 138. 139.
 140. 141.
 142. 143.
 144. 145.
 146. 147.
 148. 149.
 150. 151.
 152. 153.
 154. 155.
 156. 157.
 158. 159.
 160. 161.
 162. 163.
 164. 165.
 166. 167.
 168. 169.
 170. 171.
 172. 173.
 174. 175.
 176. 177.
 178. 179.
 180. 181.
 182. 183.
 184. 185.
 186. 187.
 188. 189.
 190. 191.
 192. 193.
 194. 195.
 196. 197.
 198. 199.
 200. 201.
 202. 203.
 204. 205.
 206. 207.
 208. 209.
 210. 211.
 212. 213.
 214. 215.
 216. 217.
 218. 219.
 220. 221.
 222. 223.
 224. 225.
 226. 227.
 228. 229.
 230. 231.
 232. 233.
 234. 235.
 236. 237.
 238. 239.
 240. 241.
 242. 243.
 244. 245.
 246. 247.
 248. 249.
 250. 251.
 252. 253.
 254. 255.
 256. 257.
 258. 259.
 260. 261.
 262. 263.
 264. 265.
 266. 267.
 268. 269.
 270. 271.
 272. 273.
 274. 275.
 276. 277.
 278. 279.
 280. 281.
 282. 283.
 284. 285.
 286. 287.
 288. 289.
 290. 291.
 292. 293.
 294. 295.
 296. 297.
 298. 299.
 300. 301.
 302. 303.
 304. 305.
 306. 307.
 308. 309.
 310. 311.
 312. 313.
 314. 315.
 316. 317.
 318. 319.
 320. 321.
 322. 323.
 324. 325.
 326. 327.
 328. 329.
 330. 331.
 332. 333.
 334. 335.
 336. 337.
 338. 339.
 340. 341.
 342. 343.
 344. 345.
 346. 347.
 348. 349.
 350. 351.
 352. 353.
 354. 355.
 356. 357.
 358. 359.
 360. 361.
 362. 363.
 364. 365.
 366. 367.
 368. 369.
 370. 371.
 372. 373.
 374. 375.
 376. 377.
 378. 379.
 380. 381.
 382. 383.
 384. 385.
 386. 387.
 388. 389.
 390. 391.
 392. 393.
 394. 395.
 396. 397.
 398. 399.
 400. 401.
 402. 403.
 404. 405.
 406. 407.
 408. 409.
 410. 411.
 412. 413.
 414. 415.
 416. 417.
 418. 419.
 420. 421.
 422. 423.
 424. 425.
 426. 427.
 428. 429.
 430. 431.
 432. 433.
 434. 435.
 436. 437.
 438. 439.
 440. 441.
 442. 443.
 444. 445.
 446. 447.
 448. 449.
 450. 451.
 452. 453.
 454. 455.
 456. 457.
 458. 459.
 460. 461.
 462. 463.
 464. 465.
 466. 467.
 468. 469.
 470. 471.
 472. 473.
 474. 475.
 476. 477.
 478. 479.
 480. 481.
 482. 483.
 484. 485.
 486. 487.
 488. 489.
 490. 491.
 492. 493.
 494. 495.
 496. 497.
 498. 499.
 500. 501.
 502. 503.
 504. 505.
 506. 507.
 508. 509.
 510. 511.
 512. 513.
 514. 515.
 516. 517.
 518. 519.
 520. 521.
 522. 523.
 524. 525.
 526. 527.
 528. 529.
 530. 531.
 532. 533.
 534. 535.
 536. 537.
 538. 539.
 540. 541.
 542. 543.
 544. 545.
 546. 547.
 548. 549.
 550. 551.
 552. 553.
 554. 555.
 556. 557.
 558. 559.
 560. 561.
 562. 563.
 564. 565.
 566. 567.
 568. 569.
 570. 571.
 572. 573.
 574. 575.
 576. 577.
 578. 579.
 580. 581.
 582. 583.
 584. 585.
 586. 587.
 588. 589.
 590. 591.
 592. 593.
 594. 595.
 596. 597.
 598. 599.
 600. 601.
 602. 603.
 604. 605.
 606. 607.
 608. 609.
 610. 611.
 612. 613.
 614. 615.
 616. 617.
 618. 619.
 620. 621.
 622. 623.
 624. 625.
 626. 627.
 628. 629.
 630. 631.
 632. 633.
 634. 635.
 636. 637.
 638. 639.
 640. 641.
 642. 643.
 644. 645.
 646. 647.
 648. 649.
 650. 651.
 652. 653.
 654. 655.
 656. 657.
 658. 659.
 660. 661.
 662. 663.
 664. 665.
 666. 667.
 668. 669.
 670. 671.
 672. 673.
 674. 675.
 676. 677.
 678. 679.
 680. 681.
 682. 683.
 684. 685.
 686. 687.
 688. 689.
 690. 691.
 692. 693.
 694. 695.
 696. 697.
 698. 699.
 700. 701.
 702. 703.
 704. 705.
 706. 707.
 708. 709.
 710. 711.
 712. 713.
 714. 715.
 716. 717.
 718. 719.
 720. 721.
 722. 723.
 724. 725.
 726. 727.
 728. 729.
 730. 731.
 732. 733.
 734. 735.
 736. 737.
 738. 739.
 740. 741.
 742. 743.
 744. 745.
 746. 747.
 748. 749.
 750. 751.
 752. 753.
 754. 755.
 756. 757.
 758. 759.
 760. 761.
 762. 763.
 764. 765.
 766. 767.
 768. 769.
 770. 771.
 772. 773.
 774. 775.
 776. 777.
 778. 779.
 780. 781.
 782. 783.
 784. 785.
 786. 787.
 788. 789.
 790. 791.
 792. 793.
 794. 795.
 796. 797.
 798. 799.
 800. 801.
 802. 803.
 804. 805.
 806. 807.
 808. 809.
 810. 811.
 812. 813.
 814. 815.
 816. 817.
 818. 819.
 820. 821.
 822. 823.
 824. 825.
 826. 827.
 828. 829.
 830. 831.
 832. 833.
 834. 835.
 836. 837.
 838. 839.
 840. 841.
 842. 843.
 844. 845.
 846. 847.
 848. 849.
 850. 851.
 852. 853.
 854. 855.
 856. 857.
 858. 859.
 860. 861.
 862. 863.
 864. 865.
 866. 867.
 868. 869.
 870. 871.
 872. 873.
 874. 875.
 876. 877.
 878. 879.
 880. 881.
 882. 883.
 884. 885.
 886. 887.
 888. 889.
 890. 891.
 892. 893.
 894. 895.
 896. 897.
 898. 899.
 900. 901.
 902. 903.
 904. 905.
 906. 907.
 908. 909.
 910. 911.
 912. 913.
 914. 915.
 916. 917.
 918. 919.
 920. 921.
 922. 923.
 924. 925.
 926. 927.
 928. 929.
 930. 931.
 932. 933.
 934. 935.
 936. 937.
 938. 939.
 940. 941.
 942. 943.
 944. 945.
 946. 947.
 948. 949.
 950. 951.
 952. 953.
 954. 955.
 956. 957.
 958. 959.
 960. 961.
 962. 963.
 964. 965.
 966. 967.
 968. 969.
 970. 971.
 972. 973.
 974. 975.
 976. 977.
 978. 979.
 980. 981.
 982. 983.
 984. 985.
 986. 987.
 988. 989.
 990. 991.
 992. 993.
 994. 995.
 996. 997.
 998. 999.
 1000. 1001.


244



10



11



245

Complesso residenziale « via Campana »


Settennato II

Il complesso, sito a 2 km. dal centro della città, è direttamente collegato dalla via Condotti, e sorge su un'area di 8,6 ha. Nella fase di progettazione un vincolo fu imposto dalla previsione della strada di circonvallazione raccordante la S.S. Adriatica con l'Emilia e la Roma che avrebbe attraversato il complesso proprio nel centro. Ciò portò a progettare due nuclei simili collegati da un sistema formato da una strada parallela e da un cavalcavia pedonale. Solo in sede esecutiva fu ottenuto lo spostamento della strada dell'ANAS. Si dovette quindi adattare la planimetria originale alla nuova situazione, rimase però la divisione del quartiere in due nuclei.

Tuttavia sono rimasti validi i rapporti funzionali o di relazione volumetrica fra gli edifici, gli spazi liberi e l'impostazione della circolazione.




Gli edifici sono a 3 ed a 5 piani e comprendono 2.720 vani più a 526 alloggi.

I servizi comprendono: scuola materna, scuola elementare, centro sociale, mercato coperto, 14 negozi di cui 5 con alloggio.



PROGETTISTI

Lugli E. M.
Caporossi G.
Antonelli A.
Lenti S.
Dall'Olio C.
Caporossi G.
Cherubini L.
De Raimi M.
Lambertucci A.
Notti A.
Rozzi L.



1. Inserimento
nella città e pla-
nimetria genera-
le. 2. Veduta
dalla strada di
una spazio inter-
no. 3. Veduta
parziale di alcu-
ni edifici. 4. Piano
tipo di una tor-
re. 5. Veduta di
una corte.



Complesso residenziale ad Acilia


Settennio II

Il complesso è situato in prossimità di Acilia, sobborgo di Roma, su un'area di 11 ha., lina l'autostrada e la ferrovia metropolitana per il lido di Roma, che lo collega direttamente con la stazione centrale della città.




È formato da edifici in linea a 3 o 4 piani che determinano spazi semiaperti, da edifici di tre piani a tre piani e da edifici lungo i pendii; ed infine da edifici a torre che caratterizzano l'intero complesso.

Il nucleo di case unifamiliari per cooperativa, progettate dall'Arch. Doni, gravita sul nucleo centrale. I servizi previsti sono: la scuola materna, la scuola elementare, il centro sociale, mercato, ecc.

I costi previsti sono 2.952, gli alloggi 547.



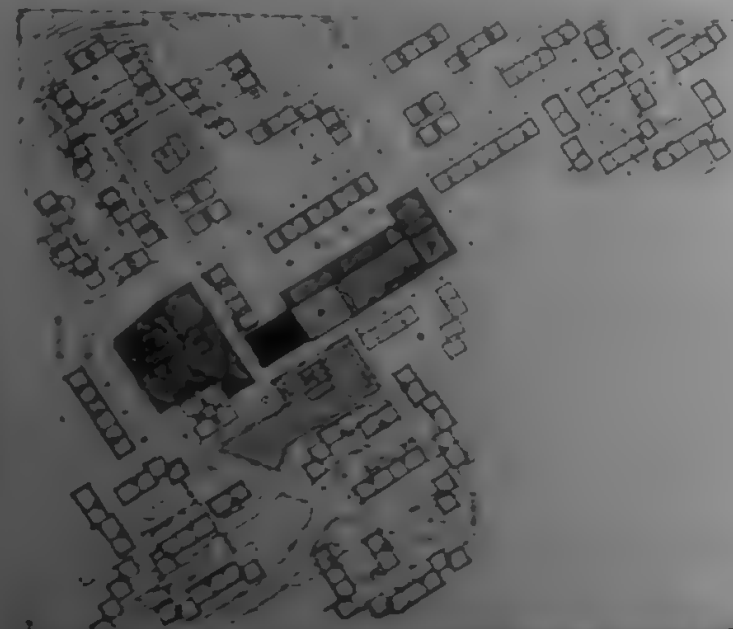


Prosp.
Cavaliere
Del Divo
De Rocco
Diana F.
Cavaliere
Spaccato
Cavaliere
Bacca A.
Bacca F.
Bravo F.
Doni M.




1. Planimetria generale e intermedia nella città - 2. Veduta aerea del complesso con l'adiacente nucleo per cooperative dell'Arch. Doni - 3. Planimetria del nucleo per cooperative - 4. Veduta delle casette unifamiliari del nucleo per cooperative - 5. Prospetti, sezione, piante delle casette unifamiliari nel nucleo cooperative.



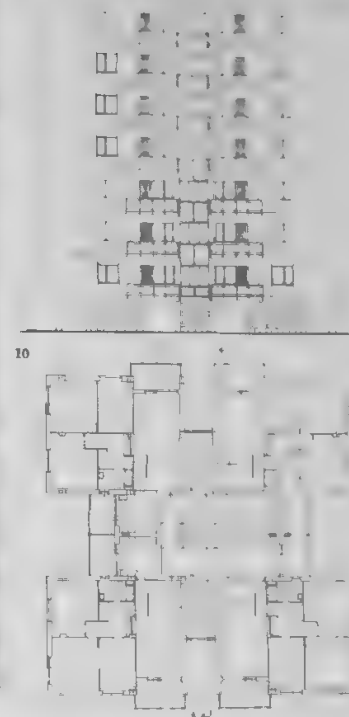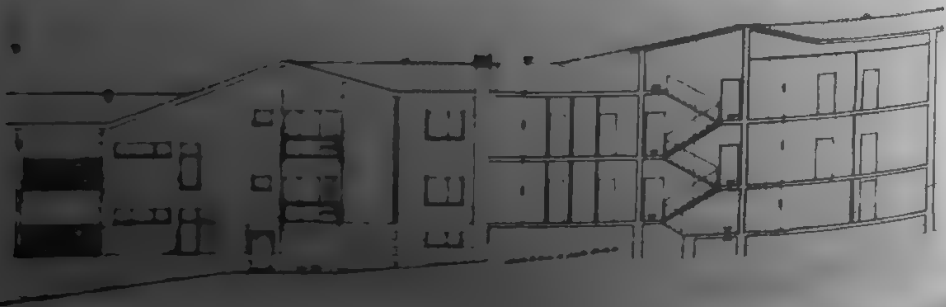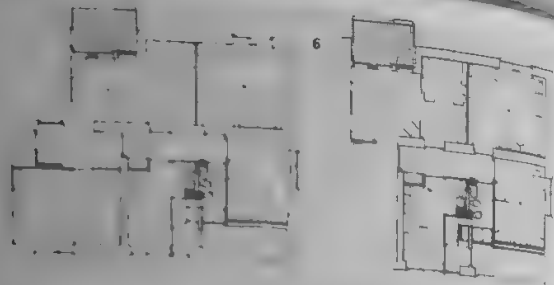

6. Pianta piano tipo delle case a grappolo - 7. Il complesso visto dall'autostrada Roma-Ostia Lido - 8. Veduta parziale di un gruppo di case a grappolo - 9. Prospetto e sezione delle case a grappolo - 10. Edificio a torre con la relativa pianta piano tipo e prospetto sulla scala - 11. Sezione planimetrica delle case a grappolo - 12. Una strada del complesso




Complesso residenziale « Ponte Mammolo »




la via Tiburtina ed il fiume Aniene ed
 Roma è collegata alla città dalle
 ponteggianti che si estendono
 La struttura general
 di conservare il carattere di
 paesaggio
 a senso



3

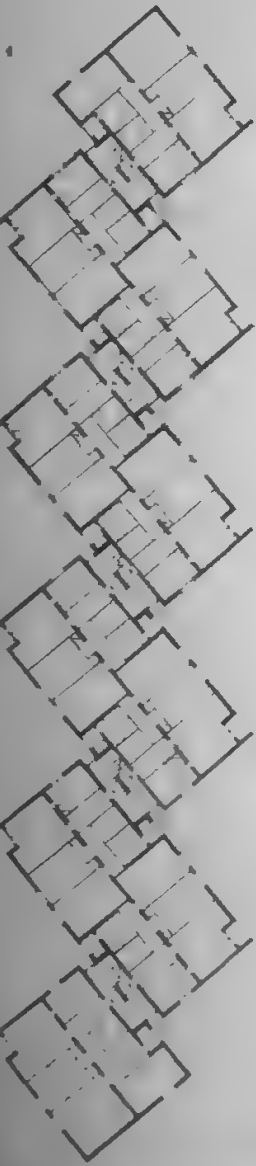

La struttura general
 di conservare il carattere di
 paesaggio
 a senso

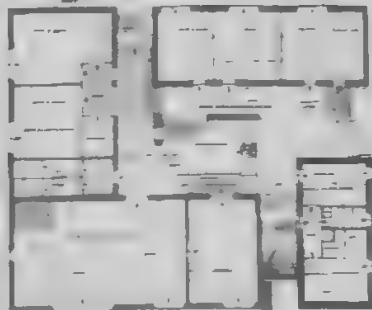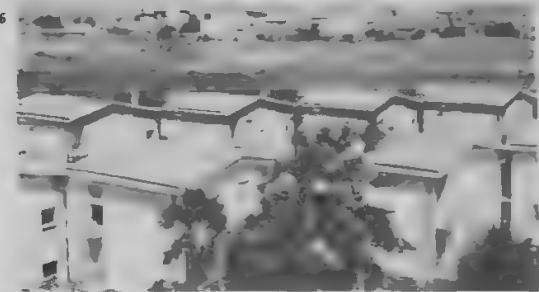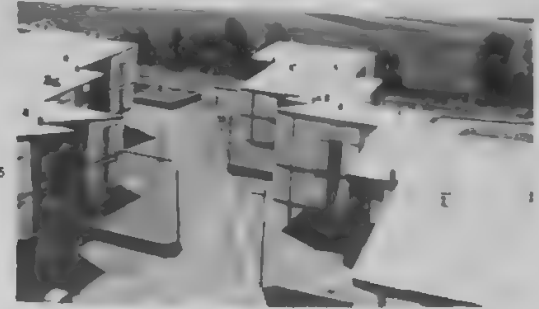

ROMA

Complesso residenziale « Tiburtino »

Settennio I

L'area del quartiere di 88 ha, sita alla periferia di Roma in zona di P.R. lungo la via Tiburtina, è collegata alla città da una linea di servizio.
Questo quartiere rappresenta un esempio di compagine urbanistica che, basata sui pregi di ogni singolo edificio, è stata costruita con la collaborazione degli abitanti della stessa zona.
Il quartiere è diviso in 4 settori, su cui si sono ripartiti i 14 alloggi ad ogni corrispondere 4.000 vani pari a scala. I alloggi per scala sono distribuiti in 14 alloggi per scala, in cui ci sono 3 alloggi per scala e 1 alloggio per scala con annesso 144 vani per scala. Alcuni elementi della progettazione sono stati omessi.
I servizi sono costituiti dai negozi e dal centro sociale.



14



Ayres
Cesena
Firenze
Genua
Lazio
Liguria
Melito
Napoli
Piemonte
Puglia
Romagna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto

1. Piani metota generale - 2. Veduta aerea verso est e veduta zenitale del complesso - 3. Schema planimetrico di un nucleo edilizio - 4. Veduta delle torri e delle sculture - 5. Particolare architettonico di una casa continua - 6. Due esempi di piante del piano tipo per gli alloggi delle case continue.

PROGETTISTI







Aymonino C.
Chiarini C.
Fiorentino M.
Gorio F.
Lugli P. M.
Lenci S.
Lugli P.
Melograni C.
Quaroni L.
Coordinatore
Ridolfi M.
Valori M.

Tiburtina.
ogni singolo
am pari a
alloggio per
oggettazione

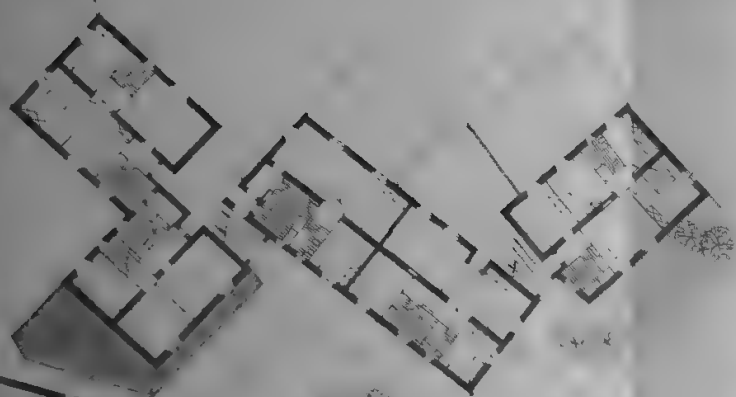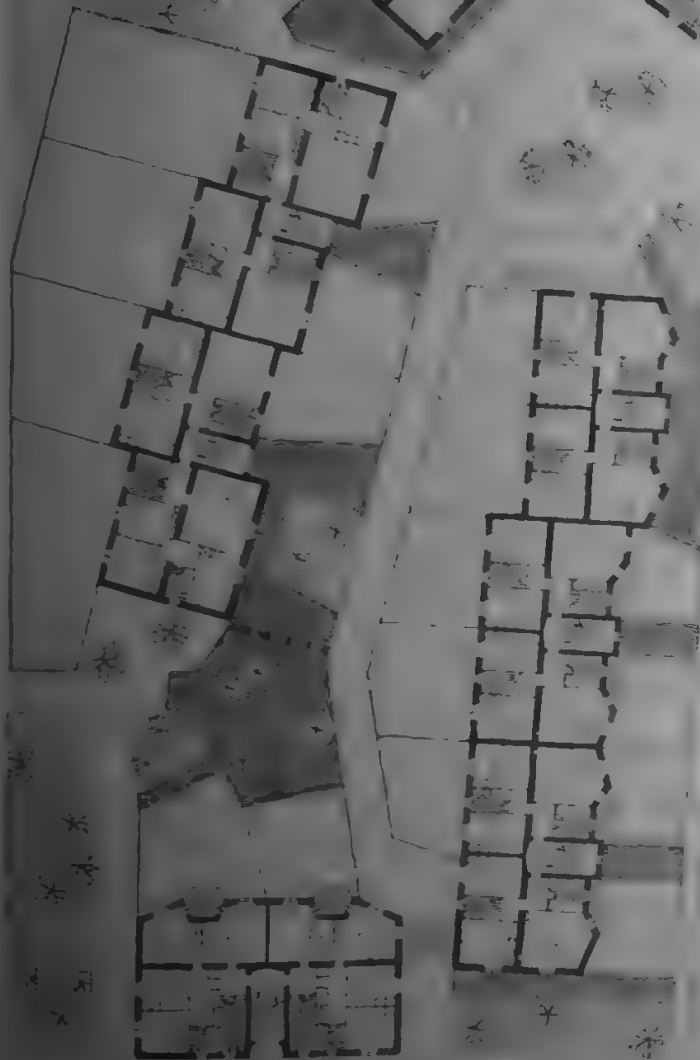

115-1000
115-1001



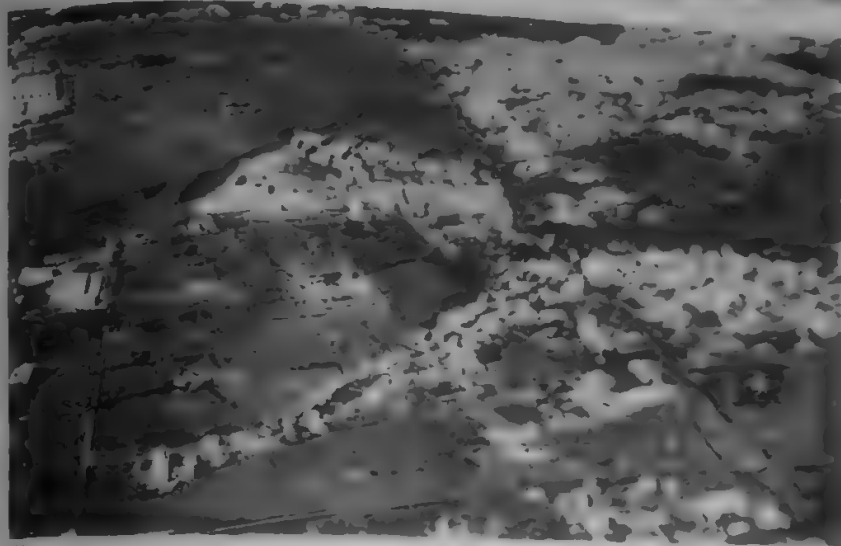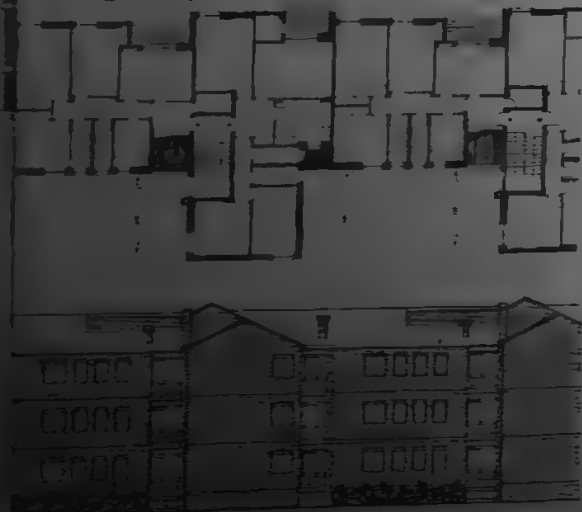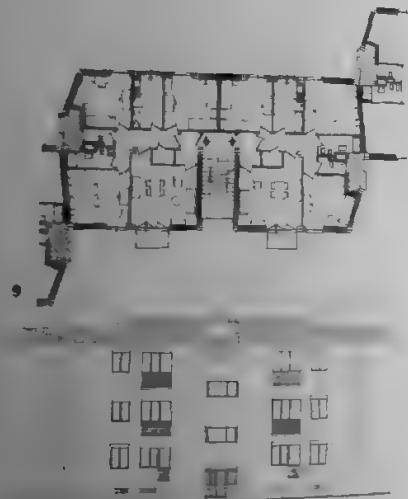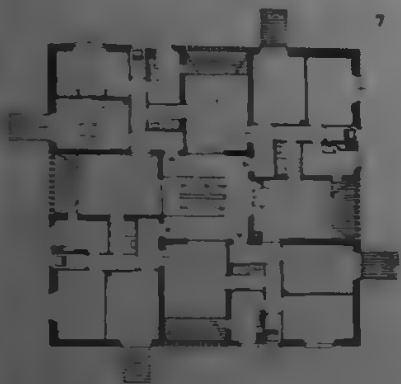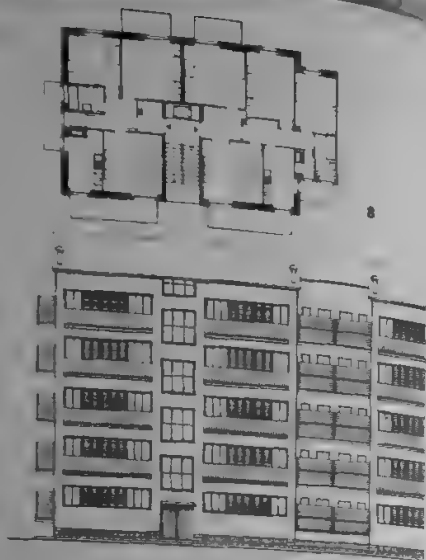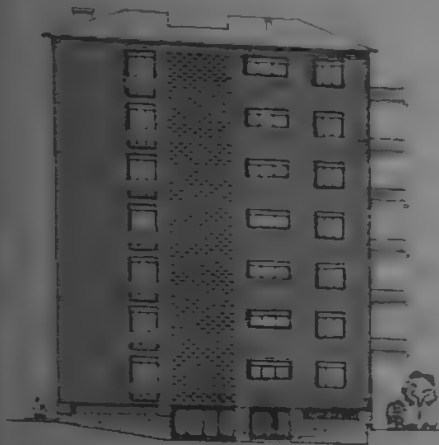

Complesso residenziale « Tuscolano »



Settennio I

Il quartiere realizzato su un'area di ha. 35,5 e comprendente un totale di 17.000 vani pari a 3.150 alloggi, è collegato con Roma per mezzo di linee tranviarie e di autobus sia lungo la Tuscolana che lungo la via del Quadraro. Esso è costituito da tre settori realizzati in tre tempi successivi. Il secondo settore qui illustrato si sviluppa lungo un'asse centrale che collega la via Tuscolana con l'unità di abitazioni orizzontale. Il settore anch'esso documentato. Lungo quest'asse si svolge una spina continua di case a 4 piani fuoriterza, purgate con un leggero angolo a metà circa della sua lunghezza. Perpendicolarmente a questa spina si allineano, in schiere variamente articolate, sia gli edifici a tre piani sono state disposte invece all'estremità di ogni lotto in modo da formare due collane periferiche di torri. Il terzo settore è costituito dall'unità orizzontale di circa 1.000 vani, progettato dall'arch. A. Libera, che chiude a nord tutto il quartiere. Il primo settore si inserì nelle maglie del P.R. di Roma, adattandosi allo schema. I numerosi servizi collettivi e le attrezzature del complesso sono: vari gruppi di negozi, la scuola elementare, la scuola materna, la scuola media, una scuola Montessori, il centro sociale, la Chiesa, il mercato coperto, il campo sportivo, un commissariato di pubblica sicurezza, ecc.







PROGETTI

II Settore
Gambeloni
De Rosa M.
Fariello F.
Muratori S.
Perugini G.
Rossetto G.
Tassinari D.
Vignetti L.
III Settore
Libera A.

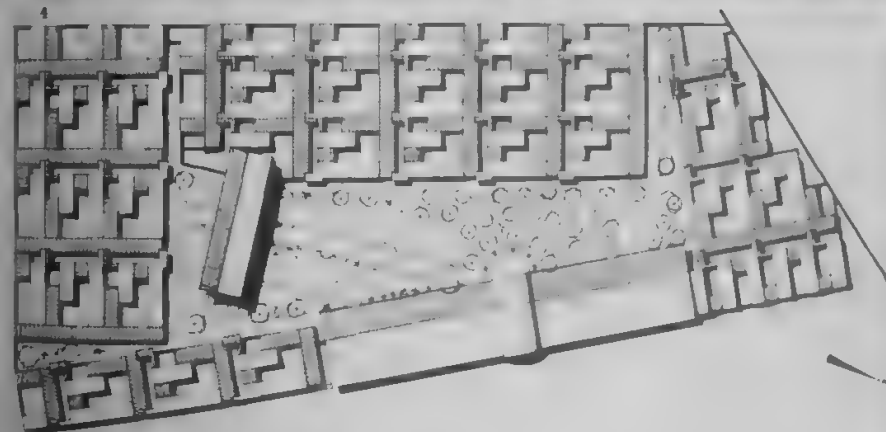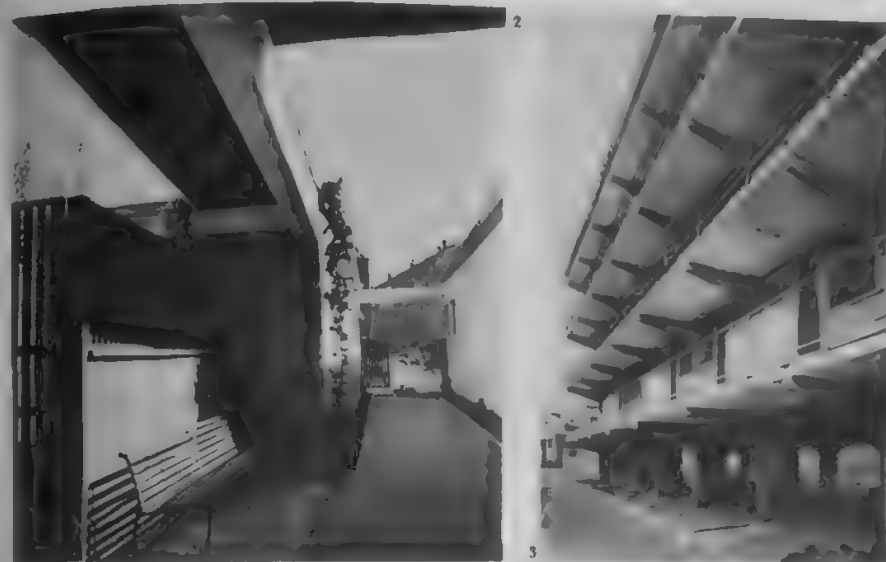


1 Planimetria generale - 2. Una
quadra orizzontale
dell'unità
III settore -
3. Particolare
della casa-bella-
no dell'unità
orizzontale (III
settorio) - 4. Pla-
nimetria dell'unità
orizzontale (III
settorio) - 5. Par-
ticolare planime-
trico dell'unità
orizzontale.

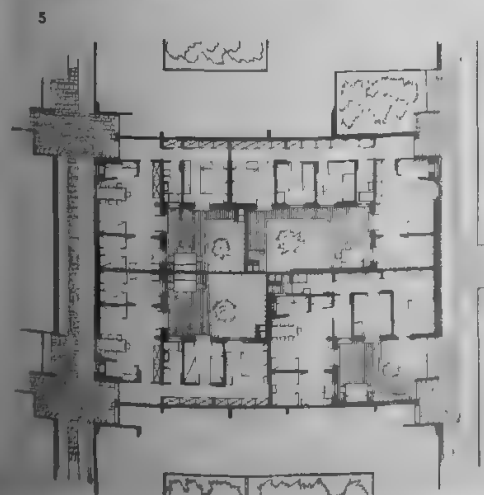

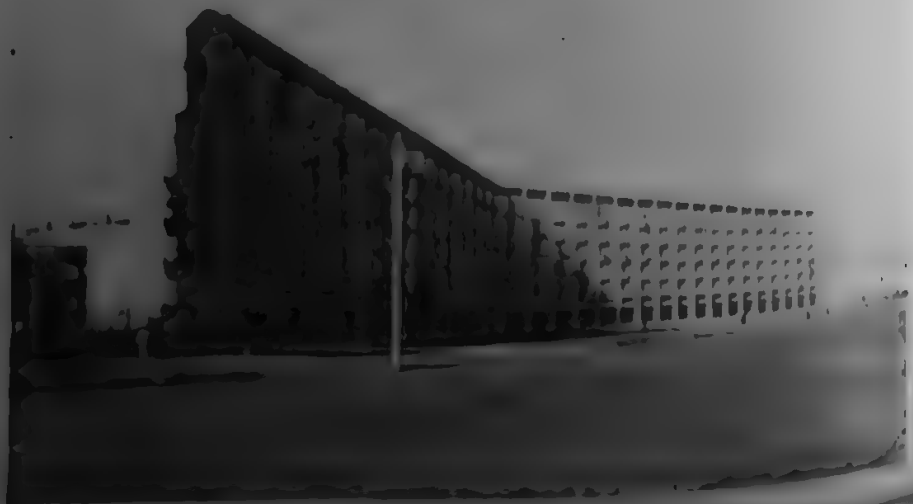


[Faint, illegible handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page.]

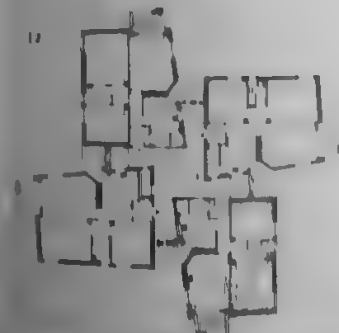


Complesso residenziale « S. Panagia »

Settennio II

L'esigenza di realizzare un insediamento dotato di un centro efficiente ha guidato i progettisti nella stesura del progetto. Una larga strada di circa 50 mt. attraversa l'asse del complesso e collega due ampi spazi alberati, presso i quali sono situati la Chiesa, la scuola elementare, due salotti e il centro sociale. Sulla strada si aprono i negozi, essi si affacciano sulla sede pedonale della via, separata da quella carrabile da un ampio terrapieno alberato che confonde ai due estremi in due spazi verdi. Retrostanti alle prime file di edifici si aprono delle corti rettangolari, nella quale muore un tipo edilizio particolare ad appartamenti duplex. Tali corti godono della vista del centro attraverso ampi vani lasciati al piano terra fra gli alloggi e i negozi degli edifici prospicienti. I tipi edilizi progettati da gruppi funzionali qui sono illustrati sono due, per un totale di 558 vani: uno a diciottova su due piani e l'altro ad appartamenti singoli associati intorno a corti rettangolari su due piani. L'intero complesso realizzato su 12,7 ha. comprende 4.000 vani pari a 760 alloggi.

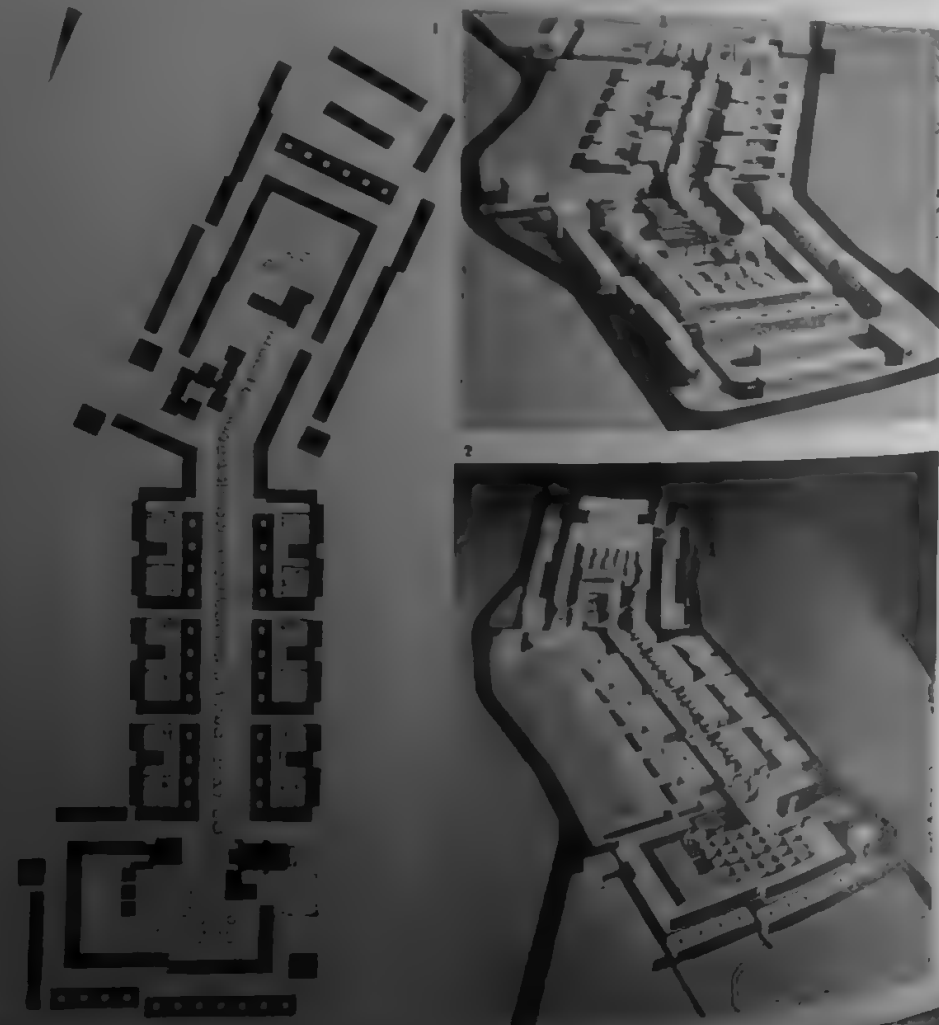

PE 107
 Firenze
 Capponi
 Amato
 Inglese
 Lancia
 Zotti
 Borzaga
 Capponi
 Ciani
 D'Alagni
 Formica
 La...

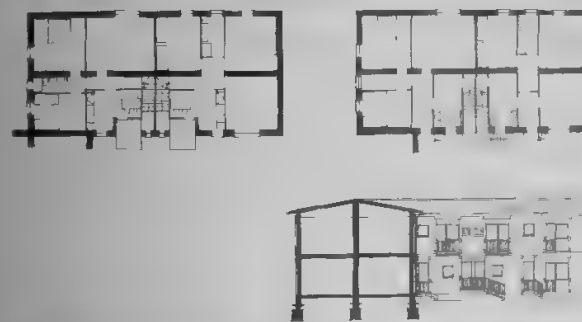


1 Planimetria generale - 2. Vedute d'insieme del parco - 3. Dettaglio architettonico 4. Pianta piano tipo e prospettivazione delle case a schiera - 5. Veduta paratale del complesso.

Complesso residenziale « Falchera »

Settembre 1

L'area destinata al quartiere di ha 29 e situata nel settore settentrionale di Torino, oltre la Stura. Il complesso è articolato in quattro nuclei, disposti intorno al centro comunitario e collegati all'asse di adduzione che congiunge alla Provinciale per Ivrea. Ciascun nucleo è composto di un limitato numero di grandi edifici tutti a tre piani, raggruppati intorno a vasti spazi interni. Ogni edificio consta di tre o quattro ali disposte con varie forme spaziate ad andamento prevalentemente convesso. Gli alloggi sono disposti in parti con i servizi a nord e fronte a sud in parte con doppia esposizione. I locali di soggiorno si aprono su vasti spazi interni agli edifici, orientati a verde, mentre la circolazione principale e secondaria lambisce il lato esterno degli edifici su cui si affacciano scale e servizi. In ogni uno dei quattro nuclei sono contenute una scuola materna e un gruppo di negozi di prima necessità. Nel complesso gli alloggi sono 1.446, con un totale di quali trovano posto: la scuola elementare, la Chiesa con il cinema parrocchiale, il centro sociale, i negozi, le botteghe artigiane ed una autostazione.




Anteprima
Completamento
Molti edifici
Prestazioni
Ritorno al
Racconto



1. Veduta generale del complesso - 2. Planimetria generale - 3. Veduta del piazzale di arrivo al complesso - 4. Serie di piani tipo degli edifici - 5. Intorno alla scala 6. Particolare architettonico di alcuni edifici.



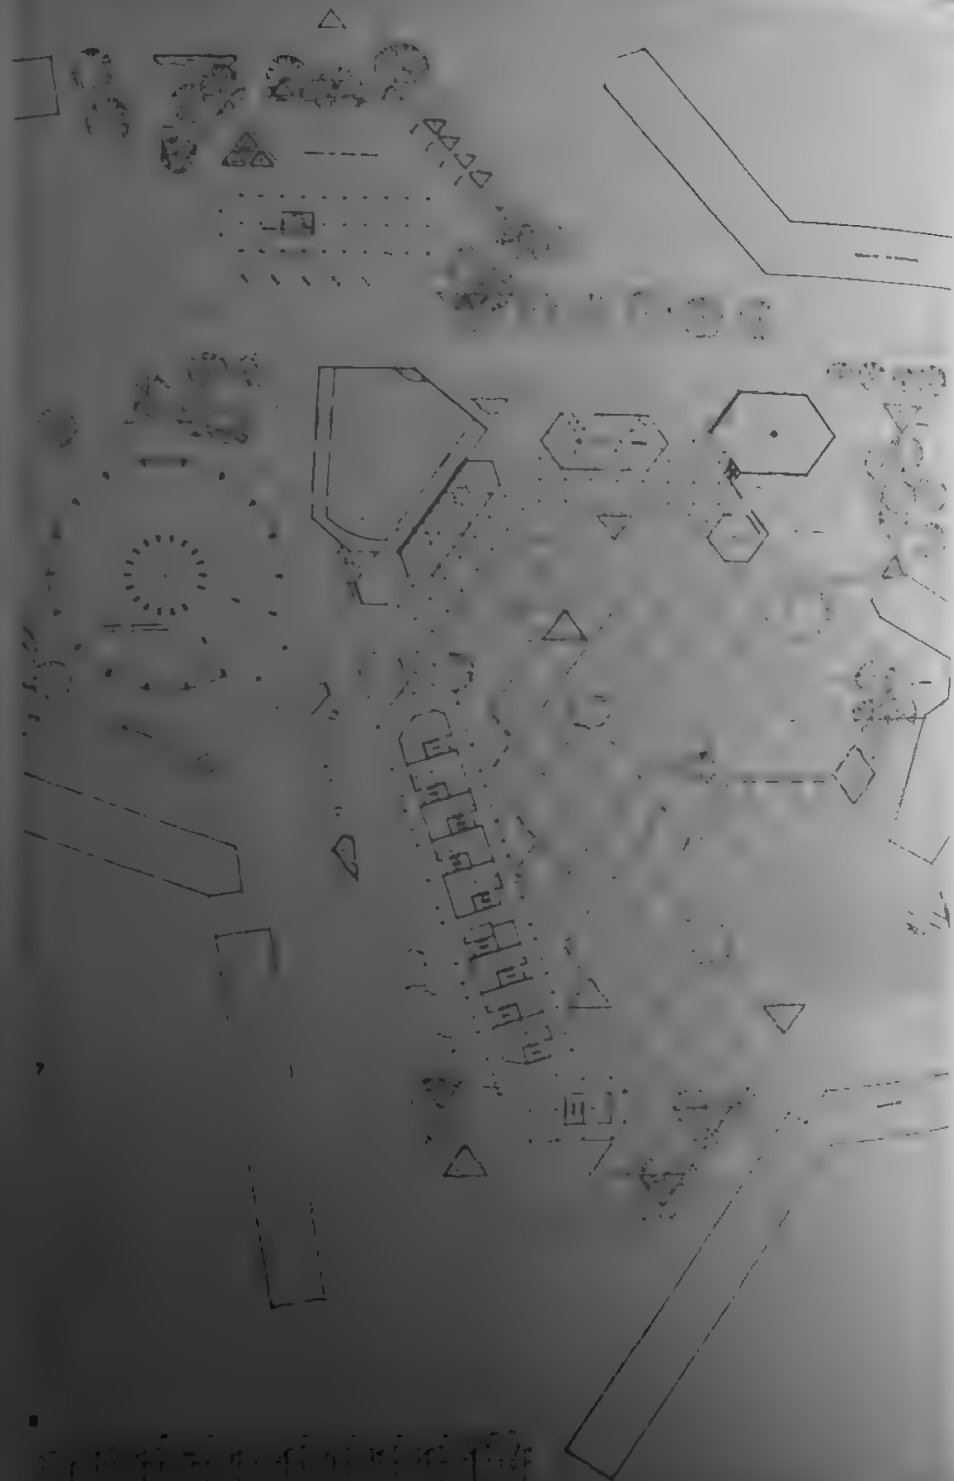

9

10



7. Sezione planimetrica del centro del quartiere - 8. Prospetto del Centro Sociale - 9. Veduta d'interno della piazza della Chiesa - 10. Il Centro sociale del complesso.

TRIESTE

Complesso residenziale « Chiadino in Monte »

Settennio II

Il complesso sorge sopra una lunga ed irregolare collina, il cui versante meridionale è molto ripido. La zona è stata acquistata dalla municipalità di Trieste, che ha commissionato al Gruppo di architetti la progettazione di un complesso residenziale che potesse ospitare circa 1.500 abitanti. La zona è caratterizzata da una morfologia molto particolare, con una serie di colline che si susseguono lungo il versante meridionale. Il terreno è molto irregolare e la progettazione deve tenerne conto. La soluzione adottata è quella di creare un complesso residenziale che si adatti alla morfologia del terreno, con edifici di diverse altezze e forme, che si integrano con il paesaggio circostante. La progettazione è stata curata dal Gruppo di architetti, che ha tenuto conto di tutti i fattori, dalla morfologia del terreno alla necessità di creare un complesso residenziale che potesse ospitare circa 1.500 abitanti.



Monte
Chiadino
Arco L.
Sopra
Tavola
Zoccolo
Mura R.
Cimitero
Grande
Lavoro
Viale P.




1. Prospetto a
ponte degli edi-
fizi a schiera -
2. Veduta par-
ziale di uno spa-
zio interno - 3.
Pianta piano ti-
po e prospetto
della casa conti-
nua - 4. 5. 6. Ve-
dute parziali del-
le case continue
7. Planimetria
generale.

Complesso residenziale « Strà Cassano »

Settennio II

Il complesso è ubicato a nord della città, a circa 2 km. dal centro urbano, su un'area di ha. 10,5 e comprende 746 alloggi pari a 3.525 vani complessivi. Sopra una vasta zona trapezoidale dei lunghi corpi di fabbrica s'incurvano per comporre spazi chiusi e semi-chiusi, ad anello, ad esedra, a corona, a imbuto, ed a questi volumi serpentini si contrappongono quelli lineari delle case a schiera ed a catena. Gli edifici lunghi sono interrotti da passaggi trasversali simili a vicoli, ma coperti dal tetto, che separano i corpi scala. Gli alloggi sono di piccolo taglio, con prevalenza dei tipi da cinque vani. Numerosi i servizi previsti tra cui il centro parrocchiale, la scuola materna ed elementare, il centro sociale, il centro commerciale, campi da gioco, ecc.

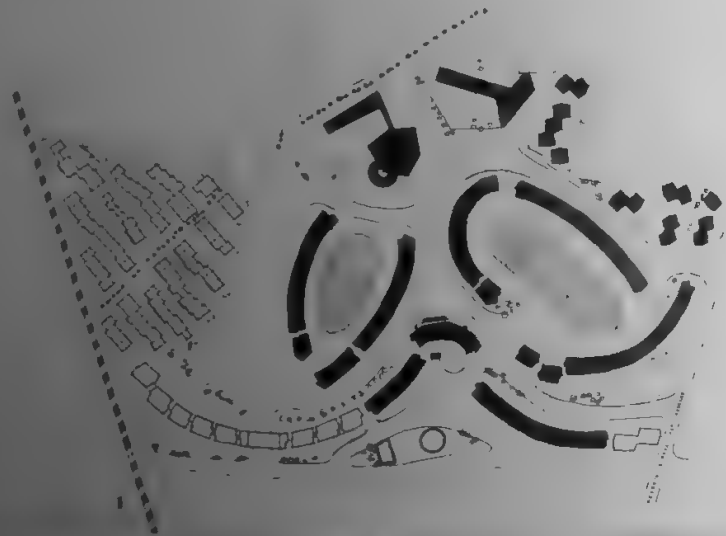

2




272




3

1. Planimetria generale - 2. Pianta della sistemazione urbana - 3. Veduta aerea del complesso - 4. Pianta piano tipo 2 a spicco di un edificio in linea - 5. Pianta piano tipo prospetto di una casa isolata



4



5




273


Complesso residenziale in « via Montorio »

Settembre 11

Il quartiere si sviluppa a nord-est della città su un'area di ha 4,5, in zona di P.R.
 Facendo riferimento al tipo di urbanizzazione del centro parrocchiale, con un sistema di due piazze sulle quali si affacciano i portici, si è creato un complesso costituito da una scuola elementare, dal centro sociale, dal mercato e da un edificio di abitazioni.
 Gli edifici sono disposti in una zona adiacente a viale, intorno a spazi verdi semi-aperti.
 Il complesso è costituito da 100 alloggi, comprendenti 2 072 vani.




Ed. M.
 Campari
 Carini C.
 Carini G.
 Minuti F.

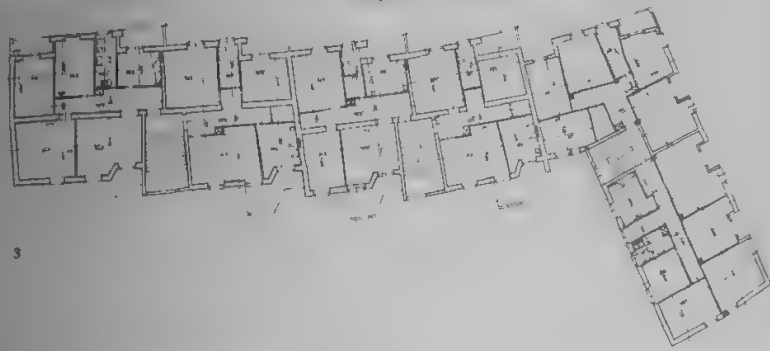


3

4



1. Planimetria generale - 2. L'edificio a portici sulla piazza principale del complesso - 3. Esempio di modo delle case continue: fronte piano tipo e prospetto laterale sulla scala - 4. Edificio a portici sulla piazza principale: fronte piano tipo, pianta del piano sovrastante il portico e prospetto.



5. Centro sociale
 - pianta piano
 terra, primo piano
 e prospetto
 sull'ingresso -
 6. Veduta parzialmente
 del complesso
 - 7. Complesso
 parrocchiale (trasformazione
 della Chiesa) Pianta
 piano terra e
 prospetto verso
 l'ingresso della
 Chiesa.

7



Complesso residenziale «S. Lucia II»

Settembre 11

Il complesso si inserisce nel quartiere sud-occidentale della città con lo scopo altresì, di dare un centro alla intera zona su un'area di 8,5 ha. Essi è improntato sopra un asse principale, una « piazza-strada » sulla quale si allineano i negozi, che ne costituiscono il centro di vita, da questo asse si diramano in formazione regolare, gli spazi secondari. I servizi collettivi sono costituiti dai negozi sotto i portici, da un centro sociale, da una scuola elementare e scuola materna, da attrezzature sportive. I tipi edilizi sono costituiti da case continue multipiani, 3-5 piani con due alloggi per ripiano-scala per un totale di 3.140 vani.





Scenografi
Cassini
Boris G.
Di Cagno
Malacarne
Moroni P.
Ruffi G.
Cassini
Boris G.
Loro
Troyan
Vassini J.

1. Planimetria generale - 2. Veduta di un palazzo - 3. Veduta di uno spazio del complesso e dettaglio di un edificio - 4. Profilo del verde - 5. Pianta e prospetti degli edifici in linea.

PROGETTISTI:

Sacripanti M.
Capogruppo
Bocca G.
Di Cagno N.
Malatesta G.
Moroni P.
Bisioffi G.
Capogruppo
Benatti R.
Loro Cesco R.
Trojani C.
Vincita F.

in centro alla
gozi, che ne
secondari.
a elementare
no-scala, per




VENEZIA

Complesso residenziale « S. Giuliano »

Settembre 1 e 11

Il Questo complesso che sorge in un'area di ha. 34, ai margini della laguna nella zona di Mestre, costituisce un tentativo nuovo progettuale, tra gli studi dei quartieri residenziali. Infatti esso rappresenta un esempio di opera di recupero urbano. Il complesso è frazionato in nuclei di circa 500 abitanti ciascuno, numero che condurrà al massimo possibile per consentire tra gli abitanti relazioni di buon vicinato; ogni nucleo è a sua volta diviso in due sottogruppi separati da uno spazio di sosta alla quale partecipa ogni casa. La spina del quartiere è costituita da una collana di case alte che si snoda longitudinalmente lungo la strada principale centrale che trasporta solamente la filovia. Il traffico veicolare si svolge al contrario all'interno su due strade di scorrimento e penetra all'interno dei nuclei mediante piccole strade con slotti. Le attrezzature ed i servizi pubblici previsti sono numerosi: una scuola industriale, una scuola elementare, 3 scuole materne, 1 mercato coperto, 1 mercato scoperto, cooperativa di consumo, negozi, uffici pubblici, centro ricreativo, culturale, Chiesa ed opere parrocchiali, autoimpressa, 3 sottostazioni filovia, campo sportivo con relative attrezzature. Il quartiere che prevede oltre 10.000 vani, assorbe attualmente 8.200 vani.

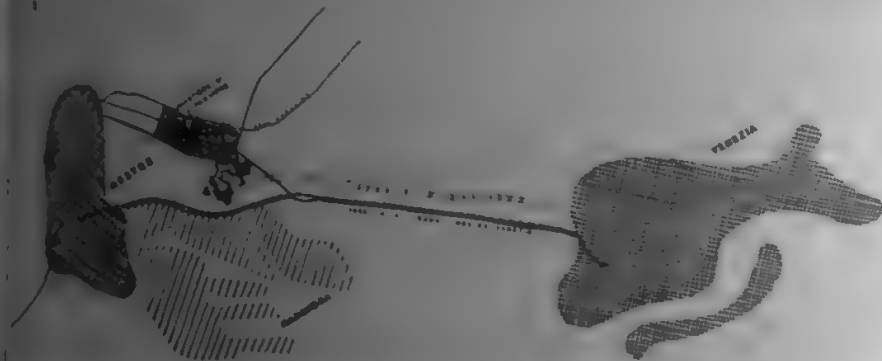

PROGETTO

Settore I Settentrionale

Brusagrin P

Casinato M

Cristofoli C

D'Oria M

Magrin A

Piccinato L

Urbanica corda

Samonà G

Urbanica corda

Scattolon A

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda




Urbanica corda

Urbanica corda

Urbanica corda



1. Inserimento del complesso nella città - 2. Veduta aerea verso est - 3. Planimetria generale.

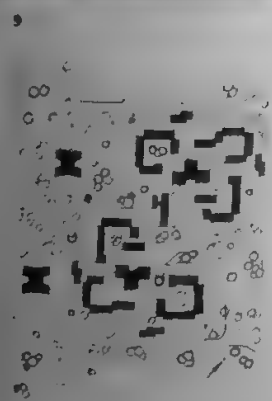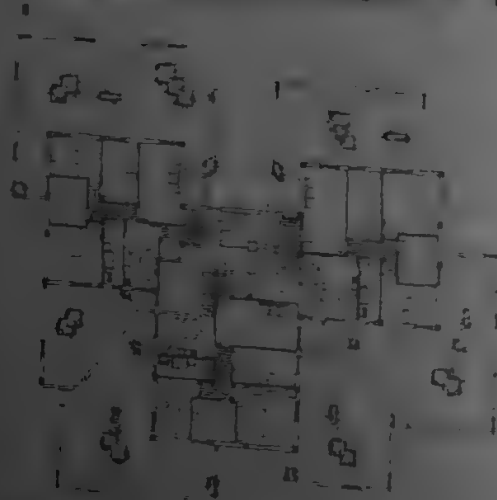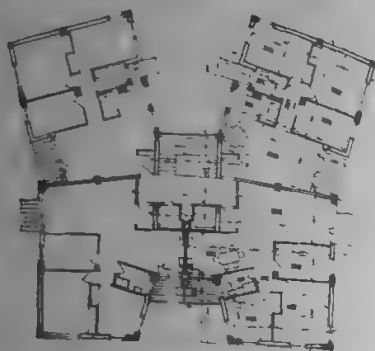


10




4. Pianta piano tipo di due edifici a terra -
5. Veduta di una corte interna alle case duplex -
6. Particolare di un edificio duplex del 1° nucleo -
7. Veduta di una strada interna fiancheggiata da case a schiera -
8. Pianta piano terra di una casa isolata con tre alloggi a piano -
9. Particolare del 2° nucleo -
10. Veduta della Chiesa (costruita dalla Curia) -
11. Pianta di un alloggio duplex (1° nucleo) -
12. Particolare del primo nucleo realizzato d'ufficio -
13. Veduta esterna di un nucleo abitativo.

11



12

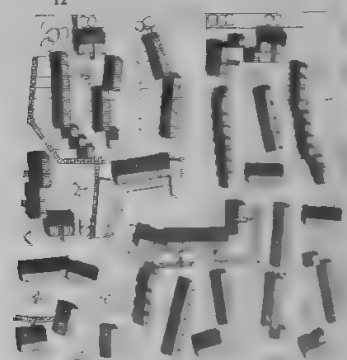

13



VICENZA

Complesso residenziale « Villaggio del Sole »


Seite 11

Il complesso prende nome da un edificio subito ad esso preesistente sul quale chiamato « Casa del Sole ». È una casa costruita dall'Ata a circa 1 km. dal centro, in zona di espansione su terreno pianeggiante delle vicinanze di via S. Maria di Grotte.

la loro ricerca, non solo per le imprese e costruita dai finanziamenti degli spazi verdi e dalle volu-

Nell'area sono presenti solo alcuni insediamenti senza comprometterne la funzione, gli edifici pubblici quali il centro culturale e la scuola, superando l'attuale volume d'notevole sviluppo volumetrico orizzontale, si

In totale 1394 van der 12e Allogi



Practical

Oryzias S.

А. ... С.

17





Р.

1

1. Planimetria ge-
2. Ver-
3. Pianta piano
4. Prospet-
5. Veduta d'in-
6. La
7. Dettaglio del-
8. In-
9. Pianta pia-
10. Continuo on-

PROGETTISTI

Ortolani S.
Carpi Gruppo
Ferrari G.
Grazioli P.
Marcolin M.
Pavesi T.
Todesco B.

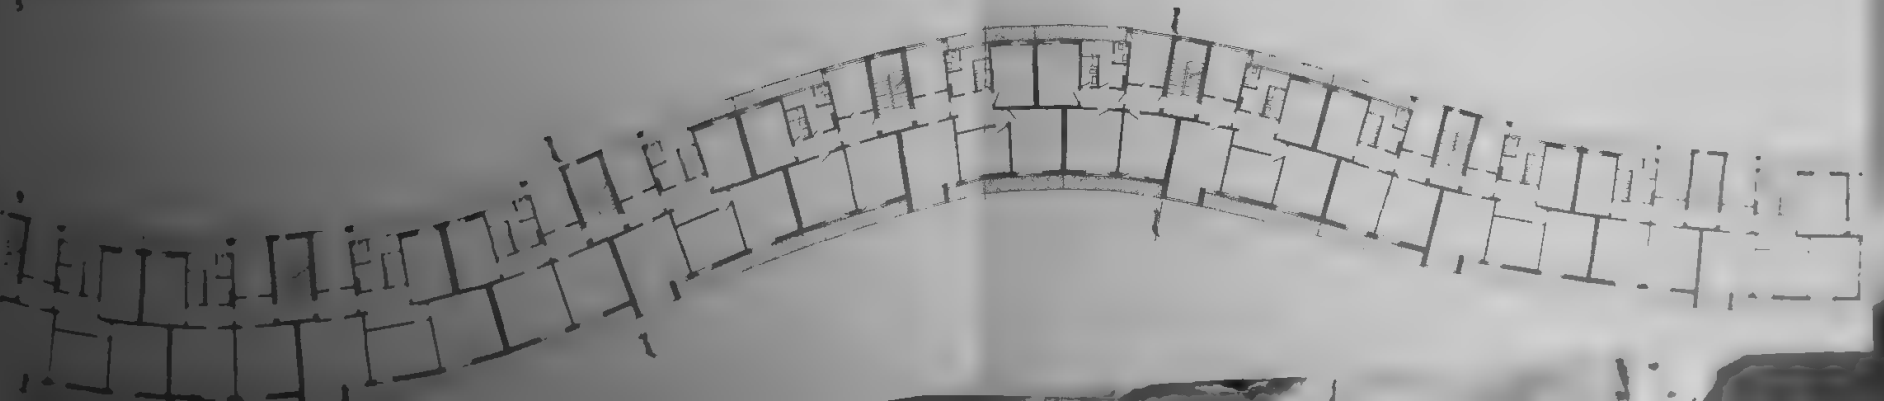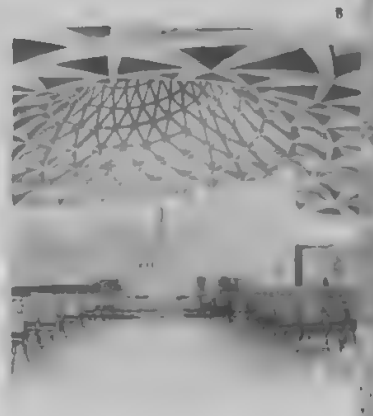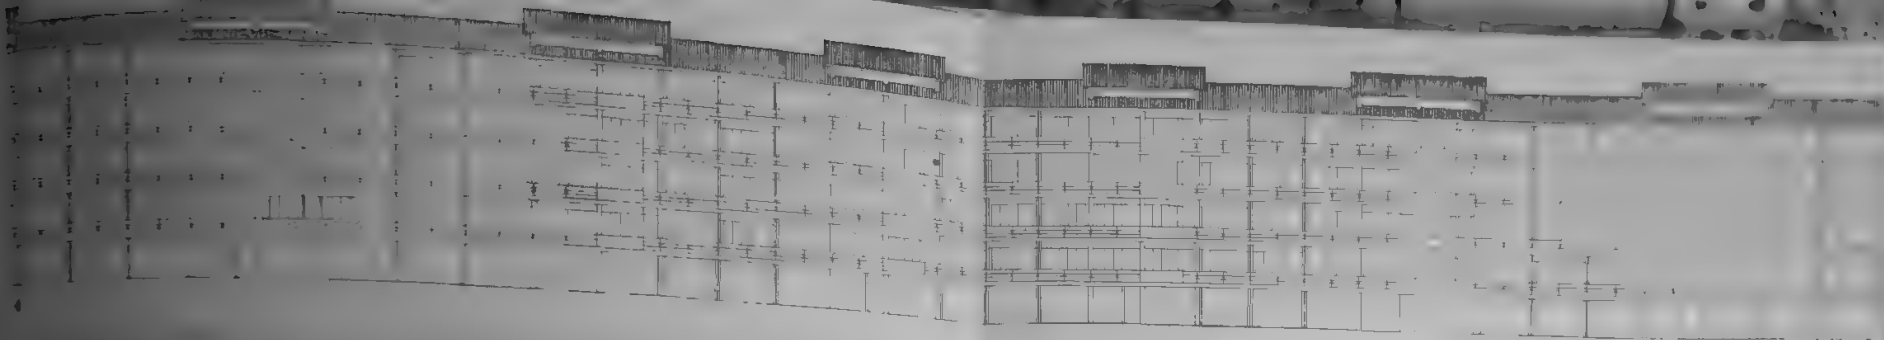

AGRIGENTO

Unità d'abitazione in Porto Empedocle

Settembre 11

Il nucleo edilizio progettato comprende 845 vani pari a 135 alloggi, esso si svolge intorno a una piazzetta di carattere commerciale-residenziale, inaccessibile al traffico veicolare che la lambisce soltanto. Il complesso è costituito da due tipi edilizi fondamentali. Un tipo a due piani è combinato in « insula », ciascuna di otto elementi distribuiti in tre fabbricati, tra loro affiancati, in modo da formare una piccola unità di vicinato, in conformità agli usi ambientali. Gli altri tipi edilizi sono costituiti da edifici a tre piani, nei quali ogni scala serve due soli appartamenti. In considerazione degli oneri di impianto e di manutenzione del verde, le alberature e gli spazi verdi sono stati ridotti al minimo necessario per garantire al nucleo la sua efficienza, mentre è stato previsto di poter salvare una parte delle alberature esistenti, prevalentemente olivi.




PROGETTISTI
Ena N.
Capogruppo
Corbo G.
D'Alessandro R.
Malusardi F.
Minisi F.


1. Planimetria generale - 2. Casa continua, piano tipo e prospetto sulla scala - 3. 4. Schema planimetrico e prospetto est della piccola corsia




2



3



4



ASCOLI PICENO

Unità di abitazione «Le Tofare»

Settembre 11

La zona interessata di 4,5 ha è collegata con la città e i luoghi di lavoro per mezzo dell'Abrutina, strada di traffico veloce che unisce Ascoli Piceno con Teramo. L'unità comprendente 1.081 vani pari a 202 alloggi, è servita da due strade di penetrazione, che sono unite tra loro da stradine a carattere pedonale. I servizi pubblici previsti sono costituiti da due gruppi di fabbricati con negozi, da un centro sociale e una scuola materna. I tipi edilizi adottati sono a 2-3-4 piani, caratterizzati dall'uso di materiale locale (travertino, mattoni gialli, e murature listate).



1



2

PROGETTISTI:
Giordani P. L.
Capogruppo
Carini S.
Coccolini G.
Giulianelli G.
Mentichelli G.
Tomassetti A.




1.2. Planimetria generale e veduta dell'unità.
3. Dettaglio e particolare di un edificio.
4. Prospetto e pianta piano tipo di un edificio.

AVELLINO

Unità d'abitazione S. Tommaso

Settennio II

L'unità abitativa è contigua ad un'altra unità realizzata nel I Settennio: esse sorgono su un'area complessiva di 12 ha sui quali sono stati realizzati 3.100 vani.
L'unità è servita da un sistema di viabilità periferica, mentre il centro è sistemato a verde, e attraversato da vie pedonali.
Le costruzioni sono realizzate in c.a. con tamponature esterne in mattoni e comprendono 1.600 vani per 350 alloggi.

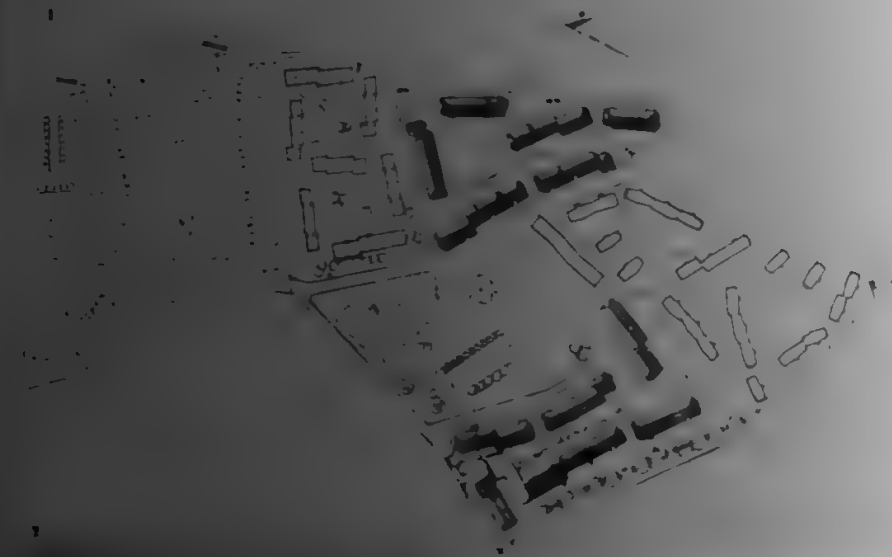

PROGETTISTI

Della Sala
Caporaso
D'Alisi R.
Della Sala M.
Pica Casanova M.
Righetti G.
Siani L.



3

4



1. Planimetria generale - 2. Particolare di una casa in linea - 3. Scorcio di una casa in linea articolata - 4. Pianta del piano tipo e della soluzione d'angolo e prospetto di una casa in linea - 5. Veduta posteriore di un edificio in linea.



BOLZANO

Unità d'abitazione in via Bari

Settembre 11


L'area di circa 1 ha. è situata nel rione « San Giovanni Bosco » ed è compresa fra le strade di P.R.P. Il progetto è stato impostato su tre blocchi principali di notevoli dimensioni, l'andamento curvilineo del perimetro dell'area ha suggerito la disposizione degli assi di questi edifici secondo un criterio radiale a lunga dimensione evitando così allineamenti di spigoli testate fronti, ecc. Altri fabbricati minori a sezione sono stati disposti lungo la strada di sosta.

Ogni alloggiatore gode della vista del paesaggio che delimita la città.

Il traffico dei veicoli si svolge perentivamente all'esterno mentre un'arteria pedonale attraversa all'interno l'area sorpassando gli edifici.


Particolare interessante è costituito dalla centrale termica unica per il riscaldamento degli alloggi.

I servizi collettivi, non sono previsti, essendo la zona già attrezzata; è stata solo progettata una « casa dei bambini » con quattro aule per l'applicazione del metodo Montessori. Il complesso è costituito da 243 alloggi, per un totale di 1.319 vani.

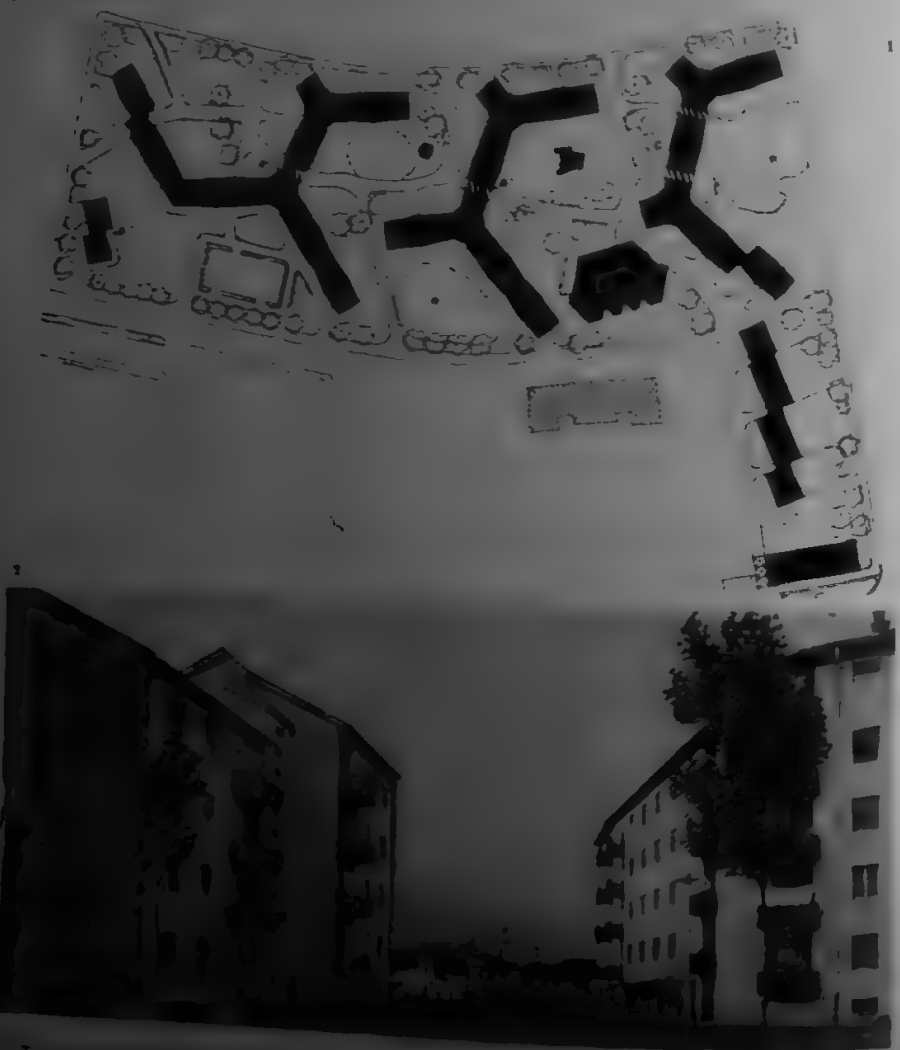

PROGETTISTI

Pellizzari G.
Capogruppo
Dalla Bona L.
Hofer A.
Patis E.
Rovighi A.
Zanetti I.

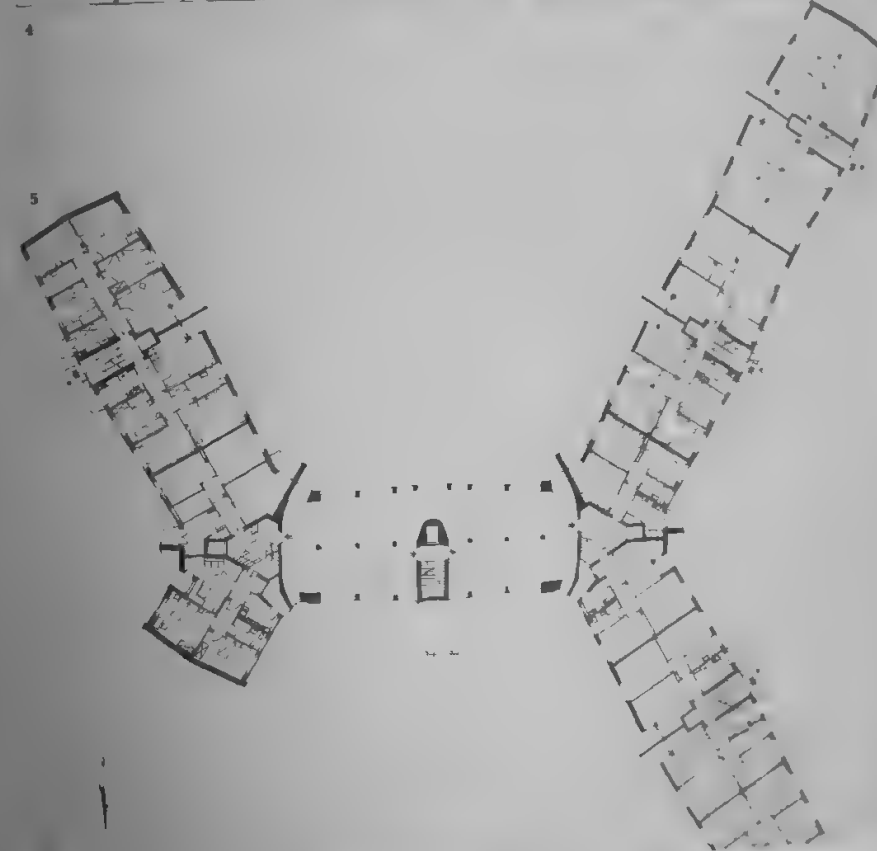



Isometria generale - 2. Veduta di uno spazio interno della città - 3. Veduta di uno spazio interno dell'unità abitativa - 4. Prospetto e pianta del piano di uno degli edifici «abbracciati».

BOLZANO

Unità d'abitazione in via Sassari

Settembre 11

Il complesso sorge in area di collina ad ovest della città, lungo la via Sassari, gli edifici sono disposti in due unità, una a tre piani e l'altra a quattro. Nella prima unità sono aggregati ad essi due edifici con tre e cinque piani, mentre un edificio a tre piani è aggregato alla seconda unità. Il complesso è servito da un centro sociale.

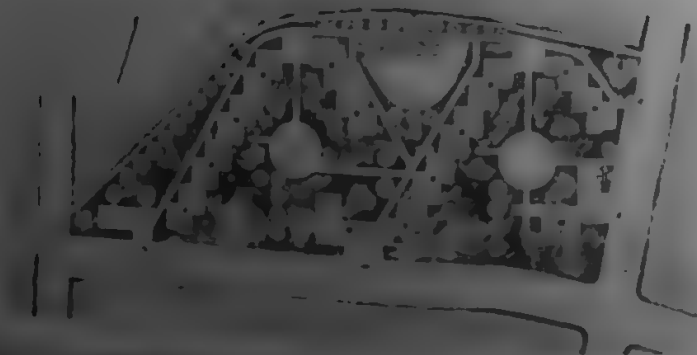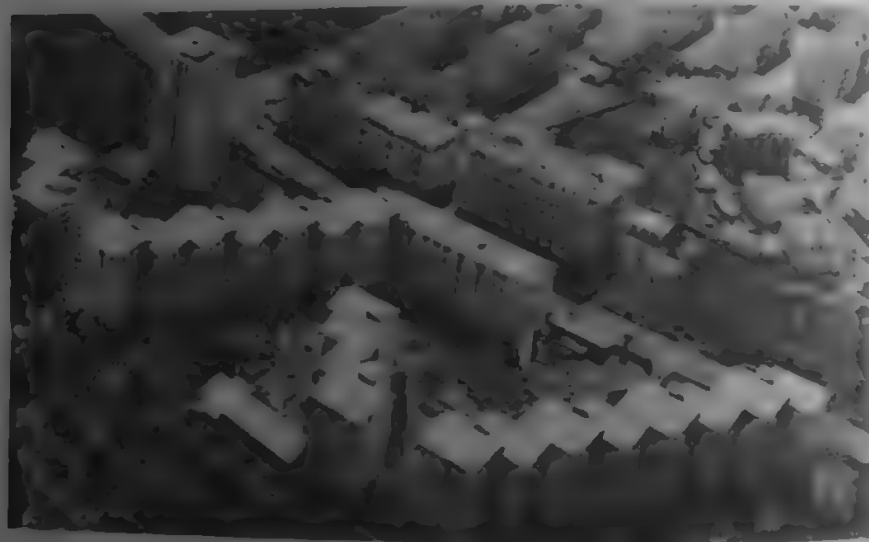


Rocca A
Capomonte

Nella C


I C



3



4



5



6

1.2 Veduta aerea e planimetria
3. Veduta di un edificio
4. Progetto urbanistico
5. Piano tipo e pianta dell'edificio a torre
6. Pianta delle celle abitative.

Unità d'abitazione « Monte Olimpino »

Settembre 11

L'unità, composta di 1.961 vani pari a 172 alloggi, sorge a nord-est della città, a circa 4 km. dal centro cittadino su un'area di 5,8 ha. Essa si adagia su una altura che domina Ponte Chiasso e il confine con la Svizzera in una località assai panoramica. Dal progettista è stata assai sentita l'esigenza di un armonico inserimento nel paesaggio oltre a quella di un organismo inserito nello sviluppo pianificato del territorio comunale. Il progetto prevede il mantenimento di alcune zone verdi, e raccoglie i fabbricati a gruppi intorno a spazi verdi detti e raccolti attorno ad una disposizione libera ed irregolare, accentuata dalle varietà degli elementi edilizi che sono messi piecati e spezzati. L'altezza degli edifici è stata limitata salvo pochi casi a tre piani.

I servizi sono costituiti dal centro sociale, alcuni negozi e l'asilo nido, circondato da una vasta zona verde.



1



2

Progetto

Cerutti E

Capomurro

Bassi F

Ga G.

Monti G.

Moro G.

Lingeri P

Capomurro

Lingeri P C

Lingeri A

Torricelli E

Torricelli C


1. Planimetria generale - 2. Veduta aerea - 3. Pianta piano tipo e prospetto dell'edificio a catena - 4. Veduta invernale del complesso - 5. Un tratto del perimetro esterno - 6. Una veduta d'insieme - 7. Pianta del piano tipo degli edifici sfalsati.

[illegible]

2



1

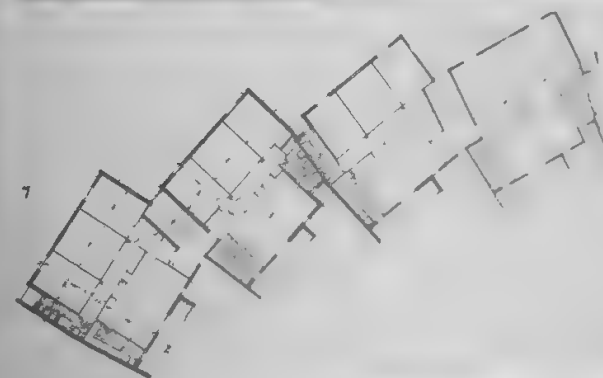

•



Unità d'abitazione « via Ofanto »

Settembre 11

Il complesso sorge su un'area di 13 ha, nella zona sud della città ai margini del tessuto urbano. La disposizione generale è impostata su due piazze tra di loro compenstrate e saldate dall'edificio per collegare le unità a 4 e 4 piani a serie continua che costituiscono l'involucro di questi due spazi, sono disposti secondo la disegnatrice e dotati di verande a sud per la protezione del sole. Tutte le costruzioni sono modulate nella loro parte sul mattone 1 N.I. e provviste di infissi del tipo mono-blocco in profilato metallico. Complessivamente sono stati realizzati 1.210 vani in 210 alloggi.

PROGETTISTI









Chierini C.
Caporosso
Aymonino C.
Aymonino M.
De Risi A.
De Risi B.
Grelli M.

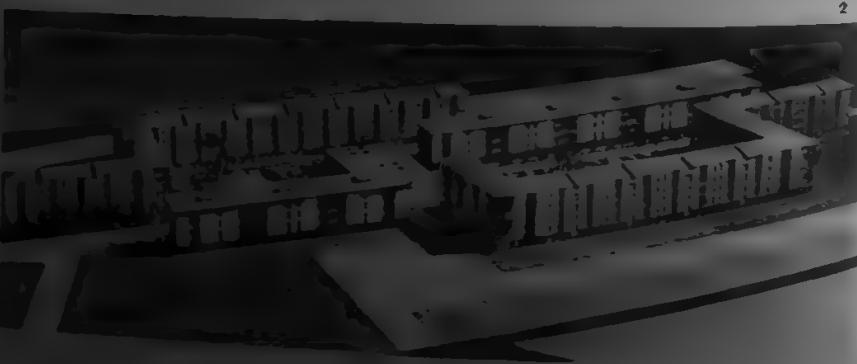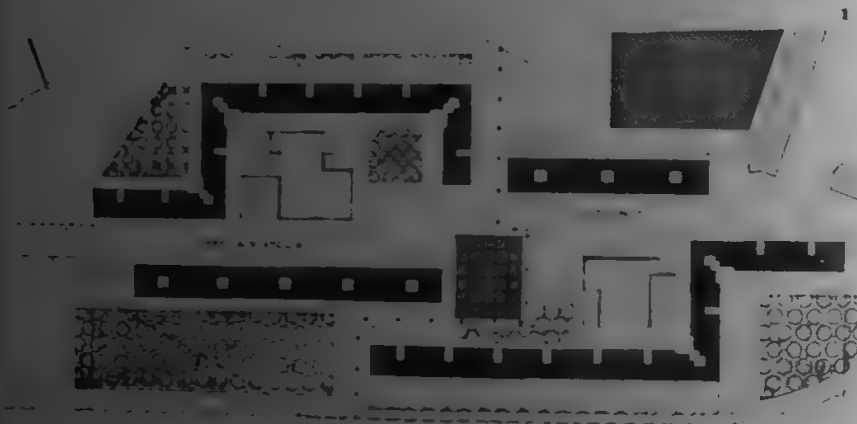

1. 2. Planimetria generale e plastico - 3. 4. 5. Pianta piano tipo e piano ultimo, sezioni e prospetti di un edificio in linea - 6. 7. Pianta piano terreno, piano tipo, schema della struttura e prospetto-sezione dei punti di snodo di un edificio articolato - 8. 9. 10. Prospetti, sezione, pianta piano terreno e piano tipo della soluzione di testata per gli edifici articolati.

PROGETTISTI:

Charini C.
 Gruppo
 ymonino G.
 ymonino M.
 e Rossi A.
 e Rossi B.
 irelli M.

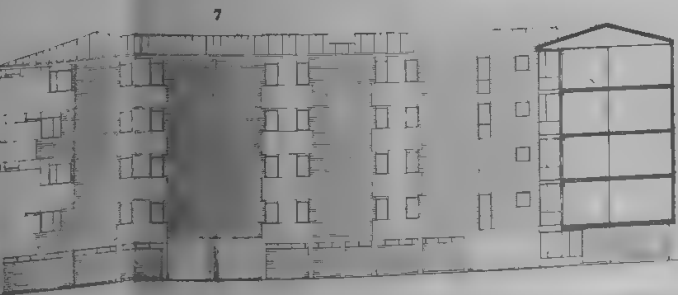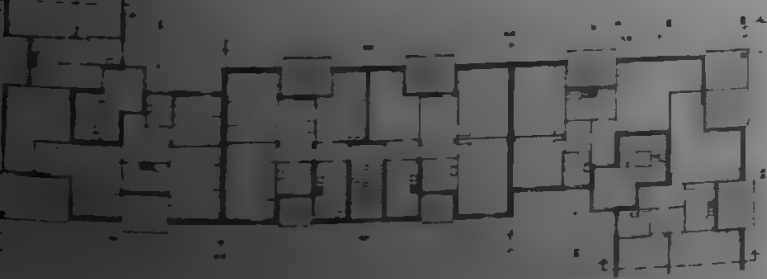

10

9

6

7

Unità d'abitazione « Uliveto »


Settennio II

L'ubicazione dell'area, di 3 ha., al limite nord della zona di espansione di P.R.G. sulla S.S. 16 ha comportato un complesso di servizi necessari anche alla futura edilizia privata.

L'organizzazione interna dell'unità di abitazione, che prevede 950 vani per complessivi 180 alloggi, è concepita in modo da ottenere la massima ampiezza e concentrazione delle aree libere in un complesso unitario centrale (parco con attrezzature, con possibile recinzione e sorveglianza).


L'orientamento, prevalentemente nord-sud, delle strade residenziali e delle schiere di abitazioni, costituisce la prima determinante della composizione. La seconda determinante è costituita dalle attribuzioni patrimoniali delle aree che sono il cardine della vita delle unità: nessuna è condominiale, perché esse sono pubbliche e una minima parte private.

La terza determinante è costituita dal verde. In particolare le preesistenze arboree hanno costituito l'elemento sul quale l'unità è stata caratterizzata e strutturata, il maggior possibile ad anfiteatro, attorno al verde centrale in una forma conclusa.

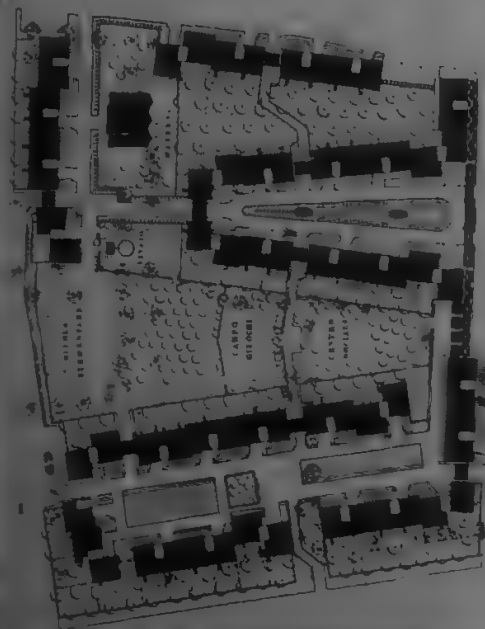

PROGETTISTI

Gabianca P.
Caporizzo
Boracci - Gladi F.
Bubbico V.
Gennari Sazio
ri D.
Piccioni M.
Riccardi G.
Trunfio M.

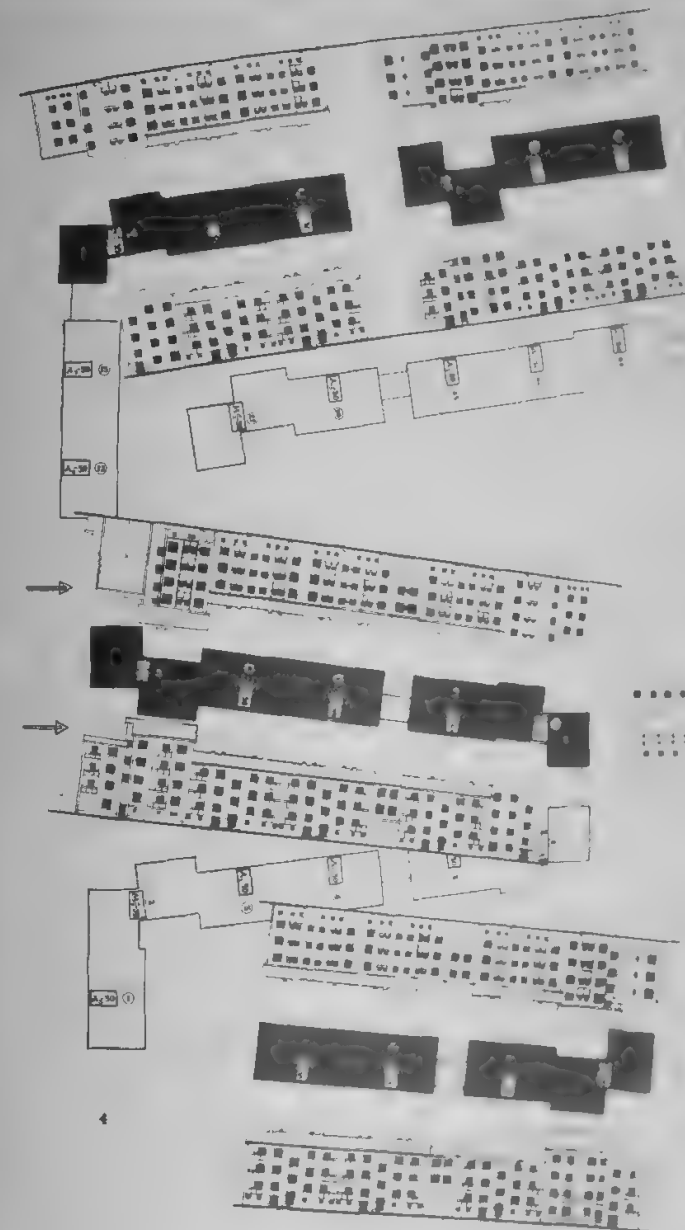


1. Planimetria dell'unità - 2. Veduta di uno spazio alberato interno all'unità - 3. Sezione di uno spazio interno - 4. Sezione planimetrica e profili urbanistici - 5. Pianta piano tipo di un edificio in linea - 6. Pianta tipo di una soluzione di modo.



Unità d'abitazione « Campo di Marte »

Settembre 1

Il complesso costituisce l'estrema espansione a sud del nucleo cittadino ed occupa un'area di circa 1,5 ha. La progettazione è stata vincolata dalla presenza di tre edifici preesistenti e dalle strade di accesso obbligato. I tipi edilizi sono costituiti da una cortina di edifici a tre piani articolata su una linea obliqua e da una seconda fila di edifici a quattro piani lungo la via di P.R. Due fabbricati a due piani concludono un ambiente edilizio ben caratterizzato nel cui spazio centrale è disposto un edificio stellare a cinque piani che risulta dominante sugli altri. In prossimità di esso sono ubicati i servizi sociali suddivisi in due edifici: uno per l'asilo infantile e due aule con annessi ambulatorio medico farmacia ed una abitazione per il custode. L'altro per il centro sociale con sale di lettura e biblioteca. In totale sono stati costruiti 110 alloggi per 562 vani legali.

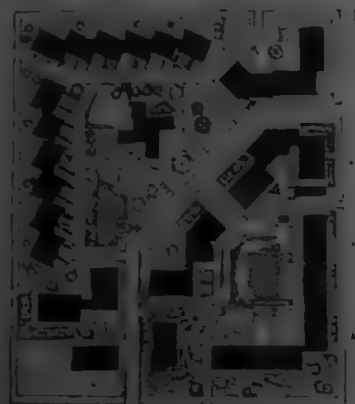

1. Planimetria generale - 2. Veduta della casa stellare - 3. Piano tipo e prospetto della casa stellare - 4. Altra veduta della casa stellare - 5. Pianta e prospetti delle aule - 6. Veduta parziale della unità.



PROGETTISTI:
Marconi P.
Fioroni G.



GENOVA

Unità d'abitazione « Bernabò Brea »

Settembre 1961

Questa unità residenziale di 1.000 vani pari a 368 alloggi è l'unico esempio realizzato dall'INACASA di quartiere abitato in un'area di 4,5 ha., preesistente in area di P.R.

La maggior parte delle abitazioni è stata conservata e nuovi spazi verdi sono stati organizzati, con aggiunta di piante a basso fusto.

Il complesso è situato dalla via Sturla che lo collega mediante una traversa al centro cittadino.

I servizi collettivi sono costituiti da una scuola elementare, un centro di assistenza sociale, una palestra, una sala per le riunioni, una biblioteca, una sala per le feste.

Gli edifici sono prevalentemente rivestiti in ceramica, ma alcuni sono rivestiti in stucco, altri in mattoni e alcuni in legno.

L'altezza media degli edifici è di tre ai cinque piani, con eccezione per l'edificio che chiude trasversalmente a tutti i quartieri che ha un'altezza di nove piani.



PROGETTISTI

Dameri L. G.
Grossi Bianchi L.
Zeppa G.


1. Planimetria generale - 2. Dettaglio dell'edificio con galleria - 3. Pianta delle solanoni di testaia per l'edificio con alloggi - 4. Pianta al piano tipo e piante piani terreno ricinto degli alloggi duplex - 5. Prospetto dell'edificio con galleria - 6. Due sezioni del complesso - 7. Prospetto dell'edificio con galleria - 8. Veduta panoramica.

PROGETTISTI
 Daneri L. G.
 Grossi Bianchi L.
 Zappa G.

SA di
 giunta
 una
 vestite
 versal-



3



4



1. Pianta di sezione - 2. Taglio del piano - 3. Pianta di sezione - 4. Pianta di sezione - 5. Pianta di sezione - 6. Pianta di sezione - 7. Pianta di sezione - 8. Pianta di sezione - 9. Pianta di sezione - 10. Pianta di sezione



5



6



7




8

GENOVA

Unità d'abitazione in «Prà-Italsider»

Settembre 11

Questo complesso di 120 vani, più a 190 ad essi progettato dal gruppo Ginatta, sorge su di un'area di 3 ha attualmente servita dalla via Brignone, che si apre dalla via Aurelia in direzione nord-sud. La viabilità è impostata su di un'arteria principale che partendo dalla via Brignone raggiunge gli edifici mediante viali secondari. Le vie pedonali, larghe, attraversano per mezzo di porticati, attraverso l'area destinata ai servizi collettivi, il sistema di via Chiesa, una strada sotterranea in cemento sovrapposta. Lo studio dei tipi edilizi è stato impostato su base modulare, in modo da consentire l'impiego di elementi ubiqui in tutte le costruzioni e l'adempimento di criteri di prefabbricazione. Due edifici del complesso sono costruiti in struttura portante in acciaio, manifestata in vista all'esterno; le pareti perimetrali sono autoportanti su intelaiatura in profilati piegati a freddo, in lamiera zincata, telai a vetro e pannelli scolorati con doppia parete in lamierino di zinco, scalfati all'esterno ed isolante interposto. Gli elementi di parete sono collegati alla struttura principale con interposizione di giunti, per l'attenuazione della trasmissione dei rumori e delle vibrazioni. Gli altri edifici sono costruiti sulla stessa maglia modulare degli edifici in acciaio, con struttura portante in vista in cemento armato e tamponature in muratura.

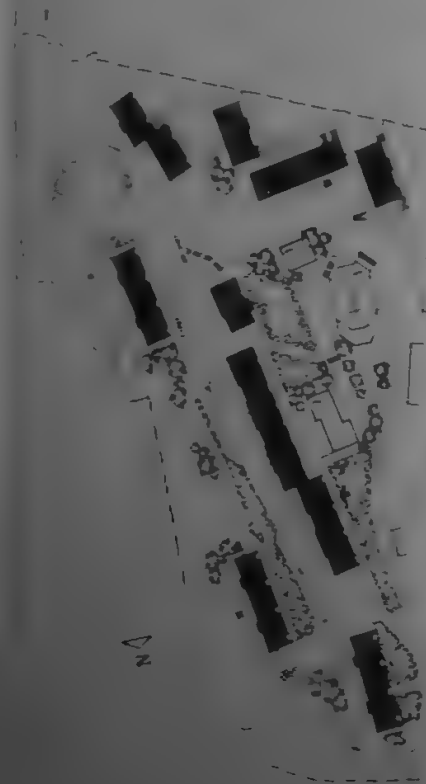


PROGETTISTI
Ginatta G.
Ginatta R.



3

1. Planimetria generale - 2. Uno dei due edifici con struttura in acciaio - 3. Dettaglio di una facciata - 4. Pianta e prospetto dell'edificio a 14 piani -



4






5




6





7



8



5. Dettaglio dell'attacco a terra
6. Pianta di un alloggio - 7. Veduta della struttura - 8. Particolari costruttivi - 9, 10. Alcuni nodi della struttura.

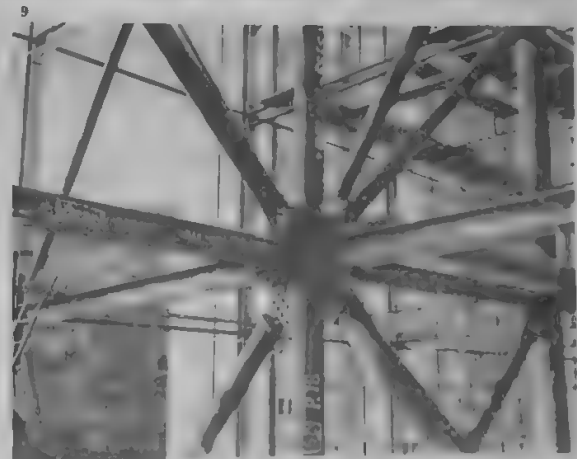

L'AQUILA

Unità d'abitazione « Manetta »

Settennio II

L'unità è ubicata in località Manetta sulla strada comunale Colle Brincione. È collegata alla città mediante servizio di autobus urbani.


L'unità comprende elementi volumetricamente semplici, disposti in modo da costituire un complesso gravitante sul centro e composto in modo da offrire sempre diverse vedute prospettiche.

I servizi comunitari prevedono un piccolo mercato coperto, un edificio scolastico comprendente scuola materna e scuola elementare ed un gruppo di quattro negozi situati in luogo centrale.

Le sistemazioni esterne sono state previste parte su aree verdi condominiali, parte su aree a servizio degli appartamenti del piano terra, parte infine su aree pubbliche.

Sulle aree verdi sono previste piantagioni di lecci ed abeti.




Le costruzioni sono raggruppate in cinque tipi edilizi e prevedono 162 alloggi pari a 848 vani su un'area di 2,9 ha.

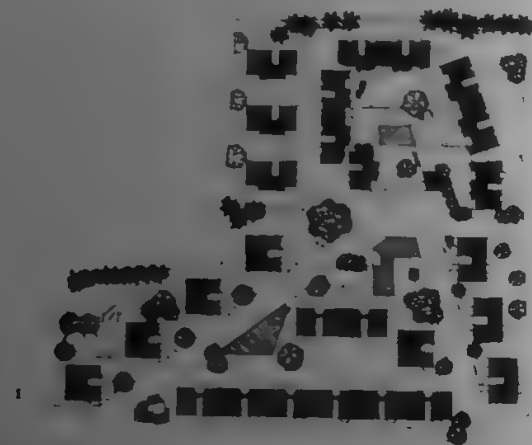

1. Planimetria generale - 2. Veduta parziale di un edificio in linea
- 3. Profilo urbanistico - 4. Pianta piano tipo delle case continue
- 5. Pianta piano tipo di una casa isolata - 6. Prospetto di un edificio a portico
- 7. Pianta piano tipo di una casa isolata - 8. Profilo urbanistico
- 9. Veduta di alcuni edifici dall'esterno del quartiere

PROGETTISTI:

Lenti E.
Capogruppo
Borgia E.
Mascetti G.
Sbriccoli R.
Tomassi E.

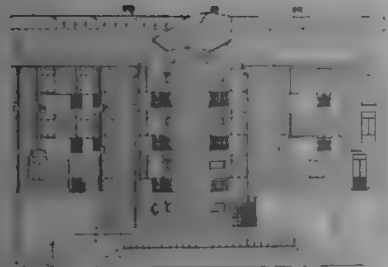

1. Planimetria generale - 2. Veduta parziale di un edificio in linea - 3. Profilo urbanistico - 4. Piano tipo di una casa - 5. Piano tipo di una casa isolata - 6. Prospetto di un edificio a portico - 7. Piano tipo di una casa isolata - 8. Profilo urbanistico - 9. Veduta di alcuni edifici dall'esterno del quartiere


MATERA

Unità d'abitazione « Villalongo »

Settembre II

Il complesso sorge a 1 km circa dal centro di Matera, sulla statale Appia; ed è stato inserito nella continuazione di una grande zona a verde prevista dal piano regolatore. Sul terrazzo pianeggiante, di 5 ha circa, sono stati sistemati gli edifici rialzati dal suolo ed a piani sfalsati. Tutti i fabbricati denunciano all'esterno la struttura in cemento armato con i pannelli di tamponamento integrati.

Gli alloggi sono un numero di 285 per complessivi 1.482 vani.

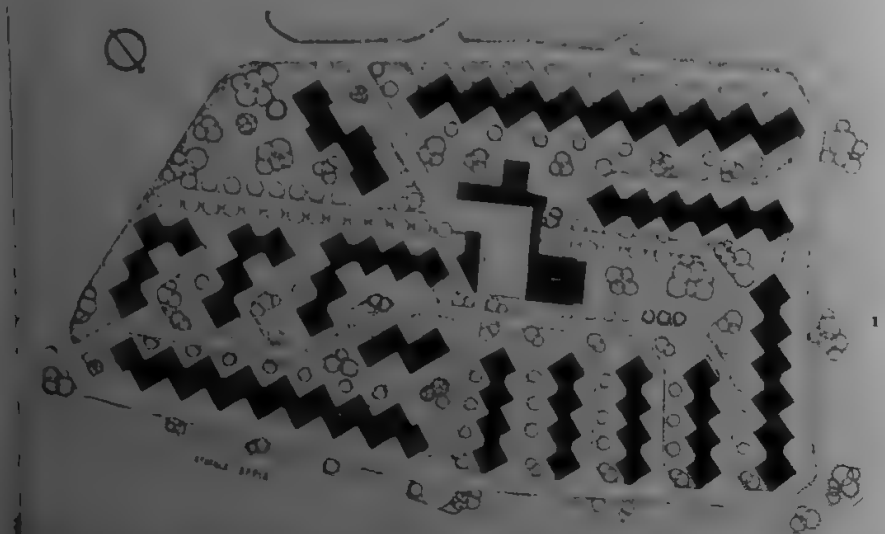

PROGETTISTI

Virgili D.
Caporizzo
Nale G.
Provenzano M.



1-2. Planimetria generale e veduta aerea - 3. Planimetria e prospetto dell'edificio tipo - 4. Il fronte del complesso dalla via Appia - 5. Planimetria, prospetto e sezione del centro sociale.



MESSINA

Unità d'abitazione in « Barcellona Pozzo di Gotto »


Settennio II

Nell'unità illustrata, realizzata su un'area di 6,1 ha, i fabbricati di abitazione sono disposti tutti lungo il perimetro in modo da lasciare al centro un ampio parco chiuso da sistemare a parco. In esso, sono stati previsti i servizi: Chiesa, mercato, osped. scuola, quadra, centro sociale. Ogni unità ab. scala delle case di abitazione ha due uscite: una sulla strada carrozzabile a senso unico che circonda l'intero complesso e una via strada pedonale che si estende all'interno del parco. Anche gli edifici dei servizi possono essere indifferenzientemente raggiunti sia da strade carrozzabili che da strade pedonali. La piazza principale è situata fra la strada carrozzabile e il parco. Gli edifici che prospettano su questa piazza contengono 1.385 vani pari a 223 alloggi, sono forniti di porticato al piano terreno.



PROGETTISTI

Castellazzi M.
Capogruppo
Bertinelli R.
Padigati V.
Macri G.
Melpeli C.
Morroni P.

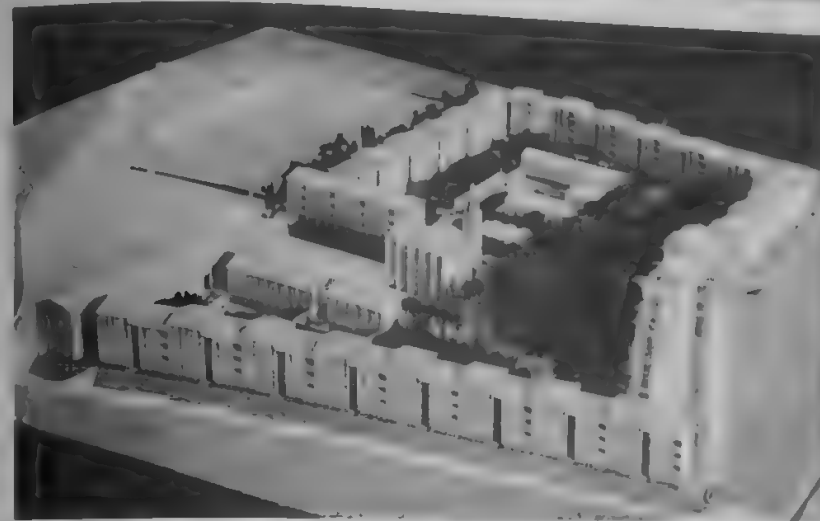

2



3



4



1. Planimetria generale - 2. Foto del plastico - 3. Pianta piano tipo e prospetto delle case continue - 4. Foto del plastico - 5. Pianta piano tipo e prospetto della casa A.

5




MODENA

Unità d'abitazione « S. Agnese »

Settembre 1961

Nella prima fase dell'opera, gli edifici sono stati disposti ad angoli aperti con corpi di fabbrica ridotti a vani, lasciando la profondità della griglia urbana inalterata, in modo da non modificare il tracciato e le sezioni previste nel Piano Regolatore. Le strade di penetrazione, invece, per motivi di sicurezza, sono state ridotte di sezione con la formazione di spazi di sosta e parcheggio. Per consentire un transito pedonale più agevole, sono stati previsti dei ponti.

Per evitare disagi durante la permanenza degli abitanti, la scuola materna e i negozi sono stati disposti in zone verdi, che si trovano anche lungo le strade di penetrazione. Contemporaneamente sono stati costruiti edifici a uso pubblico.

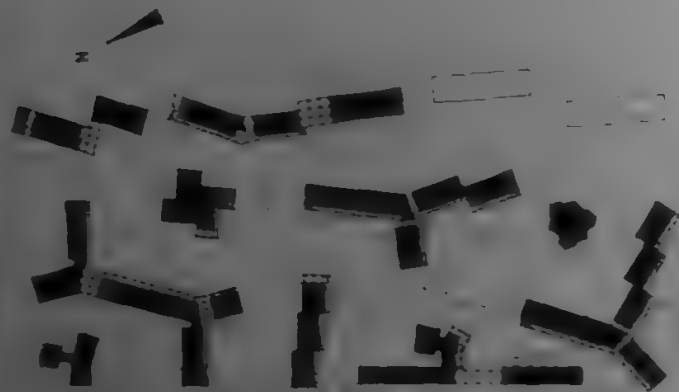

PROGETTISTI

Arch. *di Reggio*



3



1. Planimetria generale - 2. Veduta d'insieme - 3. Uno spazio interno - 4. Pianta piano tipo di edifici a torre - 5. Veduta di una torre.



5

NAPOLI

Unità d'abitazione in piazza Arenella


Settemio II

L'unità è ubicata sulla collina dell'Arenella, in una zona raggiunta e superata in questi ultimi anni dalla espansione della città. Il suolo destinato a questo complesso, di 4,7 ha., era gravato da un vincolo a verde nella sua parte nord-occidentale; tale vincolo e la forma del lotto hanno consentito una distribuzione sufficientemente ampia e libera degli edifici. Questi, compatti e quasi a fascia nella zona sud, si affacciano per la quasi totalità sulla zona verde nella quale si inseriscono alcuni isolati.
Gli edifici sono per lo più a linea coesa, anche se sono serviti da un anello camionabile e da una rete pedonale marginale al verde stesso.
Le alberature messe recentemente a dimora si alternano ad alcune belle piante preesistenti, che arricchiscono gli spazi liberi il cui andamento è mosso e ondulato.
Complessivamente sono stati costruiti 182 alloggi per un totale di 1.108 vani.



PROGETTISTI

Rispoli M.
Caporizzo
Caniglia C.
D'Alonso F.
D'Ambrono R.
Maffei M.
Marzotti G.
Sbriziolo A. M.

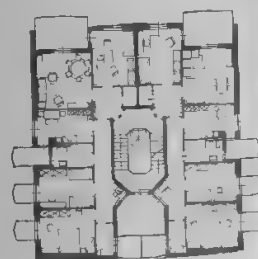

1. Planimetria generale - 2. Veduta dalla strada interna del complesso - 3. Piano tipo degli edifici del complesso - 4. Particolare di un edificio continuo - 5. Veduta degli edifici a blocco a due alloggi scale.

NAPOLI

Unità d'abitazione « Pontirossi »

Settennio II

Il lotto di 4 ha. a disposizione del nuovo complesso di Capodichino, è quasi pianeggiante ai margini di un verde collinare. È stato diviso in tre lotti, mentre i tipi edilizi fondamentali sono quattro, tutti a quattro piani. Si è tenuta presente nella stesura del piano dell'unità, la posizione delle future strade di piano regolatore.


Gli spazi verdi sono distribuiti intorno ai fabbricati comprendendo 2.718 vani in 420 alloggi, di una certa ampiezza sono stati organizzati in modo da costituire un verde equidistribuito tra verde da mantenere a spese dei condotti e verde pubblico. Soprattutto per quanto riguarda le zone prospicienti le strade di piano regolatore.

All'ingresso dell'unità sono stati previsti spazi verdi attrezzati con negozi, mentre in tutto il lotto, con l'installazione delle case, si è provveduto ad altri spazi verdi e con verde pubblico.

Da segnalare la soluzione dell'impianto di riscaldamento, costituito da un grosso impianto unitario, l'arteria tra

PROGETTISTI

Filo Speciale S.
Capogruppo
Cuomo L.
Di ... G.
Ingrassia S.
Oslecchio D.
Riccio R.

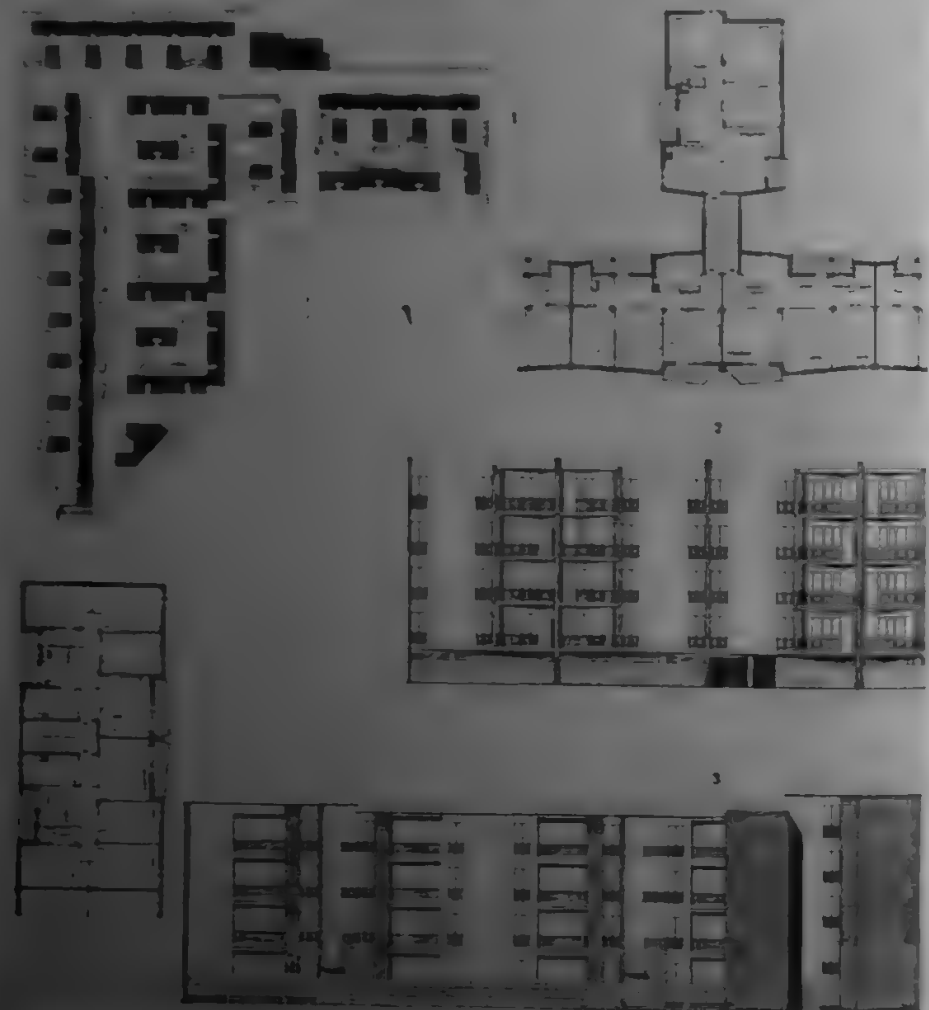

P ...
... Cas
... na
... ala
... piano
... 3 Ca
... nuo
... oggi

NAPOLI - TORRE ANNUNZIATA

Unità d'abitazione in via Epitaffio

Settennio II

PROGETTISTI


Filo Speciale S.
Capogruppo
Cuomo L.
Di ... G.
Ingrassia S.
Oslecchio D.
Riccio R.
T... T.
... A.
... A.
... B.
... F.
... P.

L'unità è prevista su un'area di 9,3 ha., compresa tra il corso Umberto I e la ferrovia Napoli-Pompei, in zona di piano regolatore, a nord-ovest dal centro abitato. Il complesso è composto di case in linea a tre o quattro piani, delimitanti spazi e corti aperte e opportunamente attrezzate.

I percorsi pedonali si articolano tra queste corti, aprendosi in varie piazzette pavimentate. Alcuni edifici hanno il piano terreno porticato su cui si aprono alcuni negozi. Altri negozi sono dislocati in una apposita costruzione, che comprende ai piani superiori alcune abitazioni per i negozianti.

Gli alloggi previsti sono 457, pari a 2.759 vani.

I servizi comprendono il mercato, il centro sociale e un vasto campo sportivo.

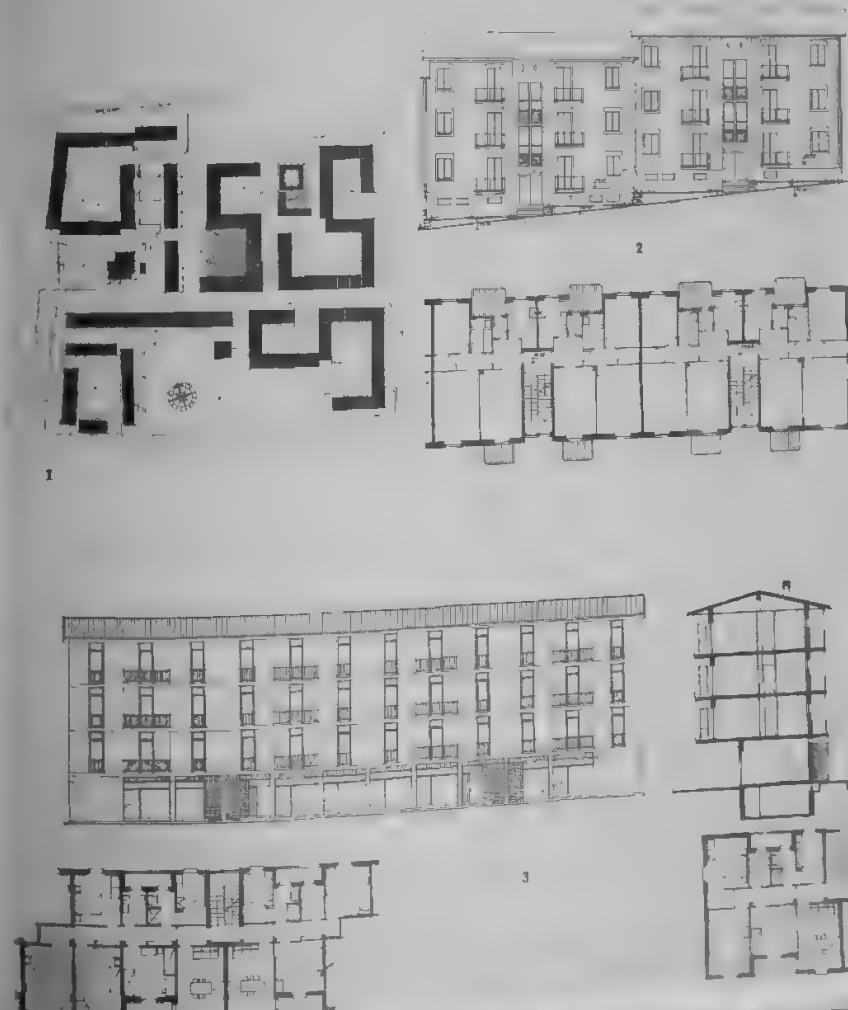

1. Planimetria generale - 2. Prospetto e pianta piano tipo di un edificio a corpi sfalsati - 3. Prospetto, sezione, pianta tipo con soluzione di fattibilità di un edificio porticato.

L'unità è stata progettata e realizzata in tre tempi, su un'area di 4 ha. circa, ma con un insieme organico ed unitario, costituito da volumi disposti a definire sempre un «ambiente».

I tipi edilizi comprendono case di due piani a schiera e fabbricati a tre ed a quattro piani, alcuni sul lato ovest con portici di limitata profondità per un totale di 791 vani in 142 alloggi.

Gli otto annessi agli alloggi sono stati inseriti in giusto rapporto fra gli spazi ed i volumi per far sì che le visuali prospettiche corrispondessero alle caratteristiche ambientali dei cortili veneti.


Oltre al centro sociale ed alla scuola materna, circondata da adeguato spazio verde, è prevista, lungo la via Augustea, una fascia di terreno adibita a campo per giochi.



PROGETTISTI

Vallot V.
Capogruppo
Bandelloni E.
Cristofoli C.
Gusso F.
Negri A.
Tombola G.
Spolaore A.

1. Planimetria generale - 2. Veduta aerea del complesso - 3. Casa isolata a tre alloggi-scala: pianta piano tipo e prospetto - 4. 5. Pianta e prospetto della 1ª casa a schiera - 6. Casa continua: pianta piano tipo e prospetto sud-ovest - 7. Pianta e prospetti della 2ª casa a schiera.

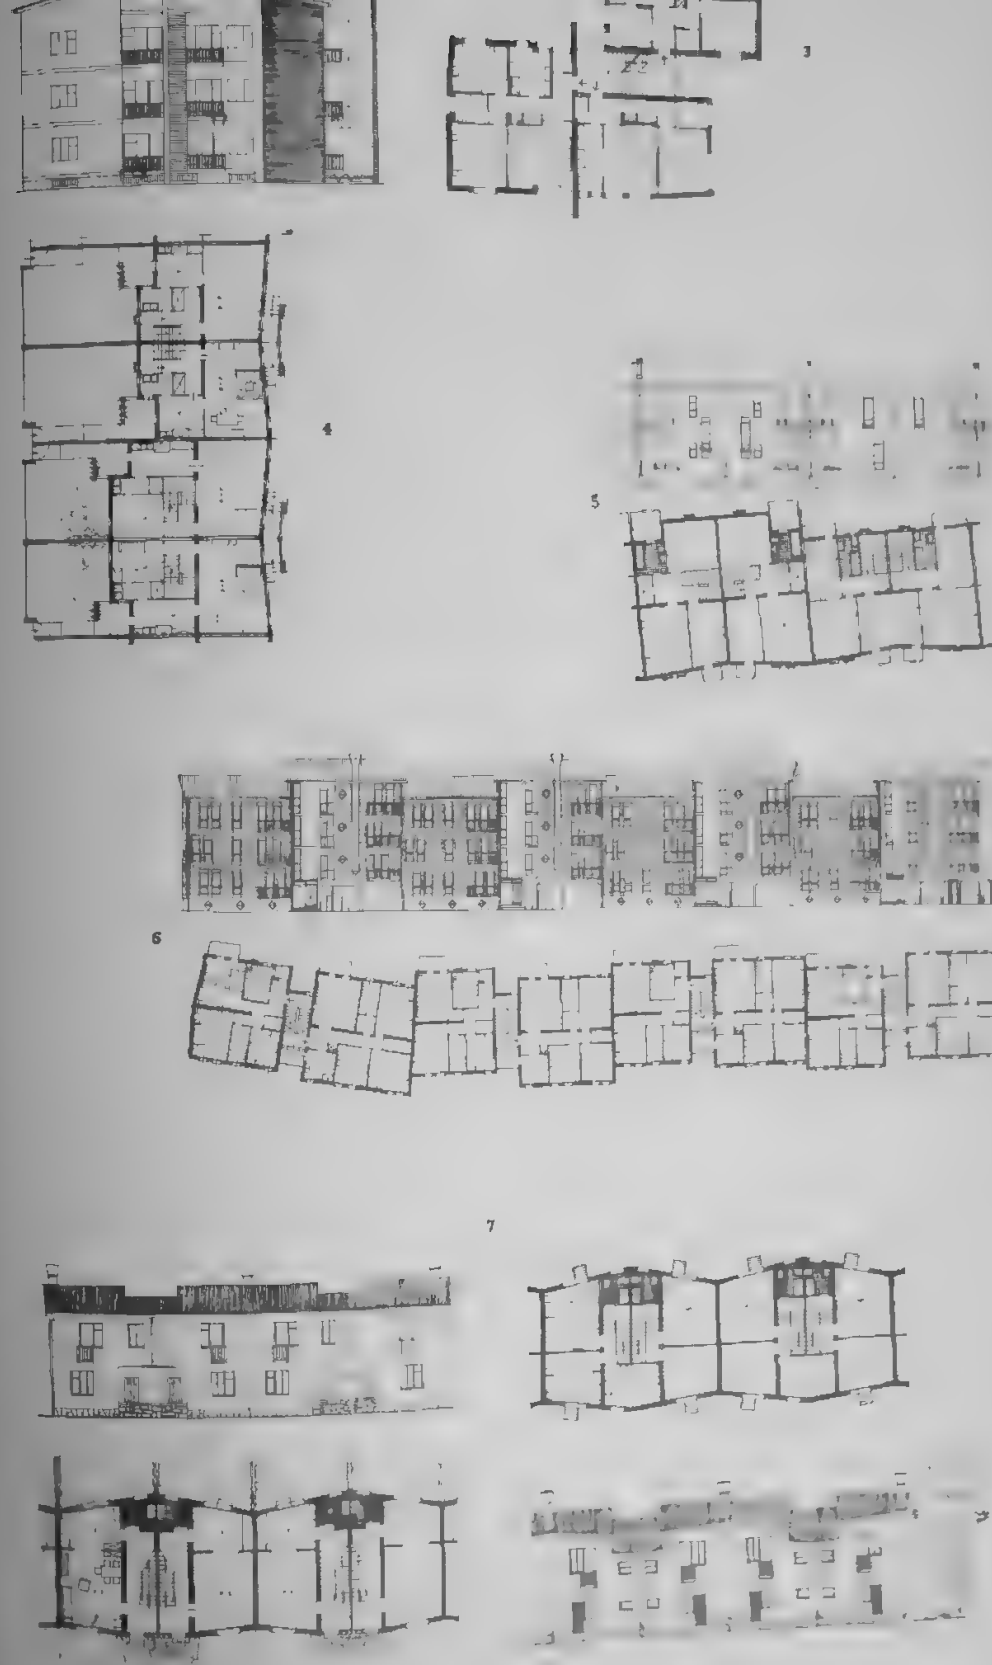


PERUGIA

Unità d'abitazione « Campo di Marte »

Settennio II

L'unità di abitazione, composta di 1320 vani in 237 alloggi, costituisce l'estrema espansione a sud del settore di via XX Settembre-via Pellas che delimita il capoluogo delle zone semirurali di Borghetto. Essa sorge su un'area di 4,2 ha. Il P.R.G. prevede la costituzione di un centro civico, tuttora mancante, nella zona di via Pellas in posizione baricentrica rispetto all'espansione: risulta così condizionata la rete stradale dell'unità di Campo di Marte gravitante verso tale centro, confermando il carattere di strada tangenziale di scorrimento alla via Pallotta e di strade interne residenziali a quelle previste nell'ambito del quartiere.

Il tipo edilizio in linea si basa sul nucleo centrale costituito dai servizi (cucina, ripostiglio, bagno) e dal disimpegno centrale prospettante la loggia: alla eliminazione del corridoio centrale corrisponde anche l'acquisizione di una superficie utile effettivamente gradibile dai componenti la famiglia come zona di lavoro o di studio. Il quartiere, dovendo accogliere assegnatari di diverse condizioni e con varie esigenze, s'integra con due nuclei di edifici duplex a sei vani con annesso orto-giardino. I servizi sono costituiti dal centro sociale, dai negozi, da un'area-mercato e un campo di gioco.



PROGETTISTI:

Coppa M.
Cayeruppo
Belardelli G.
Ottolenghi M.
Zanetti F.



1. Planimetria generale - 2. Veduta aerea del complesso - 3, 4. Pianote e prospetto delle case a schiera - 5. Particolare dell'edificio a portico - 6, 7. Pianta piano tipo a 5 e 6 vani e prospetto dell'edificio continuo - 8. Veduta parziale delle case a schiera.



PERUGIA - FOLIGNO

Unità d'abitazione « S. Maria in Campis »

Settennio II

Il terreno prescelto di 4,7 ha. è ubicato ad est della linea ferroviaria Spoleto-Perugia e sale, con dolce pendio verso le colline retrostanti. Gli edifici, contenenti 928 vani e 180 alloggi, disposti perifericamente, determinano uno schema chiuso con strade e spiazzi interni attrezzati e con edifici di altezza limitata, due piani oltre un piano terra, secondo l'uso locale.

Nella piazza si affacciano i negozi con portico, un piccolo mercato coperto ed il centro sociale, tutti a un piano; la scuola materna è ubicata invece in posizione più baricentrica ed è circondata da un'ampia zona verde ad essa pertinente.



PROGETTISTI

Vitellozzi A.
Capogruppo
Anzani R.
Clerici M.
Franti L.
Mascia I.
Starita M.



2




1 Planimetria generale - 2. Pianta e prospetto di edificio ad elementi sfalsati - 3 Una strada interna in via di sistemazione - 4. Prospetto e pianta di una casa continua.



PESARO

Unità residenziale « San Martino »

Version 11

[illegible]

PROGETTIST

Pallottina M
 Capogruppo
 C. G
 Cataldi Meda
 na A
 V
 M
 F



4



Planimetria ge-
o - 2. Pian-
tano tipo e
retto - 3.
Rettangolo tra la
e l'unità
- 4. Pro-
e pianta
cassette a
5 Ve-
a aren del




PESCARA

Unità d'abitazione «La Pineta»

Settembre 11

L'unità sorge a sud di Pescara, in prossimità della statale Adriatica, compresa tra questa ed il mare, su un'area di 1 ha. È composta di case continue su due piani, costruite in muratura di mattoni pieni, senza rete di scheletro in c.a. Gli accessi al quartiere sono previsti attraverso una via di penetrazione dalla litoranea e dalla nazionale Adriatica. I servizi sono composti dal centro sociale, già realizzato, e dal fabbricato per uffici, delegazione comunale, tribunale, ecc., oltre alla scuola materna. Questi ultimi servizi sono stati previsti, a sede di piano urbanistico, e saranno collegati da un ponte che attraversa ad arco la piazza principale del nord a sud-est. Sono stati previsti 1.011 vani in 249 alloggi.

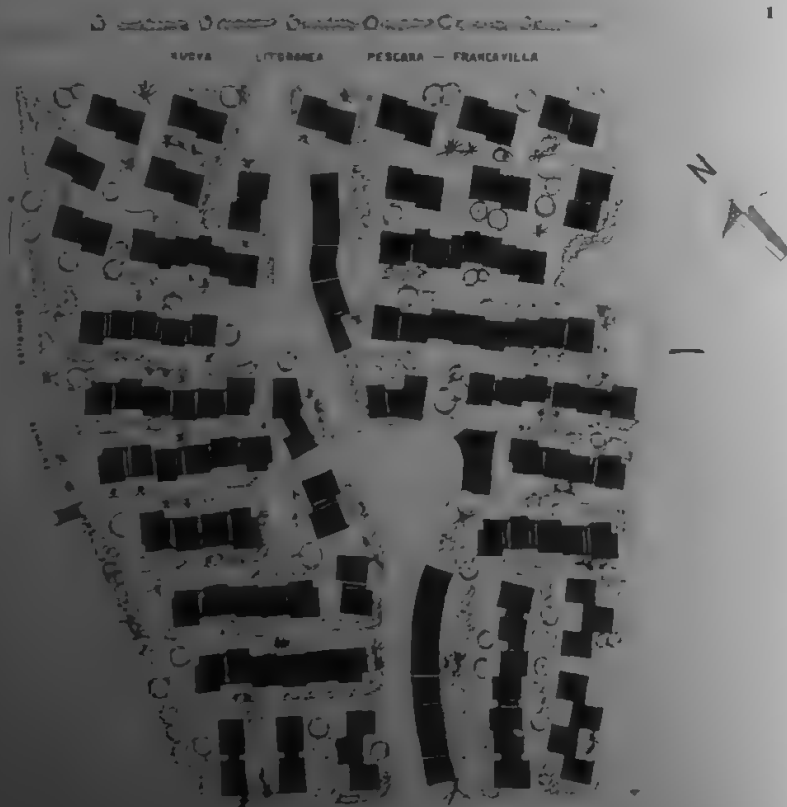


PROGETTISTI

Castelli P.
Capogrosso
De Cecco A.
Graziani R.
Guardella A.
Guidi F.
Petrucchi N.



2



3



1. Planimetria generale - 2. Casa isolata a due piani: pianta piano tipo, prospetto sull'ingresso e sezione - 3. Veduta dalla piazzetta centrale verso la litoranea - 4. Casa continua a tre piani a corpi sfalsati: pianta piano tipo e prospetto - 5. Casa continua a due piani: pianta piano tipo e prospetto.



4



5


REGGIO CALABRIA

Unità d'abitazione «Sbarre Inferiori»

Settembre 11

Questa unità è situata in una zona nella quale è previsto un notevole sviluppo per l'edilizia popolare. Il quadro urbanistico in considerazione di cui è stato esteso oltre i limiti dell'area assegnata di cui ha la pianificazione si è provveduto a deviare il traffico di transito lungo il mare e lungo le alture a monte della zona urbanizzata, così la rete secondaria di circolazione destinata all'abitato. L'esistente via delle Sbarre Inferiori mantiene i collegamenti interni con la città e costituisce elemento di partenza del nuovo sviluppo urbanistico.

Nei piani sono stati adottati due tipi di edifici disposti in modo da garantire spazi sempre diversi e varietà di spazi comuni. Le caratteristiche principali del complesso sono: la scala comune. Per i servizi comuni sono stati previsti: scuola materna, centro sociale, ambulatorio, mercato, negozi. In totale sono stati costruiti 11 alloggi per 1.240 abitanti.

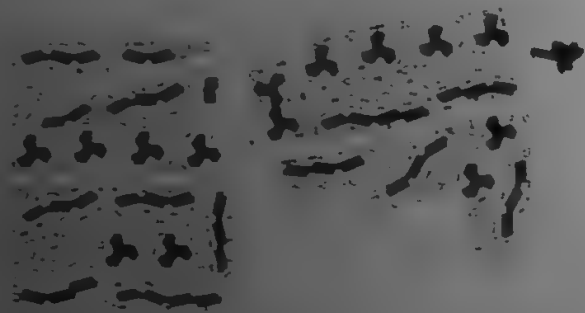


2



PROGETTISTI

Longo G.
Capovilla
Basilari R.
Folder G.
Laurenti R.
Squillaci E.

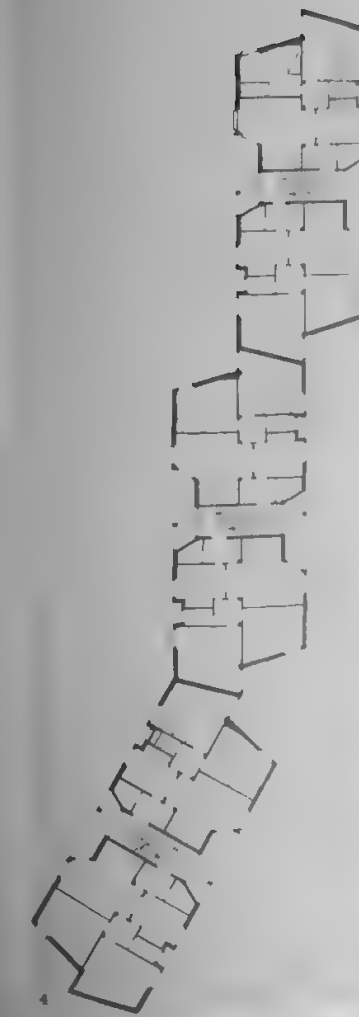

1. Planimetria generale - 2. Veduta panoramica del complesso - 3. Pianta piano tipo della casa stellare - 4. Pianta piano tipo della casa continua - 5. Dettaglio architettonico della casa stellare.



Unità d'abitazione « Colle di Mezzo »


Settembre 1951

L'edificio è posto nel centro direzionale dell'EUR, in un'area di circa 10 ettari, dove si intersecano le arterie principali della città.

La pianta generale è a forma di Y, con un braccio che si allunga verso il centro e due bracci che si diramano verso i lati.

Il nucleo centrale è costituito da un anello di edifici che si chiudono verso il centro, mentre i bracci laterali sono costituiti da edifici a due piani che si aprono verso l'esterno.

Il nucleo centrale è costituito da un anello di edifici che si chiudono verso il centro, mentre i bracci laterali sono costituiti da edifici a due piani che si aprono verso l'esterno.

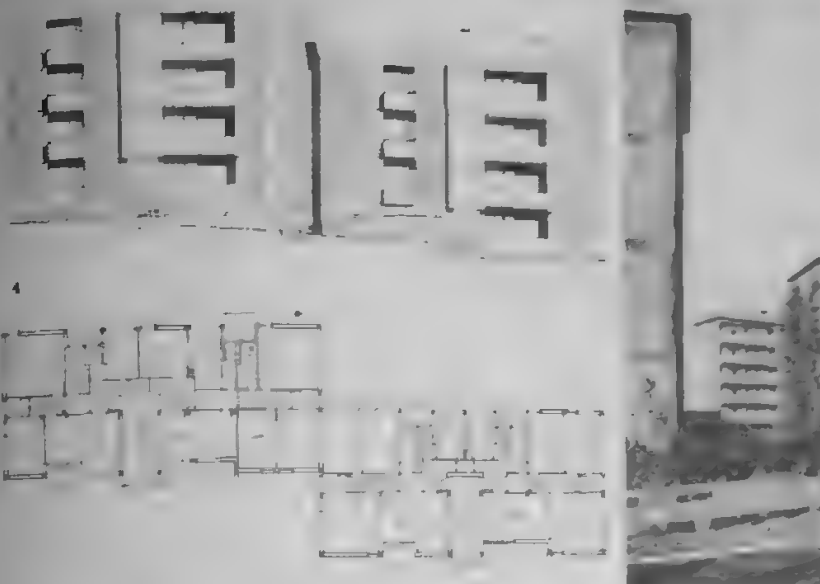

1 Veduta d'insieme del complesso - 2 Pianta generale - 3 Pianta piano tipo e prospetto dell'edificio isolato a tre alloggi-scala - 4 Prospetto e pianta di un edificio isolato - 5 Veduta parziale di alcuni edifici - 6 Veduta aerea del complesso

ROMA - FRASCATI

Unità d'abitazione «Cocciano II»

Setteanni II

L'unità abita su un'area di 1,7 ha, a due chilometri circa dal centro di Frascati, a valle della strada per Colonna ed è circondata a tutto verso da una fascia di autoluis.

Il complesso abita su un terreno di 1,7 ha, a valle della strada per Colonna ed è circondata a tutto verso da una fascia di autoluis. L'unità abita su un'area di 1,7 ha, a due chilometri circa dal centro di Frascati, a valle della strada per Colonna ed è circondata a tutto verso da una fascia di autoluis.

Per sfruttare al meglio il terreno, la piazza di Agr. II, l'area dei singoli edifici è tenuta nella zona a valle del terreno di 1,7 ha, a valle della strada per Colonna ed è circondata a tutto verso da una fascia di autoluis.

Gli alloggi previsti sono 112, a valle della strada per Colonna ed è circondata a tutto verso da una fascia di autoluis. Il complesso è dotato di servizi di base, a valle della strada per Colonna ed è circondata a tutto verso da una fascia di autoluis.



PREL. 1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

1.1.40

1.1.41

1.1.42

1.1.43

1.1.44

1.1.45

1.1.46

1.1.47

1.1.48

1.1.49

1.1.50

1.1.51

1.1.52

1.1.53

1.1.54

1.1.55

1.1.56

1.1.57

1.1.58

1.1.59

1.1.60

1.1.61

1.1.62

1.1.63

1.1.64

1.1.65

1.1.66

1.1.67

1.1.68

1.1.69

1.1.70

1.1.71

1.1.72

1.1.73

1.1.74

1.1.75

1.1.76








1.1.77

1.1.78

1.1.79

1.1.80

ПРИМЕРЫ
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

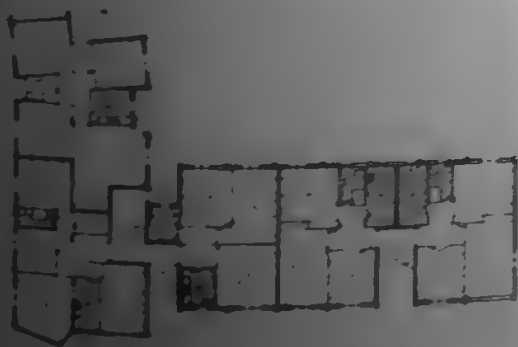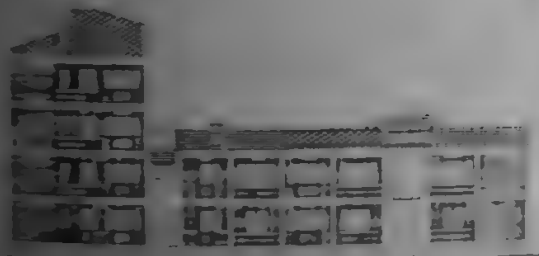

ROROMA

Un'Unità d'abitazione « Valco San Paolo »

Nella settimana 1



È uno dei primi complessi abitativi realizzati dalla Gestione a Roma. Situato nella immediata periferia meridionale della città, alle spalle della fabbrica di San Paolo, sorge su terreno pianeggiante della superficie di 10.000 mq. L'area è compresa tra la via Ottaviano e la via Olimpica. Il complesso è costituito da un gruppo di edifici longitudinali a 3-4 o 5 piani disposti con convogliamento intorno a due cortili ampi e sufficientemente ampi per uso collettivo. L'area è dotata di 143 alloggi per complessivi 286 abitanti. I servizi comuni sono costituiti da un edificio per negozi e dal centro sociale.

1



PROGETTO
De Renzi
Mazzoni
L. Rossi
Pascucci
Pascucci
Pascucci

1. Planimetria generale - 2. Veduta aerea del complesso - 3. Edificio a torre di tipo stellare - 4. Gruppo di torri di tipo stellare - 5. Veduta di una casa con terrazza - 6. Pianta tipo di casa con terrazza articolata con 2 alloggi a piano - 7. Pianta tipo di casa con terrazza - 8. Pianta tipo di una torre stellare

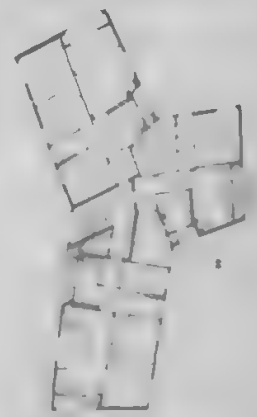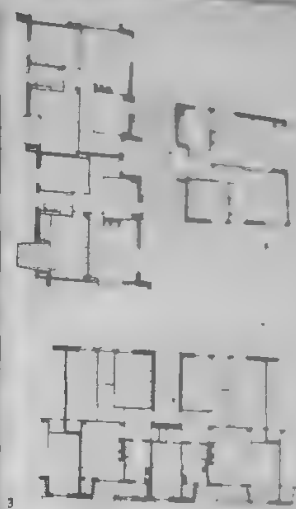

ROVIGO

Unità d'abitazione « Commenda II »

Settennio II

Il complesso sorge su un'area di 3,2 ha a nord della città in zona di P.R.P. sulla nuova via Gramsci che si collegherà con la Statale Padova-Ferrara, fiancheggiante la linea ferroviaria.
Caratteristica principale dell'unità è l'uso del colore che costituisce l'elemento determinante della composizione.

Il complesso spezzato in due dalla via Gramsci è impostato su due settori attrezzati con un'esatta attribuzione degli spazi esterni e nei quali sono inseriti edifici a schiera ed edifici a 3-4 piani in parte collegati da ponti a portici.

L'unità che è dotata di centro sociale e negozi comprende 1.095 vani in 206 alloggi.





2



PROGETTISTI

Mandolen E.
Capogrosso
Borgiotti F.
Colombini S.
Di Gioia V.
Quaderella G.
Tardella G.

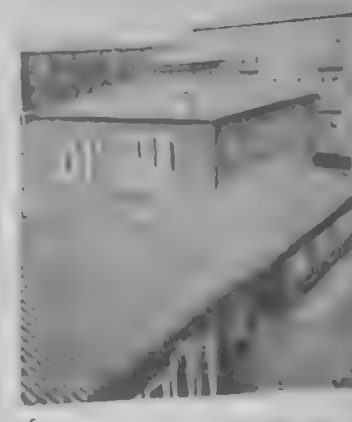

1. Planimetria generale - 2. Un fronte delle case a schiera - 3. Prospetto, piante delle case a schiera - 4. Pianta piano tipo di edificio in linea - 5. Dettaglio del prospetto delle case a schiera - 6. Veduta del Centro Sociale - 7. 8. Pianta, prospetto e sezione del Centro Sociale.



SALERNO


Unità d'abitazione « Conforti »

Settimane II

L'area occupata dal quartiere ha 4,3 è sita nella regione pedemontana a sud-ovest della città e rientra nel limite del P.R. urbano in corrispondenza del settore principale di espansione della città stessa. La composizione urbanistica ed edilizia è stata suggerita oltre che dalla accentuata altimetria del suolo anche dalla necessità sentita di valorizzare la bellissima visuale dei colli e un folto aranceto inserito nell'area. In effetti, la lunga quinta edilizia di case a tre piani, che si snoda ai margini dell'area, lascia libero il lato verso l'aranceto: gli altri edifici, casette a schiera ed a 1 o 2 piani, case da 4 a 6 piani, hanno sempre disposizione tale da lasciare libere le visuali panoramiche verso i colli. L'uso infantile e il centro sociale sono opportunamente inseriti nell'agrumeto mentre otto negozi sono stati ricavati al piano terreno porticato del fabbricato E. Il quartiere comprende 206 alloggi per complessivi 1.227 SADI.



1

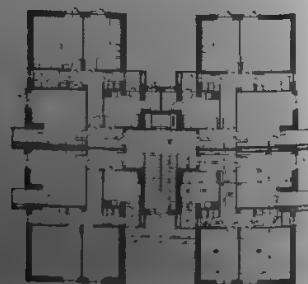

2

PROGETTISTI

Marconi P.
Capogruppo
Agostini C.
Battaglini M.
Costadoni G.
Del Debbio R.
Tanca F.



1. Veduta aerea del complesso in rapporto al tessuto urbano -
2. Piano piano tipo della casa a torre con 4 alloggi - 3. Prospetto sulla scala e pianta piano tipo.
4. Planimetria generale - 5. Pianta e prospetto sugli ingressi degli edifici a schiera - 6. Pianta piano terreno, piano tipo e prospetto sull'ingresso dell'edificio a portico.

PROGETTI 11811

Marconi P.
 Agostini G.
 Battaglini M.
 Costadoni G.
 Del Dabbio R.
 Lenzi F.




3

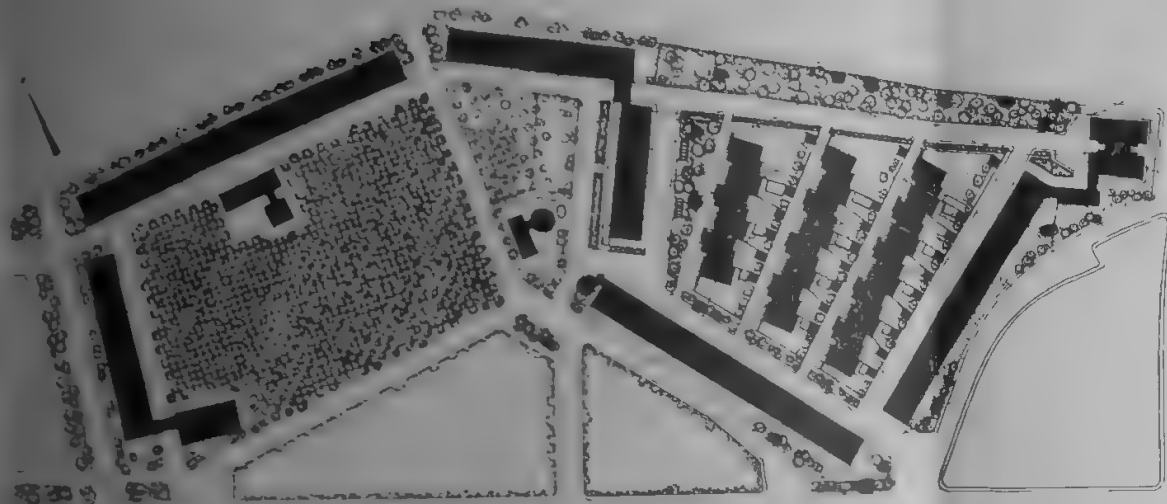



4



5

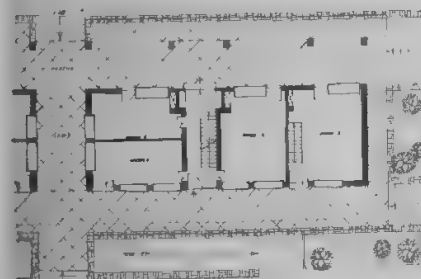

6



SALERNO

Unità d'abitazione « Pastena »


Settennio II

Il terreno di 5,5 ha. su cui sorge l'unità, è pianeggiante, situato a monte della strada Salerno-Battipaglia e addossato alla linea ferroviaria Roma-Napoli-Reggio Calabria che corre in rilevato a nord-est del lotto. La forma è all'incirca rettangolare.

La zona è riparata a nord dalla catena dei monti Salernitani ed è troppo all'interno per risentire dei venti marini.

Al centro dell'area sorge un agrumeto tipico del luogo: questo rappresenta l'insieme più notevole dal punto di vista della vegetazione, unitamente a piccoli gruppi di alberi, in maggior parte olmi e lecci. Si è avuto cura di evitare il più possibile l'abbattimento degli alberi esistenti.

Lo schema stradale interno si avvale di due vie di penetrazione che giungono al centro dell'unità, dove sono sistemati i servizi generali. Esso accoglie una scuola elementare e materna, il centro sociale. Sono stati previsti, nel complesso, 1.280 vani pari a 216 alloggi.

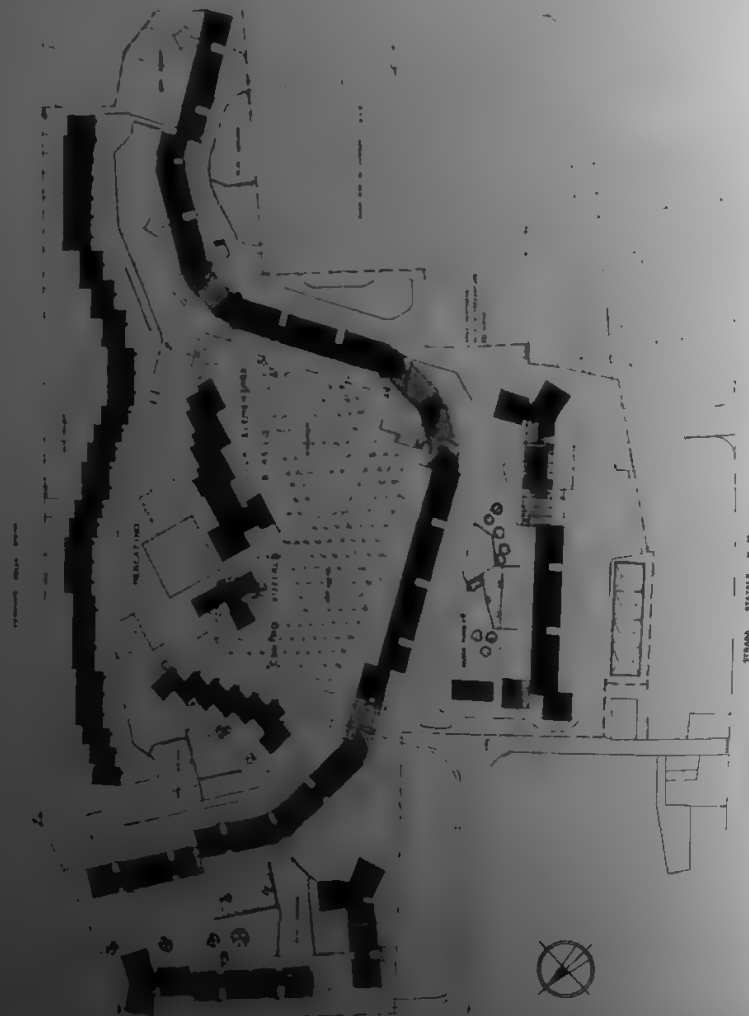



PROGETTI

Zeni B.
Capogrosso
Balletti J.
Calandra M.
Di Carlo A.
Ronchi L.
Rubino L.




2

1. Pianimetria generale - 2. Inserimento del complesso nel tessuto urbano - 3. Dettaglio architettonico - 4. Pianta piano della scuola nell'edificio comune multipiano - 5. Pianta, prospetto sull'ingresso e sezione delle casette a ridosso.

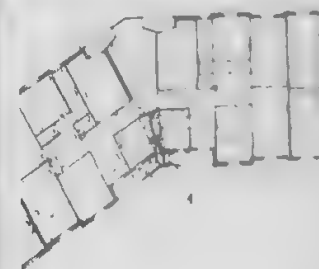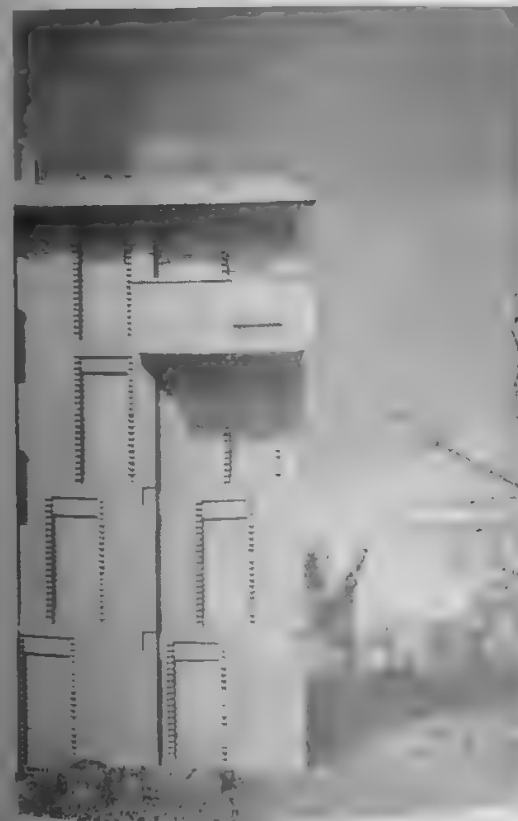

3



5

Unità d'abitazione «Eba Ciara»


Settennio II

L'area di 6,2 ha. occupa la parte alta della dorsale del colle di Badimanna, esposta a mezzogiorno e dominante la bella vallata dell'Eba Ciara, circondata da oliveti che si incuneano tra i nuovi quartieri di Sassari. Il complesso risulta così in zona elevata, posto a sud della via Grazia Deledda, che s'inerpica con grande pendenza lungo il crinale del colle, con belle visuali panoramiche. La rete stradale del complesso è costituita da un anello attorno all'area e da una trasversale nord-sud che incrocia la strada principale di penetrazione, tangenzialmente al centro dei servizi. La strada di penetrazione serve il piccolo mercato rionale ed una serie di negozi, nonché un edificio comprendente la delegazione comunale con locali per guardie civiche e negozi di uso saltuario. Un gruppo di servizi delimita la piazzetta che confina con la zona verde, terrazzata. Gli edifici sono a 2 o 3 piani oltre al piano sopraelevato. L'area a disposizione è di 7 ha circa e su di essa sono stati previsti 374 alloggi per un totale di vani legali 1901.



PROGETTI

Zanda I
Cassola 1960
Motta L.
Petrucchi R.
Tufano L. M.
Viettoni P.



1. Planimetria generale - 2. Veduta d'insieme del parco di studio - 3. Prospetta e pianta piano tipo di un edificio a catena - 4. Veduta parziale del complesso - 5. Due esempi di piante dei piani tipo di edifici isolati o continui-falsati - 6. Veduta di un edificio continuo-falsato.



AVELLINO

Nucleo edilizio in Atripalda

Settennio II

Il nucleo è ubicato nella zona tra Atripalda ed Avellino lungo la S.S. Appia, destinato, con la realizzazione della strada di Circonvallazione di Avellino ad assumere carattere residenziale. I quattro fabbricati realizzati su un'area di 1 ha circa per complessivi 54 alloggi e 270 vani, sono disposti in modo da garantire a tutti gli alloggi la migliore esposizione nonché la veduta panoramica di Montevergine.



1. Veduta d'insieme - 2. Piano tipo e prospetto.



2




AVELLINO

Nucleo edilizio in Ariano Irpino

Settennio II

Il nucleo edilizio, comprendente 74 alloggi pari a due e tre piani: quelli a tre piani sono stati in muratura di pietrame calcareo del luogo.

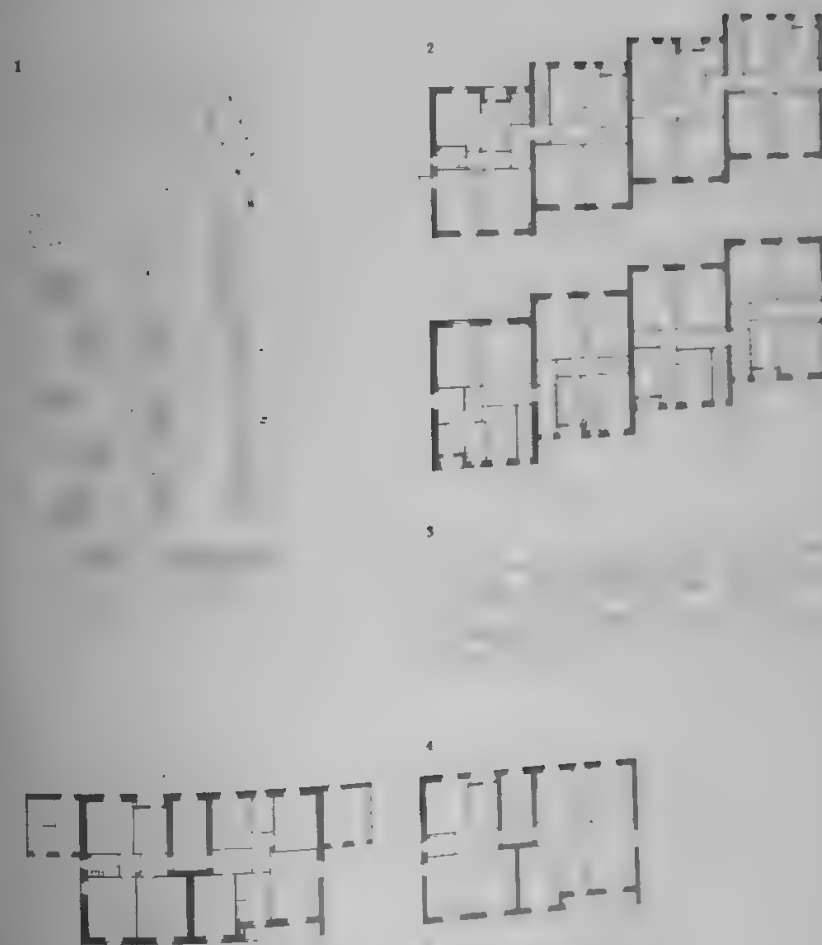

1. Planimetria - 2. 3. Pianta e prospetto delle schiere - 4. 5. Pianta piano tipo e prospetto degli edifici in linea.

AVELLINO

Nucleo edilizio in « Mirabella »

Settennio II

L'area su cui sorge il nucleo è ubicata sulla strada nazionale delle Puglie, in frazione Passo di Mirabella. Le 6 casette, realizzate per complessivi 12 alloggi e 60 vani, sono disposte secondo due raggruppamenti delimitanti spazi ben definiti destinati a campi di gioco, soggiorno all'aperto, parcheggio. I materiali da costruzione adoperati sono il cemento ed il cotto, usato, oltre che per le tamponature, per le pavimentazioni degli atti e dei pianerottoli.



1



1. Veduta dell'edificio - 2. Pianta simmetrica del nucleo - 3. Pianta piano tipo

AVELLINO



Unità edilizia a Solofra

Settennio I

PROGETTISTA:
Fariello F.

La costruzione, che comprende 18 alloggi pari a 45 vani, è realizzata. L'aspetto dell'edificio riflette gli elementi caratteristici dell'architettura rinoc.

1



2



1. Prospetto sugli ingressi e pianta piano tipo dell'edificio - 2. Veduta dell'edificio sugli ingressi.

BARI

Nucleo edilizio ad Alberobello

Settennio I

Il nucleo di 19 alloggi pari a 80 vani costituisce un esempio tipico di inserimento in un paesaggio particolarmente suggestivo. Il progettista senza imitare il tipo edilizio a trulli, ha cercato di ricreare un ambiente locale, sia nell'insieme che nel disegno delle casette, imbiancate a calce e coronate da un tamburo che sostiene un normale tetto a capanna.



1. Il nucleo dall'esterno - 2. Accostamento del complesso agli antichi trulli - 3. Veduta parziale - 4. Planimetria - 5. Pianta piano tipo

PROGETTISTA:

Venturi R.

BELLUNO - CORTINA D'AMPEZZO

Unità edilizia in frazione Grana

Settennio I e II


PROGETTISTI
D'UFFICIO:

Gardina M.

Levi F.

L'unità è composta da tre edifici realizzati in due tempi e costituisce un esempio di inserimento ambientale.

E' costituita da 12 alloggi per complessivi 60 vani.

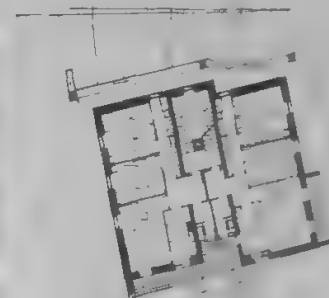


1. Pianta piano tipo - 2. 3. Vedute degli edifici.

BOLZANO

Unità edilizia ad Ortisei

Settennio II

L'edificio comprende 6 alloggi per 30 vani ed è disposto presso il torrente Gardena.
La cellula abitativa è caratterizzata da un soggiorno-pranzo-cucina in un unico ambiente articolato

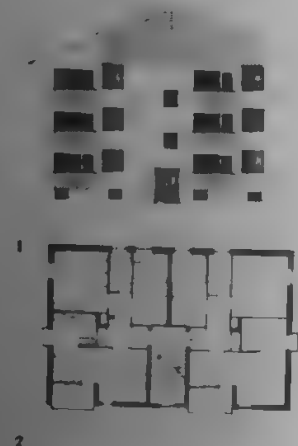

1. Prospetto e pianta dell'edificio - 2. Veduta del fronte sull'ingresso



BOLZANO

Unità edilizia in Prato allo Stelvio


Settennio I

PROGETTISTA:
de Scarpis B.


Nel triplice scopo di consentire la migliore visuale ad ogni alloggio del blocco continuo, anche in relazione alla caratteristica protetti dal vento dominante, il progettista ha preferito sfalsare leggermente gli 8 a costituenti il corpo di fabbrica, col risultato di denunciare maggiormente le



1

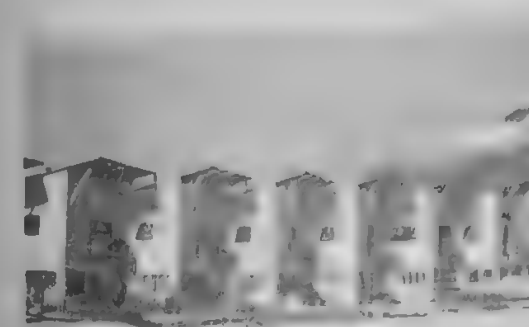


2

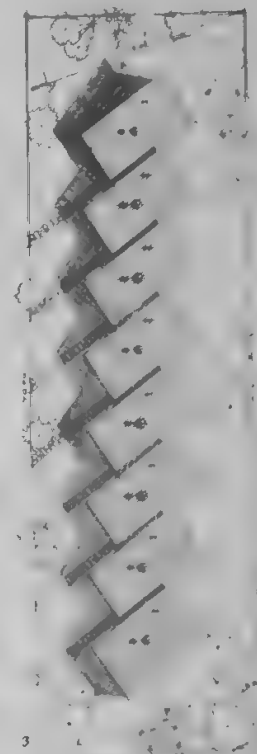

3

1. Inserimento dell'unità edilizia nel suo ambiente - 2. Veduta dell'unità edilizia - 3. Planimetria della schiera - 4. Pianta tipo della schiera.

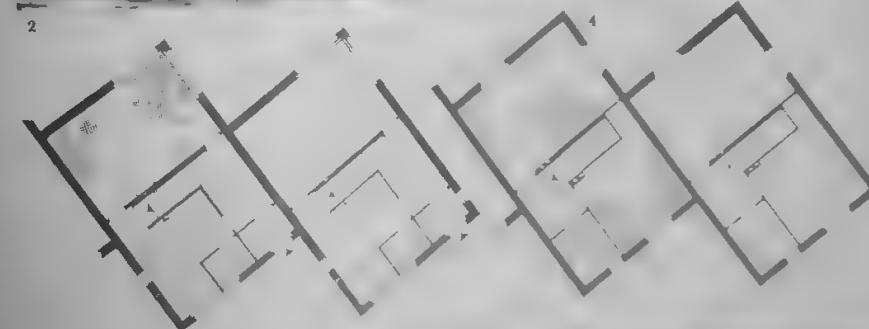

BOLZANO

Unità edilizia a Selva Val Gardena

Settennio I

L'edificio di via 2^a e alloggi 4 è stato realizzato tenendo presente le caratteristiche dell'architettura tradizionale locale nel grandioso paesaggio dolomitico. Esso s'adatta principalmente nella casa di abitazione con una struttura di legno. Particolari accorgimenti tecnici sono stati adottati per il clima invernale.



1. L'edificio inserito nello scenario dolomitico.
- 2. Pianta piano tipo e prosett
- 3. Veduta invernale

PROGETTISTI

Ammonio C.
Cristillo F.
Da Rosi A.
Morero G.




1. Planimetria -
2.3. Pianta piano tipo e prospetto delle quattro cooperative - 4. Vedute d'insieme.

BRINDISI

Nucleo edilizio: Raggruppamento di cooperative

Settembre 11

Dato il vantaggio di poter costruire 4 cooperative in un unico blocco per complessivi 76 alloggi pari a 146 vani e quindi di poter impostare un unico cantiere è stato studiato un tipo edilizio molto rigido nella struttura e piuttosto flessibile nella distribuzione interna per attemperare alle diverse esigenze. La struttura è in calcestruzzo a pilastro e travetti.



1

2

3

3

PROGETTISTA
Allegri P.

BRINDISI

Nucleo edilizio a Ostuni

Settennio II

Il nucleo comprende un fabbricato in linea su quattro piani sfalsati, con negozi e portici, e 5 gruppi di fabbricati su due piani. Ogni gruppo è costituito da tre elementi trilobati disposti intorno ad uno spazio comune per l'accesso ai portici d'ingresso, e collegato alla viabilità principale. Le costruzioni sono in c.a. e comprendono 108 alloggi e 567 vani su un'area di circa 2 ha.




PROGETTISTI

Della Sala F.
Capogruppo
Dolzi R.
Della Sala M.
Pica Ciaramita M.
Righetti G.
Stani L.



1. Planimetria generale e profili urbanistici - 2. Veduta panoramica del nucleo - 3. Particolare architettonico - 4. Prospetti e pianta a quote diverse dell'edificio tipo.

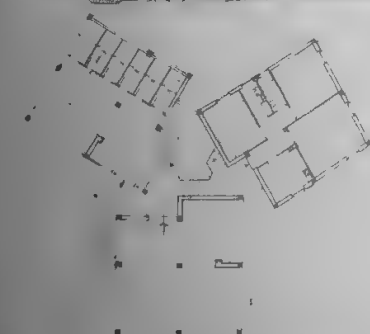

CAGLIARI

Nucleo edilizio « La Palma »

Vedute II

Il nucleo edilizio « La Palma » è stato realizzato in un'area di circa 10 ettari, situata a sud della città di Cagliari. L'opera è stata progettata e costruita in un periodo di crisi economica, con l'obiettivo di realizzare un complesso di abitazioni a basso costo, che potesse rispondere alle esigenze della popolazione. Il progetto è stato sviluppato in base a criteri di razionalità e funzionalità, con l'obiettivo di creare un ambiente urbano di qualità, che potesse offrire alle abitanti un'abitazione salubre e confortevole. Il complesso è costituito da un nucleo centrale, che è stato realizzato in un'area di circa 10 ettari, e da un nucleo periferico, che è stato realizzato in un'area di circa 10 ettari. Il nucleo centrale è costituito da un gruppo di edifici, che sono stati realizzati in un'area di circa 10 ettari, e da un gruppo di edifici, che sono stati realizzati in un'area di circa 10 ettari. Il nucleo periferico è costituito da un gruppo di edifici, che sono stati realizzati in un'area di circa 10 ettari, e da un gruppo di edifici, che sono stati realizzati in un'area di circa 10 ettari.



1. Planimetria del nucleo - 2. Sezione architettonica - 3. Veduta generale del nucleo - 4. Veduta parziale di un edificio - 5. Piano tipo e prospetto di un elemento-cella.





COMO

Unità edilizia per cooperativa

Settennio II

L'edificio inserito nel verde e realizzato a gradoni, vista la natura del terreno, è fornito, in ogni suo alloggio, di ampie terrazze. Comprende 14 alloggi con 49 vani.

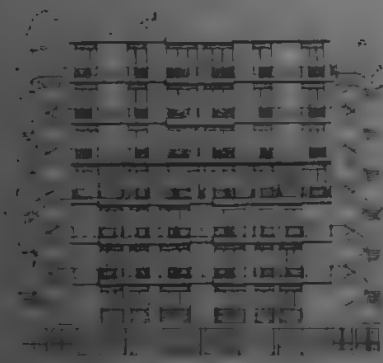

2

PROGETTISTA:
Vido A.

1. Pianta piano tipo e prospetto
- 2. Veduta d'insieme dell'edificio
- 3. Sezione trasversale - 4. Prospetto laterale.




COMO - CANZO

Unità edilizia per cooperativa

Settennio II

PROGETTISTA:
Mazzanti G.



Il progetto comprende un complesso di 13 alloggi in d
un fabbricato a tre piani, con due alloggi per piano l

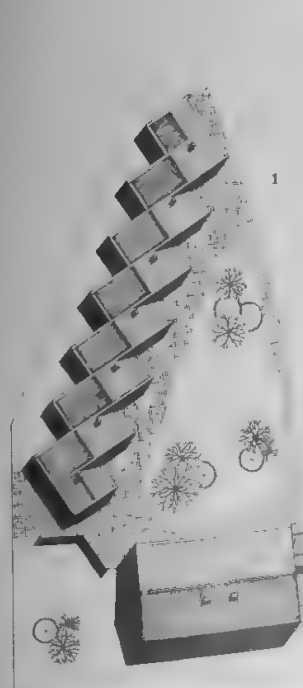

1



2



5



1. Planimetria -
2.3 Pianta e prospetto delle case a tennera - 4. Pianta piano tipo e prospetto delle case isolate - 5. Veduta d'insieme.

COMO

Unità edilizia a Cernobbio

Settennio I

L'unità edilizia inserita nel verde, è composta da edifici a due e a tre piani. Complessivamente il numero degli alloggi è 20 comprendenti 85 vani.



1

2

COMO - LAGLIO

Unità edilizia per cooperativa

Settennio II

La casa che sorge in terreno montuoso in magnifica posizione panoramica, con vista sul lago di Como, prevede 10 alloggi, pari a 40 vani.

L'assetto planimetrico del tabellone si adegua alla pendenza del terreno, particolarmente per quanto riguarda gli accessi che risultano situati a quote diverse.

I materiali impiegati sono quelli tradizionali della zona.



1. Piano piano tipo 2. Veduta prospettica

PROGETTISTI:

Cappelletti F.
Baggio F.
De Santis A.
Keller C.

1. L'edificio nel verde - 2. Piano piano tipo.



COMO

Unità edilizia a Merate

Settennio II

La costruzione, per cooperativa, comprende 18 alloggi, fra loro dai gruppi scala. Ne risulta così un edificio unitario, inserito nel verde dei bambini.

1. Piano tipo e prospetto.



COMO

Unità edilizia per cooperativa


Settennio II

Esempio tipico di casa a torre in 178 vani.

PROGETTISTI:

Terragni C.
Terragni E.

1. Piano tipo e prospetto.

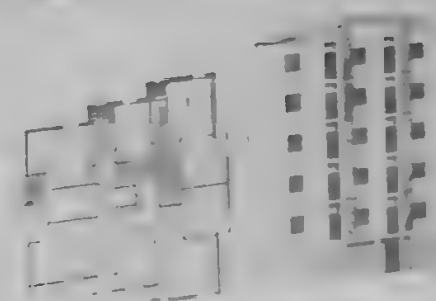


ENNA

Nucleo edilizio

Settembre 11

Il nucleo sorge ad ovest della città in zona montana su forti dislivelli.
L'attività è assai pianificata e circondata da ampie zone verdi ed alberate.
La progettazione urbanistica ha dovuto tener conto dell'esistente edificio presistente che si integra
a questo nuovo lotto che costituisce l'area su cui sorge il complesso.
Il progetto è stato costruito in tre fasi: la prima, collegata mediante corpo scala centrale, l'attuale zona
che rappresenta l'esistente. I vani sono 634 distribuiti in circa 100 alloggi. La seconda fase, che è il
2° lotto, senza copertura, sono costruiti dal centro sociale, dalla Chiesa e da alcuni privati.

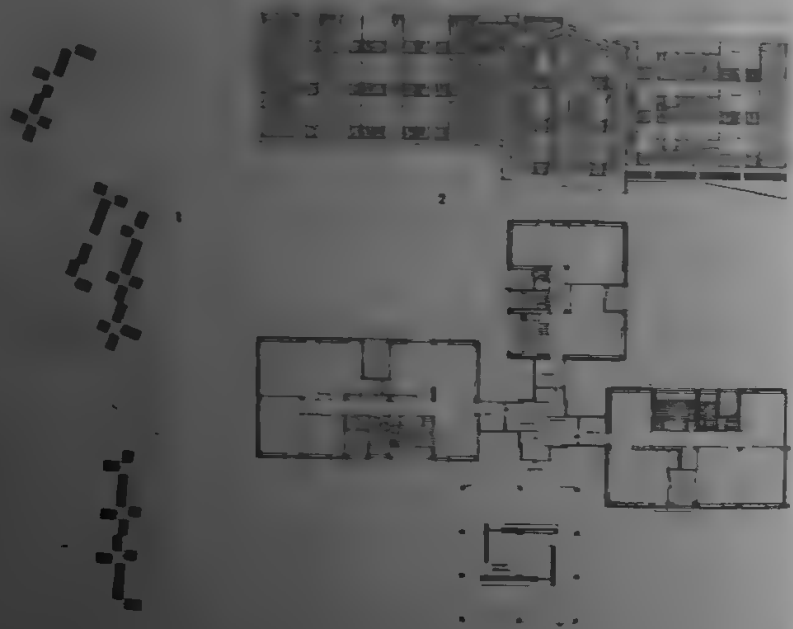

FRANCESCO

NOVEMBRE
D
M
M
M

PROGETTISTI

ALFREDI
ALFREDI
ALFREDI
ALFREDI
ALFREDI

Il progetto
è stato
realizzato
in tre
fasi:
la prima
che rappresenta
l'esistente,
la seconda
che è il 2° lotto,
e la terza
che è il 3° lotto.
Il progetto
è stato
realizzato
in tre
fasi:
la prima
che rappresenta
l'esistente,
la seconda
che è il 2° lotto,
e la terza
che è il 3° lotto.



PROGETTISTI

Saripanti M.
Di Cagno N.
Marzulli P.
Morilli L.
Moroni P.

Nucleo edilizio «Tratturo dei Preti»

Settennio II

Il nucleo sorto su un'area di 1,7 ha. è impostato su due ampi spazi, collegati attraverso un edificio a due piani di cui il piano terra quasi totalmente porticato. Tale edificio fa da centro a tutto il complesso. Sotto il portico è ubicato il deposito motorette e parte del tabernacolo del centro sociale. I due spazi, così delineati, sono destinati, l'uno a giardino del centro sociale, l'altro a una zona verde attrezzata con panchine e spazi per il giuoco dei bambini. Tutta la progettazione è basata sulla modularità, sia orizzontale che verticale, dei pannelli pieni e dei vuoti. Il nucleo è composto da 132 alloggi pari a 672 vani.

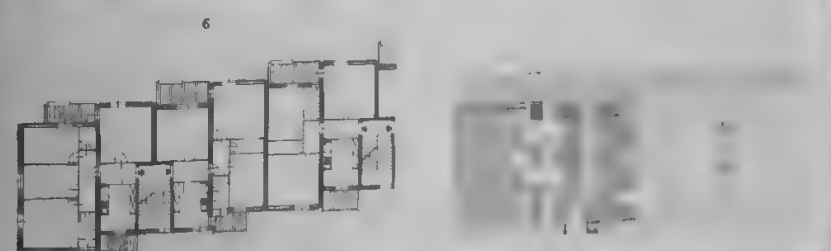
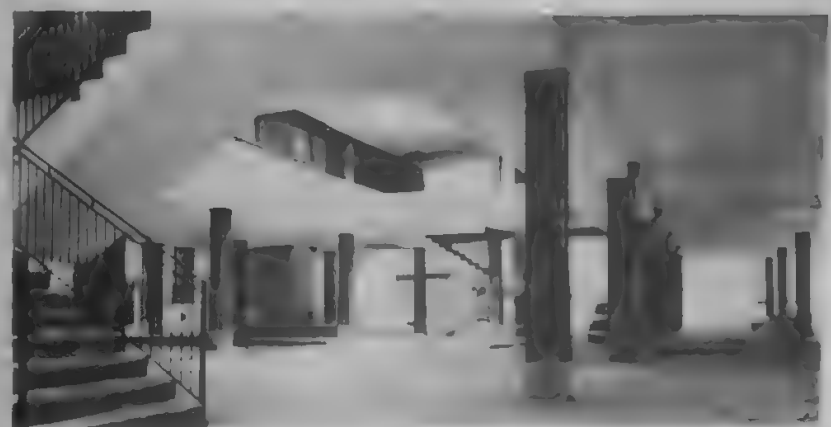


Nucleo edilizio in S. Giovanni Rotondo



Settembre 11

Il nucleo edilizio di San Giovanni Rotondo è situato a valle della strada che unisce il centro della città con la zona nella quale sorge il Convento dei Cappuccini, lungo la direttrice di espansione della città. Alla edilizia discontinua che caratterizza l'architettura privata si è preferito contrapporre una serie di edifici continui snodantesi lungo una strada che segue la linea di massima pendenza.


Il complesso sorge su di un'area di circa 1,2 ha. e comprende 60 alloggi per 382 vani.

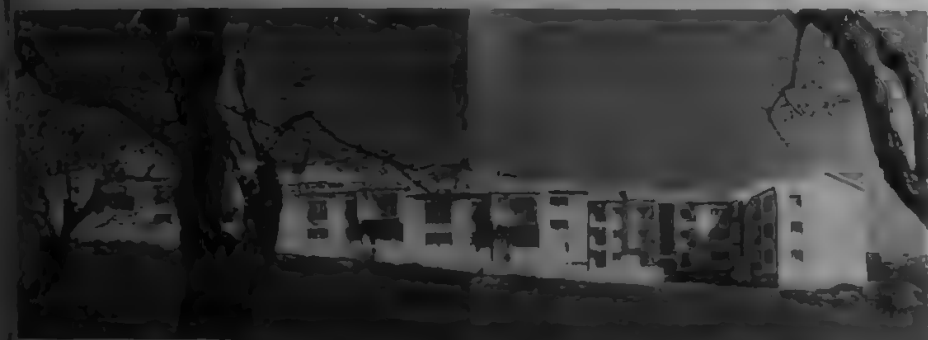

PROGETTISTA:

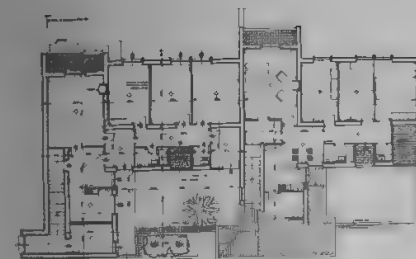Caniglia Rispa-
li C.

4



5



1. Veduta pano-
ramica - 2. Pro-
spetti del nucleo
- 3, 4. Sezioni e
piani degli edi-
fizi a schiera -
5. Veduta par-
ziale degli edifici
verso il patio di
ingresso.

LATINA

Unità d'abitazione per cooperativa

Settennio II

L'edificio sorge nella zona intensiva del centro urbano di Latina, con le caratteristiche della edilizia continua marginale.

È costituito di 7 piani più il piano terra adibito a box e cantine. Gli appartamenti sono 13, uno dei quali duplex, per un totale di 81 vani.



1. Prospetto e piante piano n. po. - 2. Veduta della strada

LATINA

Unità edilizia in San Felice Circeo

Settennio I

L'alloggio tipo che si svolge intorno ad una scala composta da due brevi rampe, è stato risolto su tre quote: alla quota più bassa l'ingresso, la cantina ed un piccolo locale adibito a lavanderia; a quota intermedia il soggiorno-pranzo e la cucina comunicante col giardino; ed infine al disopra dell'ingresso le camere da letto col bagno. L'unità edilizia comprende 20 vani in 4 alloggi.



1. Veduta del fianco sulla scarpata - 2. Pianta a due quote e sezione.

PROGETTISTI:

Cerocchi R.
Brustolini G.

LECCE

Nucleo edilizio in Otranto

Settennio II

L'area, pianeggiante, di forma molto allungata, è prospiciente il golfo di Otranto alla zona balneare della cittadina mediante due piccole strade tangenti ai lati della zona. La zona è costituita da modeste case a due piani coperte a terrazza. Si è adottato un ingresso per mezzo di scale esterne per i superiori. In totale il nucleo comprende 38



1. Planimetria - 2. Veduta dello spazio interno - 3. Pianta a due quote diverse.

LECCE

Unità edilizia per cooperative

Settennio II

I due edifici di tipo articolato sorgono nel tessuto urbano della città. Essi comprendono 84 vani in 12 alloggi.



1. Pianta piano tipo delle due cooperative - 2, 3. Vedute dei due edifici.

PROGETTISTA:

Franco C.


LECCE

Nucleo edilizio in Gallipoli

Settennio II

La particolare disposizione urbanistica adottata ha consentito la progettazione di edifici a due piani su di un'area ristretta di 2 ha, considerando che le preferenze e le abitudini locali sono nettamente orientate verso alloggi unifamiliari dotati di un sufficiente spazio all'aperto. Tutti gli alloggi sono stati perciò dotati di un'area esterna.

Il nucleo, nel quale sono previsti un centro sociale ed alcuni negozi sulla strada diretta verso il centro cittadino, comprende 106 alloggi per complessivi 578 vani.

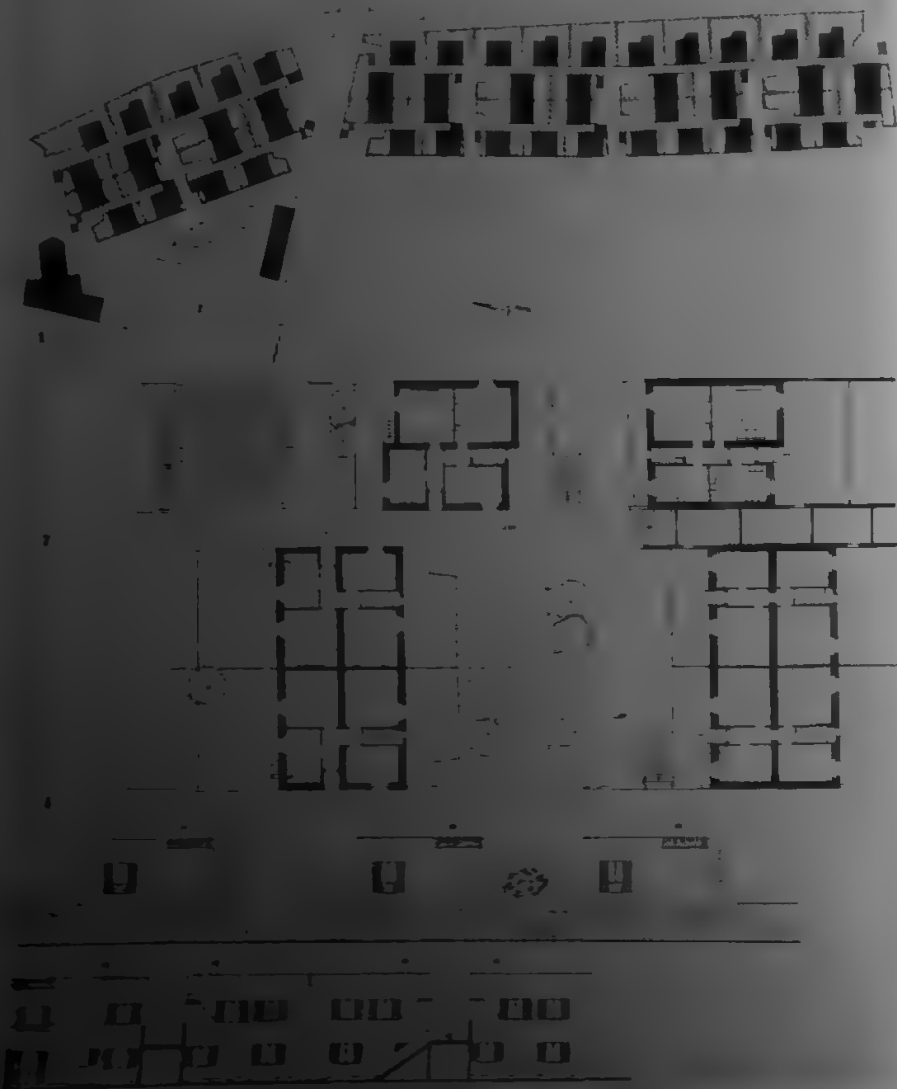

PROGETTISTI
Sansone F.

1. Planimetrica
3. Piano

MESSINA

Nucleo edilizio in Sant'Agata di Militello

Settennio II

L'area scelta per il nucleo edilizio è adiacente a zone già edificate, disposti secondo uno schema rigido. Il nuovo insediamento è stato adattato in planimetriche ed altimetriche del terreno di tre piani, concorrono alla creazione di spazi aperti. Il nuovo nucleo comprende 80 alloggi pari a 400 vani.



1. Planimetrica
3. Piano

NAPOLI


Nucleo edilizio a Capri

Settennio I

Il piccolo complesso sorge in località Capri, tra la selva e il mare S. Michele e il promontorio di Libera. Il primo gruppo di edifici costituisce uno spazio-atrio che precede gli altri due successivi: uno comprendente una piazza pavimentata e pavimentata, l'altro comprendente invece un prato verde di forma rettangolare. Il nucleo edilizio comprende 117 vani in 27 alloggi.



1. Planimetria
2. Scorcio di via
edilizio - 3. Ver-
dura dall'alto
4. Pianta piano
tipo e prospetto

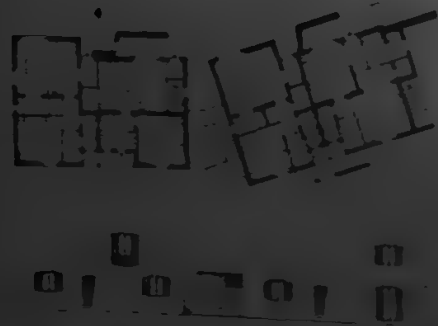

NAPOLI

Nucleo edilizio in Pozzuoli


Settennio I

PROGETTISTI:
G. G. G.
L. L.

Il complesso sorge poco distante dallo Stabilimento Olivetti su un'area lo schema della corte campana, centro di vita collettiva delimitato dalle abitazioni continue, unite una all'altra dalle scale all'aperto. Il complesso è servito da una rete di strade e viali pedonali all'aperto. Sono previsti: centro sociale e centro sanitario, un asilo ed 110 alloggi comprendono un totale di 574 vani.



1. Planimetria -
2. 3. Pianta pia-
no tipo - 4. Pro-
spetti.

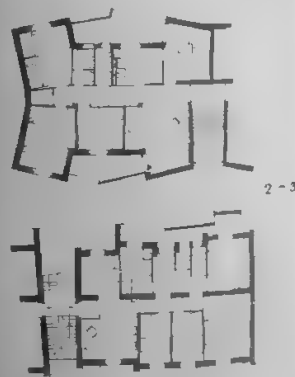


NAPOLI - POZZUOLI

Unità edilizia per cooperative

Settennio II

Il suolo messo a disposizione delle due cooperative, in località Lucrino, è di forma irregolare ed allungata con forte sviluppo trasversale. La poca profondità del suolo ha reso necessaria la disposizione in linea di tutti i fabbricati così da creare una cortina volumetricamente massiccia ed inserita nell'ambiente. Gli edifici sono a due piani per un totale di 24 alloggi e 148 vani. L'accesso agli alloggi è a diverse quote.

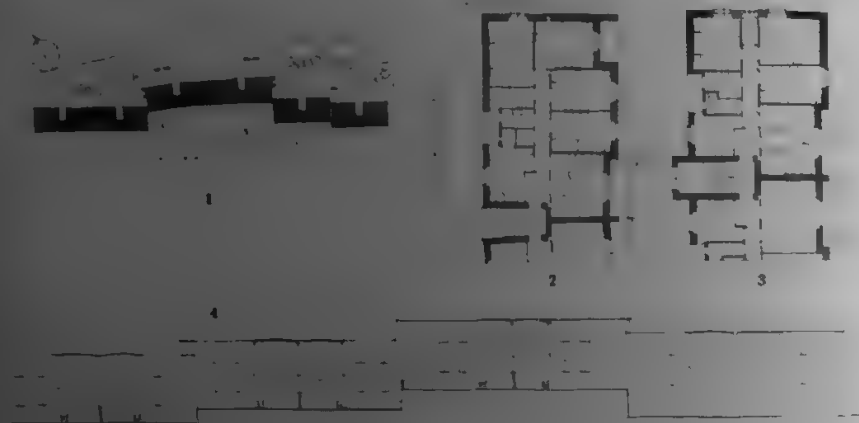

PROGETTISTI:
Panc R.


1. Planimetria
2. Veduta a.s.
3. Prospetto
4. Piano tipo

NAPOLI

Nucleo edilizio in Sorrento

Settennio II

Il nucleo edilizio sorge su un terreno coltivato a splendido agrumeto in declivio verso il vallone di Artigliano, del quale si è dovuto salvare il maggior numero di alberi di alto fusto. Gli edifici progettati sono a due e tre piani, con il terzo ha la doppia esposizione e la visuale del golfo. Un gruppo di orti è sistemato in un'edilizia centrale. Complessivamente sono stati realizzati 65 alloggi pari a 350 vani.

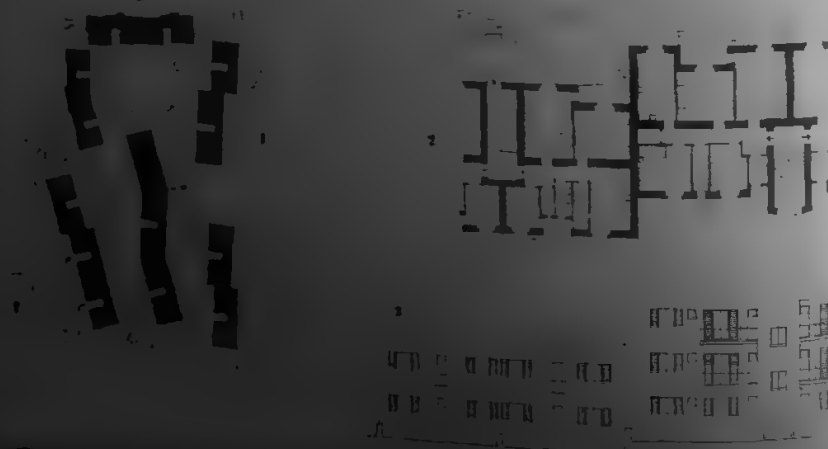

PROGETTISTI:
Panc R.
Caporaso
Luise A.
Moroder G.
Panc M.


1. Planimetria
2. Piano tipo
3. Prospetto

NAPOLI

Nucleo edilizio in Torre del Greco

Settennio II

L'ubicazione del suolo è di rilevante interesse paesistico, della collina e del convento dei Camaldoli e pertanto della fascia terminale che è ad un piano, e godono di una vista. Nel nucleo sono previsti 210 vani in 38 alloggi, un'aula materna.

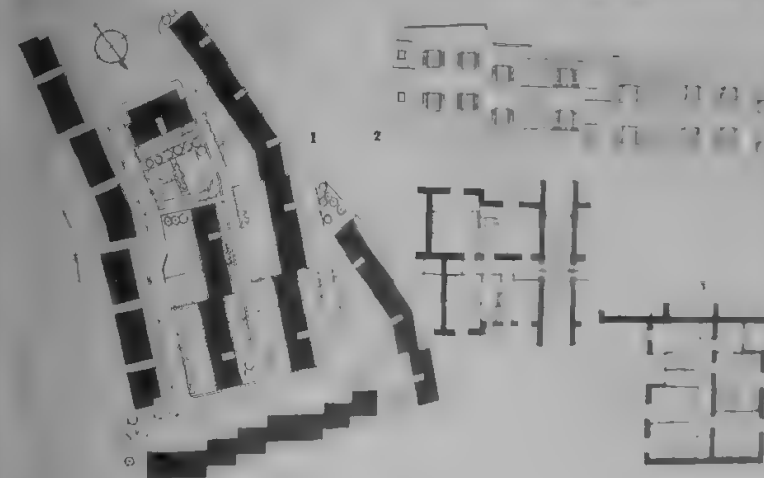

PROGETTISTI:
Panc R.
Moroder G.
Panc M.

1. Planimetria
2. Prospetto
3. Piano tipo

NAPOLI

Unità d'abitazione «San Giacomo dei Capri»

Settennio II

Il complesso sorge su terreno di 2,5 ha. in forte pendenza ed è caratterizzato da spalliere di verde e giardini intermedi, per superare i dislivelli fra i vari edifici. Sono stati costruiti 125 alloggi per complessivi 700 vani.


1. Planimetria
2. Piano tipo

PERUGIA - GUBBIO

Nucleo edilizio « San Biagio »

Setteennio II

Il complesso è ubicato a sud-ovest dell'abitato su di un'area di 1,5 ha., lambita da strade che dal centro convergono nella strada di circonvallazione prevista dal piano regolatore in corso di approvazione. I volumi del complesso sono stati studiati di dimensioni modeste in modo da non alterare il paesaggio. I tipi edilizi progettati sono due: case unifamiliari a schiera su due piani e case con 4 alloggi per piano a due piani oltre il piano porticato. Il complesso di 315 vani in 60 alloggi sarà servito da una scuola materna ubicata a nord dell'area.

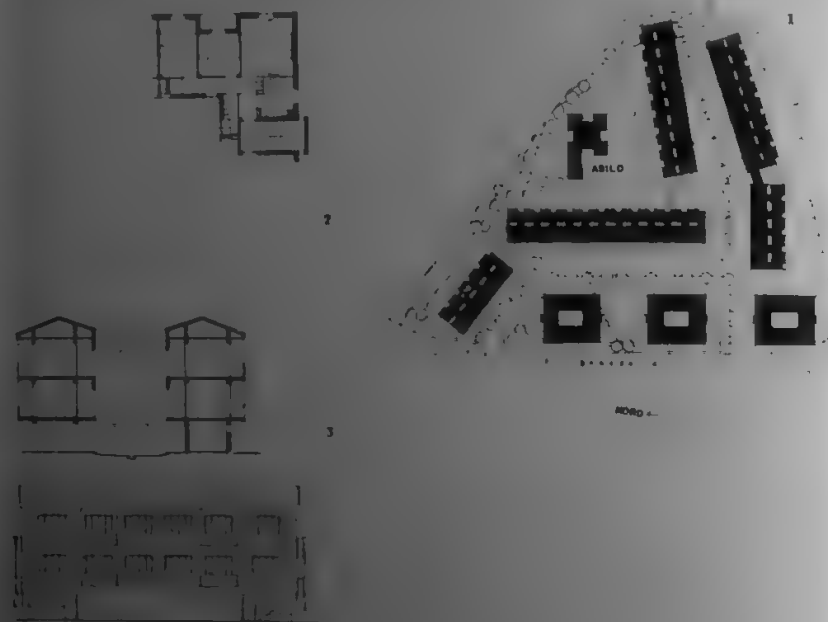

1. Planimetria generale. 2. Pianta parti tipo e edificio a schiera. 3. Sezione prospettica nell'edificio a schiera. 4. Prospettiva urbanistica.

PROGETTISTI:
Cazzi E.
Caporuglio
Frassi G.
Mastrangelo M.

PROGETTISTI:
Gori G.
Caporuglio
Brizi E.
Isotta E.
Negri M.
Nelli E.
Pagnini R.






1. Inserimento nella città. 2. Planimetria generale. 3. Veduta di alcuni edifici. 4. Pianta, prospetto e sezione dell'edificio a tre piani. 5. Particolare architettonico. 6. Pianta e prospetto dell'edificio a due piani. 7. Veduta panoramica del complesso (vedi riavvolto).



Nucleo edilizio « Ricciano »

Settembre 11

Il nucleo, costituito da 63 alloggi per 360 vani, è situato alla periferia di Pescia su terreno collinare di un'area di 1,5 ha, a terrazze, coltivate a vite ed olivi del quale si è cercato di mantenere lo stato naturale caratteristico della campagna Toscana. Le case sono state predisposte per avere accesso da monte e per lasciare libero il terreno ed il panorama a valle. La vita collettiva è accentrata nel nucleo della scuola, con antistante piazzale che si apre sulla valle, e nel centro ricreativo prospiciente il viale di accesso del complesso. Gli alloggi sono previsti in edifici di 2 e 3 piani a schiera, dotati di terreno opportunamente differenziato all'esterno in modo che ogni famiglia possa « riconoscere » la sua casa.

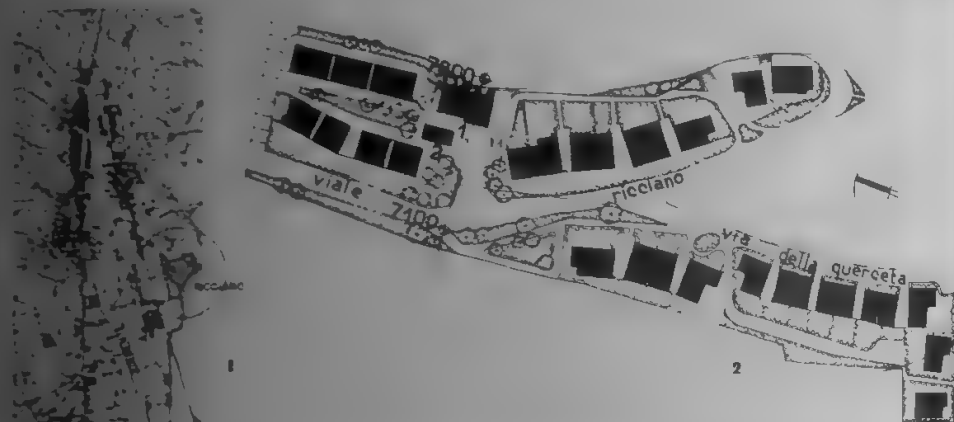

REGGIO CALABRIA

Nucleo edilizio in Rosarno


Settembre 11

Il complesso, costituito da vari 1215 in 23 alloggi, è ubicato ai margini del centro abitato di Rosarno su un terreno completamente esposto a sud e con splendida veduta verso il mare e gli uliveti della piana costiera.

La natura del terreno a gradiva ha suggerito una disposizione dei fabbricati, tutti ad un piano, anch'essa in gradiva ma per rendere unitario il movimento del terreno sia per consentire una visuale libera a tutti gli alloggi.



PROGETTISTA
Mombello M

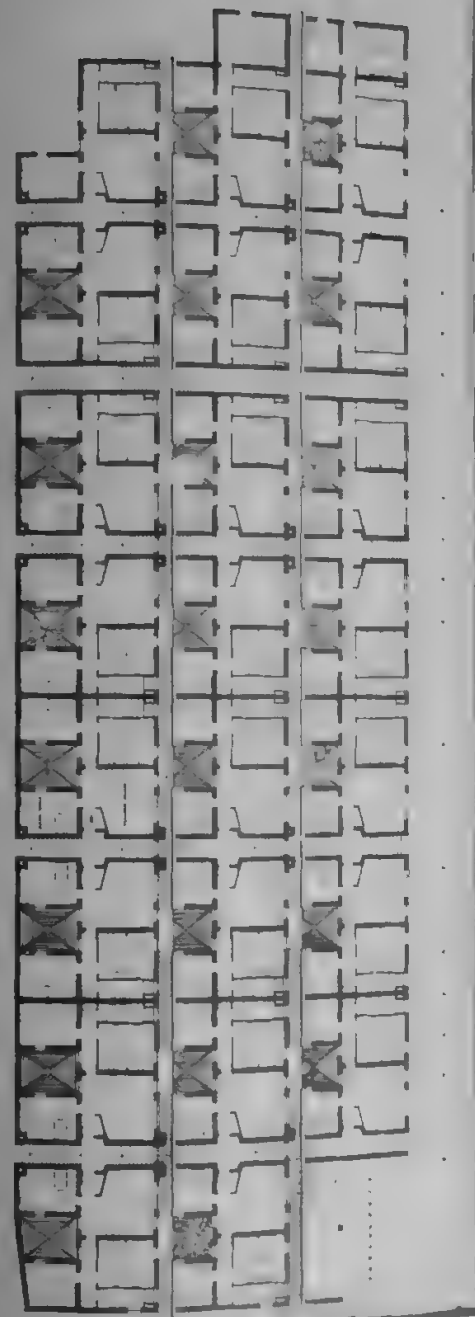

1. Planimetria -
2. Sezione - 3. Veduta dall'alto -
4. Sezione planimetrica - 5. Prospetto generale.

REGGIO EMILIA - NEBBIARA


Nucleo edilizio per Cooperativa

Settemari II

Questo piccolo nucleo, composto di abitazioni unifamiliari a schiera per cooperativa, sorge a 3 km. circa dal centro urbano in località Nebbiana. Si è qui ideata una composizione a largo respiro, con ampie zone condominiali di cui una a sud riservata al gioco dei bambini, a transito esclusivamente pedonale, chiusa da cancelli verso la strada laterale di servizio e verso il piazzale delle autorimesse.

Il nucleo si compone di soli tre fabbricati, a schiera, per complessivi 18 alloggi per 117 vani, ognuno dei quali è dotato di giardino privato di circa 170 mq. È stato previsto inoltre un fabbricato per centrale termica, lavanderia, deposito immondizie, per quadri elettrici e contatori, un altro fabbricato infine destinato ad automobili.

Tutto il complesso è realizzato in muratura a vista, ma negl' esterni che nell'interno del soggiorno, il tetto con copertura in tegole di tipo olandese.

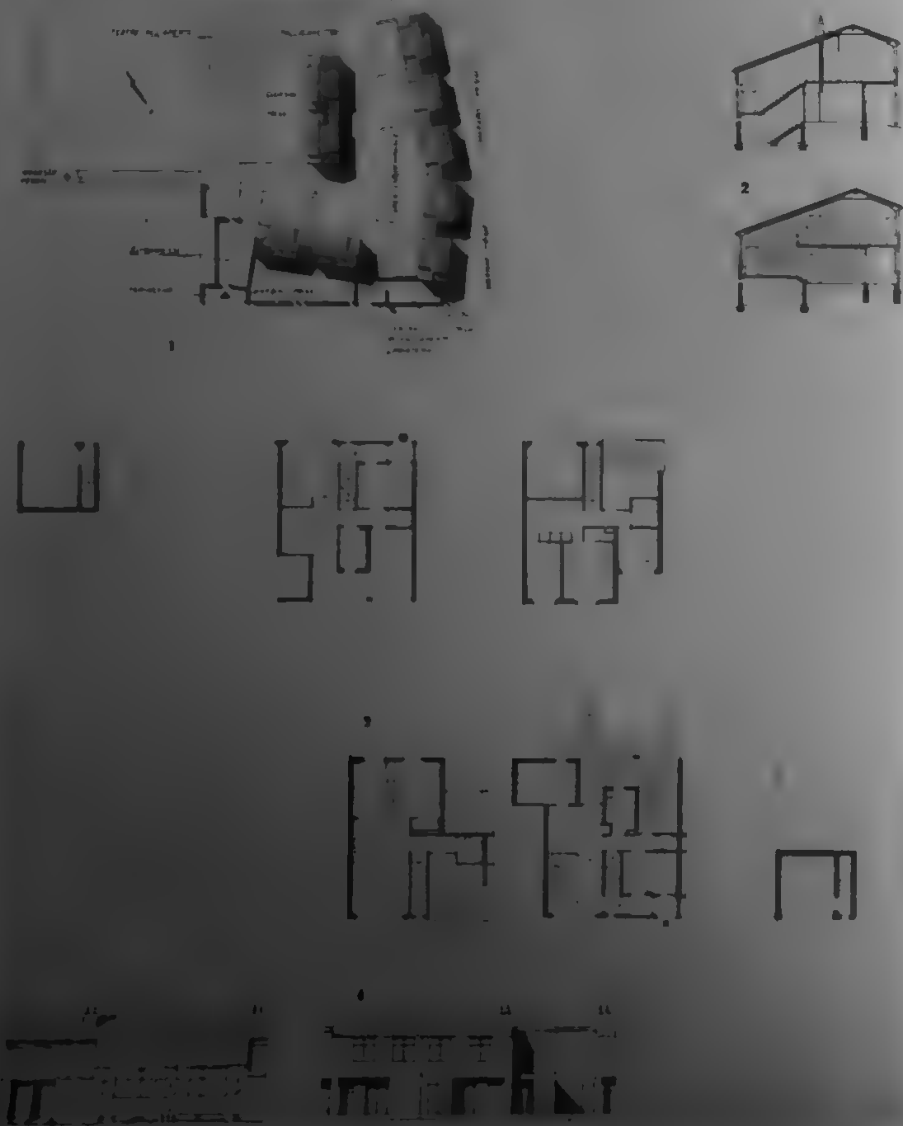

PROGETTAZIONE.

Coop. Architetti
e Ingegneri di
Reggio Emilia



1. Planimetria
del nucleo - 2.
Serzoni 3. Pian-
te delle schiere
a 6-7 vani - 4.
Prospetti - 5. Ve-
duta di una schie-
ra - 6. 7. Veduta
di due diversi
raggiorni - 8. Uno
spazio del nu-
cleo - 9. Il nu-
cleo visto dal-
l'ingresso pedoni

ROMA - S. MARINELLA

Unità edilizia per cooperativa

Settennio II

La cooperativa è costituita da due edifici adiacenti di 10 alloggi per 62 vani, di diversa distribuzione ma con caratteri architettonici analoghi, che sorgono su di un terreno adiacente alla ferrovia Roma-Pisa, con il lato nord sulla strada e un leggera pendenza verso est. La struttura portante in c.a. è lasciata in vista.



1. Vedute dei due edifici - 2. Prospetto - 3. Piano tipo.

PROGETTISTI:
Bruschi A.
Valeri M.


ROMA - TIVOLI

Nucleo edilizio « Villa Adriana »

Settennio II

PROGETTISTI:
Ridolfi M.
Capogruppo
Gabbiani V.
Malagrassi D.
Paladini V.
Ronaldi G.
Wolfgang F.

Il terreno a disposizione di 3,1 ha. è situato in prossimità del ed è orientato in modo che il complesso edilizio non sia Il complesso prevede la costruzione di 846 vani in 139 alloggi.

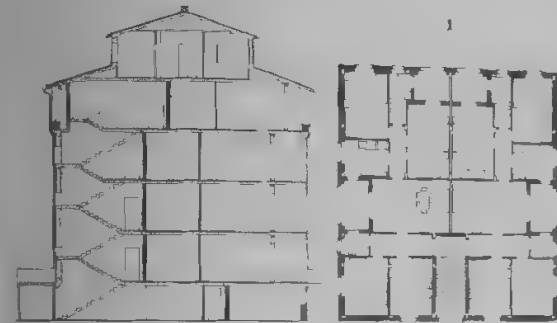

1. Pianta piano tipo, prospetto e sezione - 2. Planimetria.


SALERNO - VIETRI SUL MARE

Unità edilizia in Raito

Settembre 11


L'edificio a poche centinaia di metri dalla piccola frazione di Raito, sorge su terreno notevolmente scosceso in una delle zone più alte della costiera Amalfitana, aperto verso il panorama e completamente visibile dal mare.

La costruzione è costituita da un susseguirsi di piccoli volumi che si adagiano al terreno rispettando ogni suo movimento altimetrico: essa comprende 24 alloggi per complessivi 120 vani.

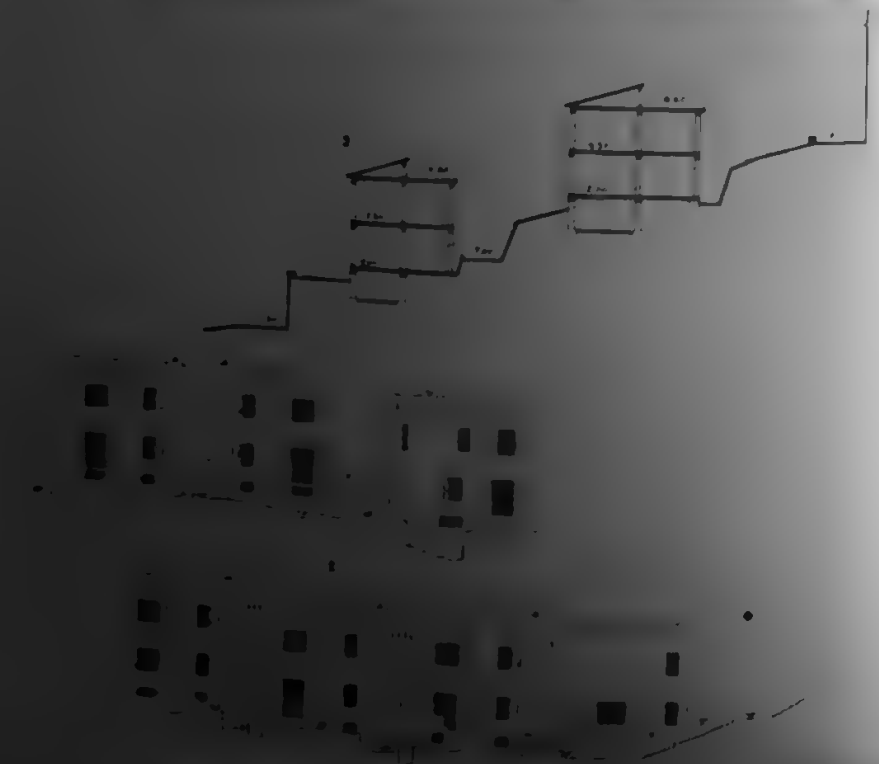

PROGETTISTI

Mezzetti F.
Capogruppo
Baruzzi U.
Crisci O.
Fredda A. M.
Pizzuti A.
Salvo F.

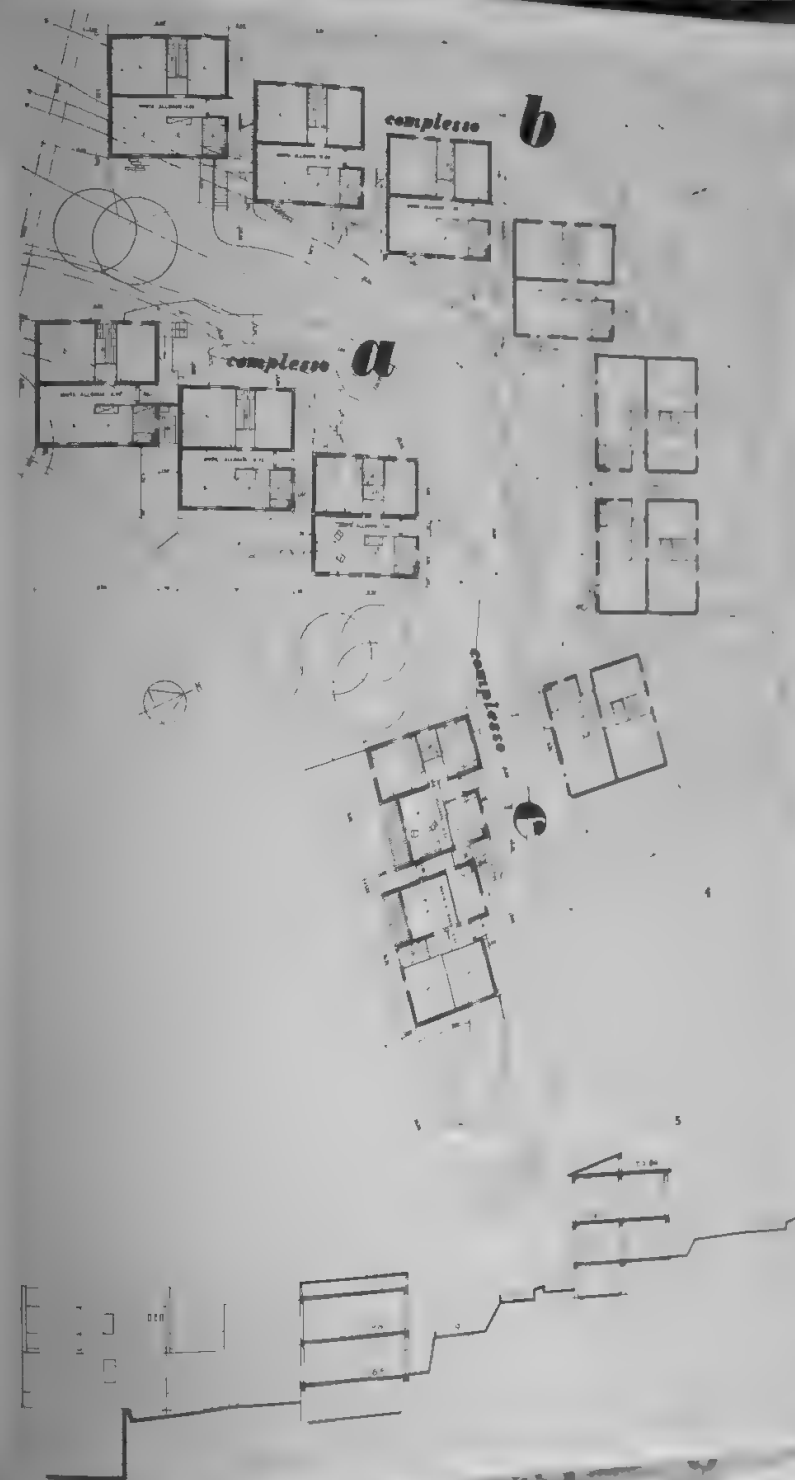


Profilo d'insieme - 2, 3. Prospetti e sezione trasversale - 4. Planimetria - 5. Sezione.

SALERNO

Unità edilizia a Positano

Settennio 11

L'unità edilizia è adagiata su terreno in forte pendio tipico della costiera Amalfitana: tale caratteristica è stata sfruttata inserendo 16 alloggi per un totale di 30 vani duplex a quote diverse.

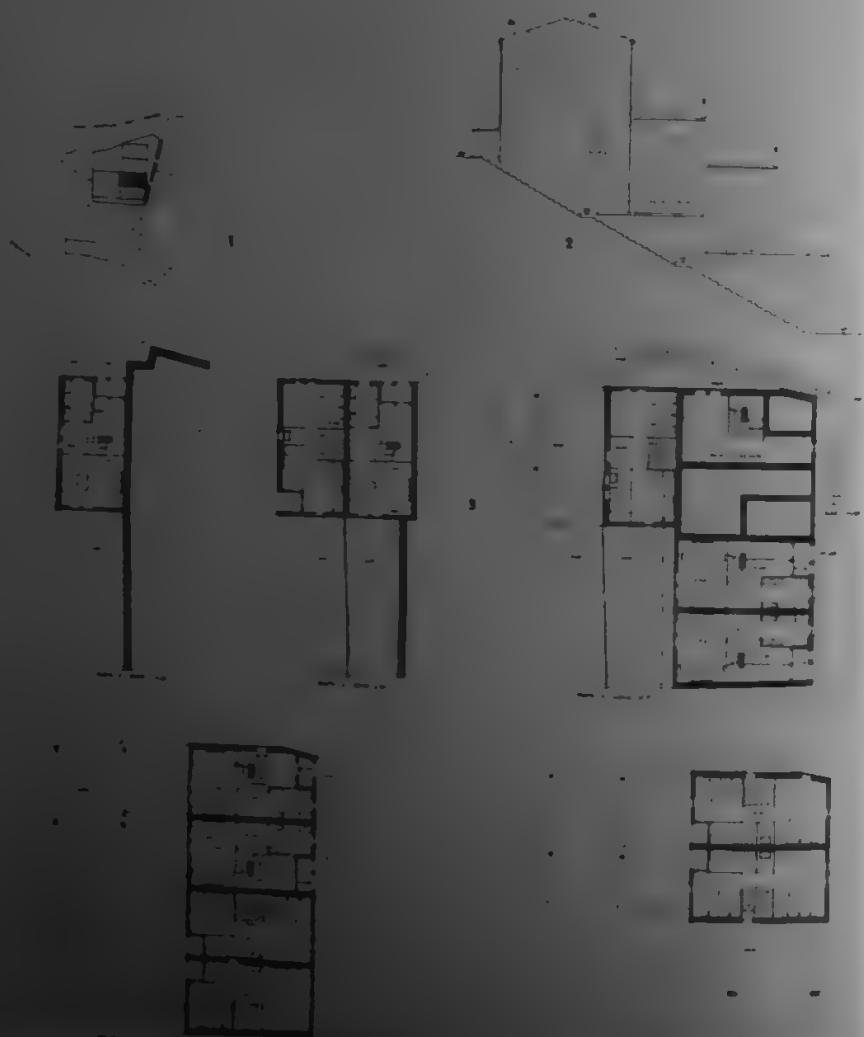

1. Planimetria dell'unità edilizia - 2. Prospetto aerea - 3. Sezione a pianta - 4. Veduta d'insieme del nucleo.

PROGETTISTI


Paciello S.
Capogruppo
Angrilli M.
Carputi U.
Cuccaro U.
Nunciata M.
Sfogli M.

TRENTO - ROVERETO

Nucleo edilizio « Cittadella »

Settennio 11

Il nucleo è ubicato nella zona di espansione a nord della città di Trento n. 12 e le pendici del Colle di Vallunga. I due tipi edilizi adottati: case a 3 piani e piccole case unifamiliari, a ventaglio, suggerito dalle curve di livello del terreno a forma di anfiteatro. In totale sono stati progettati 560 vani distribuiti in 102 alloggi.

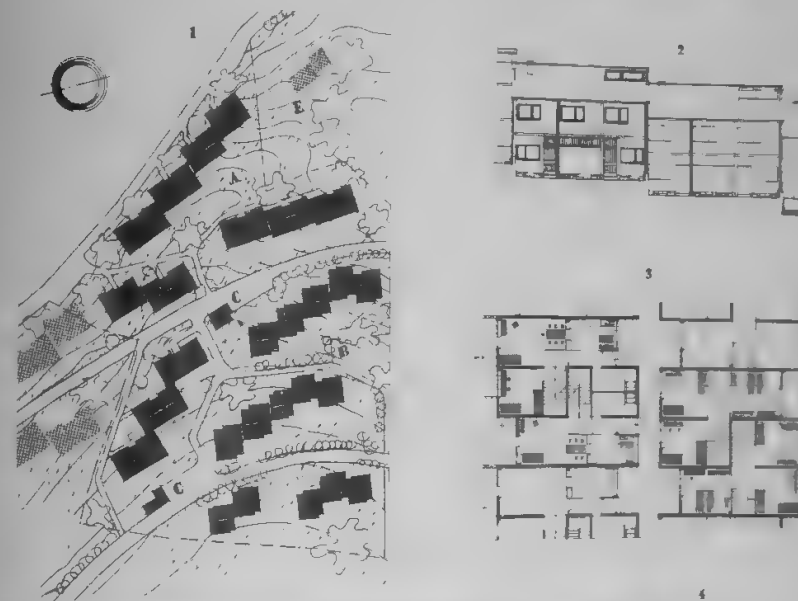

1. Planimetria generale - 2. Prospetto sugli ingressi - 3. Sezione a pianta - 4. Veduta d'insieme del nucleo.



TREVISO

Unità edilizia per cooperativa

Settennio II

Il fabbricato, di 9 alloggi e 57 vani, sorge in una zona ricca di verde, riservata all'edilizia popolare nella immediata periferia di Treviso. All'esterno sono state previste pannellature di mattoni a faccia vista, e fascioni di intonaco a rilievo attorno alle finestre. Le tinte usate oltre a quella rosso scuro dei mattoni, sono il bianco e il verde marcio.



1. Pianta piano tipo - 2. Il prospetto sulla strada.

TREVISO

Unità edilizia

Settennio I

L'edificio, di 14 alloggi per complessivi 77 vani, rispecchia le tipiche caratteristiche costruttive della piana veneta. Esso sorge alla periferia della città di Treviso, e consta di più corpi scala, nei quali si aprono alloggi a piani slahati. All'interno di essi un ulteriore stabilimento contribuisce a movimentare maggiormente l'edificio.



1. Pianta piano tipo - 2. Scorcio dalla strada.

PROGETTISTA:
Fontana R.

PROGETTISTI:
Ridolfi M.
Caporaso
Gabbani V.
Molegricci D.
Paladini V.
Rinaldi G.
Walzong F.

TREVISO - CONEGLIANO VENETO


Nucleo edilizio « strada vecchia Trevigiana »

Settennio II

Il terreno di forma trapezoidale, di 1,1 ha., presenta un forte declivio con dislivello a salire da nord a sud di oltre 5 m. ed ha la particolarità di offrire una visuale ampia in direzione ovest verso i monti. Da questo fattore è dipesa la scelta del tipo edilizio puntiforme a quattro e cinque piani, fatta eccezione per la casa con negozi ed appartamenti a tre piani, e l'uso di larghi spazi che si fondono con l'ambiente circostante ricco di verde. In totale sono previsti 50 alloggi per 275 vani.



1. Pianta piano tipo, piano terra e prospetto dell'edificio a tre piani - 2. Planimetria - 3. Pianta piano tipo e prospetto dell'edificio a due piani.

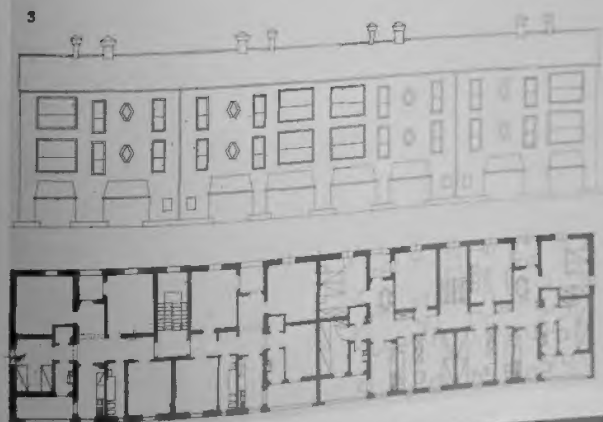

PROGETTISTA:
Tramontini A.

UDINE - PORDENONE

Nucleo edilizio « Noncello »

Settecento 11


Il complesso di 507 vani, pari ad alloggi 90, sorge in una zona prossima al centro della città di Pordenone, ai margini della espansione urbana, su un'area di 1,5 ha., elevata e aperta per due lati sulla verde valle del fiume Noncello e con un vastissimo orizzonte.

La particolare posizione del suolo a disposizione è stata perciò determinante per l'impostazione del progetto, non solo nella distribuzione planimetrica dei corpi di fabbrica, ma anche nella articolazione dei medesimi e nella stessa concezione dei singoli alloggi, tutti orientati verso determinati obiettivi di esposizione solare e di godimento del panorama.



PROGETTISTI

Brunetta G.
Capogruppo
Baroni G.
De Bisi A.
Malatesta S.
Marastutti G.
Scimeni G.

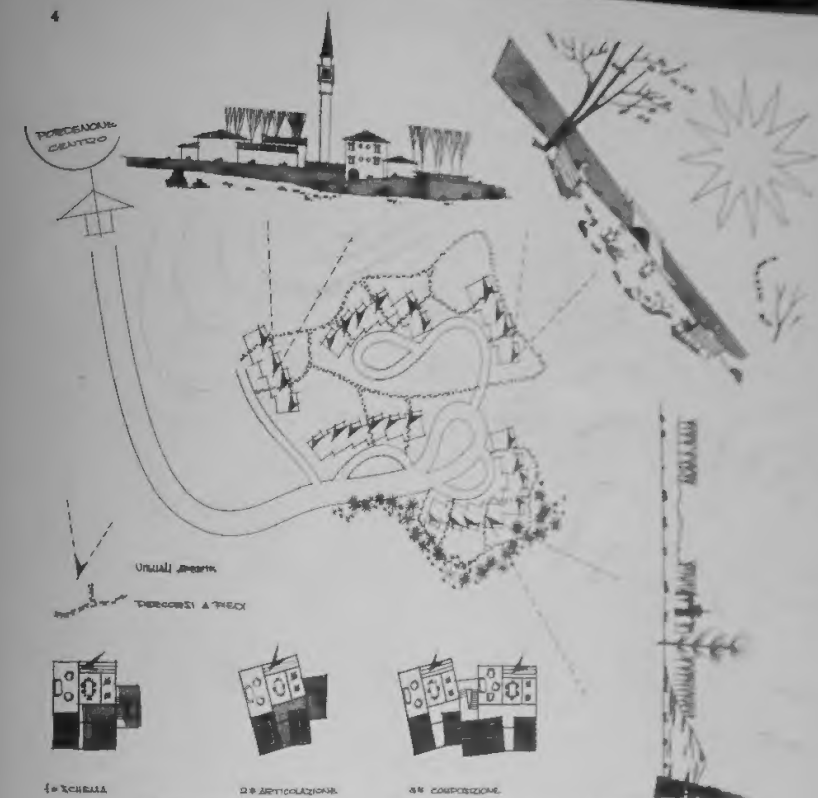

1. CHIESA

2. ARTICOLAZIONE


3. COMPOSIZIONE

1. Particolare architettonico - 2. Planimetria generale - 3. Veduta panoramica del complesso - 4. Studi preliminari al progetto - 5. Pianta piano tipo e prospetti della casa continua.



Settennio II

Il complesso edilizio sorge su un'area di mq. 6.700 soggetta a vincolo da parte della Sovrintendenza ai Monumenti e Belle Arti che ha limitato lo sfruttamento. Sono state adottate in prevalenza case a schiera, maggiormente gradite nella zona, mentre è stato previsto un certo numero di case multiple a 3 piani onde ottenere un incremento alla densità, per un totale di 250 vani.






PROGETTISTI:

Banderin A.
 Damaggio E.
 Damaggio G.
 Filippini F.
 Scarpa U.
 Sissa U.

1. Pianta del piano tipo e prospetto delle case in linea a tre piani - 2. Veduta d'insieme verso la laguna - 3. Scorcio di un edificio duplex - 4. Pianta e prospetti dell'edificio duplex.

Settennio I

L'edificio, per l'eccezionale sua ubicazione in zona vincolata anche dalla Sovrintendenza ai Monumenti, ha proposto un tema particolarmente impegnativo. L'edificio si adatta al paesaggio del lungomare veneziano ed alle abitudini peculiari degli abitanti, originariamente pescatori. Sono stati costruiti 10 alloggi per un totale di 50 vani.



PROGETTISTI:

Bernardi G.B.
 Capogruppo
 Giordano A.
 Lucarelli S.
 Teranico A.

1. Pianta piano tipo e prospetto e sezione trasversale.

Settennio II

L'edificio sorge su un'area destinata anche ad una futura espansione per l'edilizia popolare. Comprende 18 alloggi per complessivi 93 vani legali. Il basamento dell'edificio, costruito completamente in calcestruzzo, comprende cantine e deposito motore.



Modalità, procedure ed organizzazione dell'Inacasa

1. I piani tecnico-finanziari dei due Settenni e i piani annuali di ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale

La programmazione delle costruzioni si articolava in piani tecnico-finanziari della durata di 7 anni¹ ed in una ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

I criteri generali seguiti in materia sono stati già esposti, parlando dei « Caratteri della programmazione », a pag. 21.

a) I piani tecnico-finanziari ed i piani annuali delle costruzioni erano comunicati dal Comitato al Consiglio Direttivo della Gestione perché questa potesse provvedere alla loro esecuzione nei termini fissati². L'inizio di attuazione dei programmi annuali doveva avvenire, per il Primo Settennio, entro 90 giorni dall'approvazione di essi da parte del Ministro del Lavoro (art. 30 succitato). Per il Secondo Settennio è stato esplicitamente disposto l'obbligo dell'approvazione dei piani da parte del Ministro per renderli esecutivi³.

Nel Primo Settennio fu formulato anche un « piano iniziale » di immediata esecuzione⁴ che fu poi incorporato nel piano del primo anno.

I piani annuali — con i quali si regola l'attuazione nel tempo delle costruzioni — specificavano tutti gli Enti, Aziende e Cooperative incaricati delle costruzioni e, per ciascuno di essi, il numero degli alloggi da costruire ed il termine di inizio e di ultimazione delle costruzioni⁵.

I piani annuali del Secondo Settennio recavano anche le indicazioni relative alle costruzioni autorizzate su prenotazione⁶.

Il volume dei singoli piani era fissato in relazione alle competenze contributive dei singoli periodi di riferimento.

Per il completamento del Piano del Primo Settennio, fu formulato un piano di « assestamento finale » allo scopo di aggiornare le previsioni originarie in relazione alle variazioni intervenute sia nel gettito dei contributi sia nel valore degli indici del bisogno da adottarsi in base alla Legge.

Si sono anche impegnati — con l'approvazione del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — fondi afferenti ai piani posteriori al Settennio, considerando le costruzioni così realizzate come una anticipazione dei piani annuali previsti dall'art. 20 della Legge n. 43.

Anche nell'ambito del Secondo Settennio si dette luogo ad un Piano di « assestamento finale » e, per analoghe considerazioni alle quali si aggiunse l'opportunità di accogliere nella più larga misura possibile le richieste di prenotazione da parte di Cooperative (art. 8) e le iniziative delle Aziende, fu riconosciuto necessario anticipare l'impiego di fondi afferenti, come competenza contributiva, al periodo successivo al Secondo Settennio.

b) La ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale doveva essere fatta, per il Primo Settennio⁷, tenendo conto prima di tutto dell'importo dei contributi dei dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e datori di lavoro privati nonché dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distruzioni belliche.

Per il Secondo Settennio furono confermati i criteri di ripartizione vigenti per il Primo Settennio⁸, salvo prescrivere di tener conto dell'indice locale di disoccupazione anziché delle distruzioni belliche, ormai in gran parte sanate. Con l'art. 8 della stessa Legge veniva inoltre disposto che si eseguissero, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni su prenotazione (piani aggiuntivi) per un importo che non doveva superare il quarto (poi elevato a un terzo)⁹ delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario. Tanto nel Primo che nel Secondo Settennio si provide a ripartire in base ai criteri stabiliti dalla Legge le successive quote dei fondi disponibili, assegnando un contingente a ciascuna provincia e, nell'ambito di ogni provincia, a ciascun Comune incluso e innalzando di volta in volta i relativi stanziamenti nei Piani successivi.

Avendo ripartito con tale sistema la maggior parte dei fondi disponibili di ciascun Settennio, si provide poi a ripartire la rimanenza col nuovo « Piano di assestamento finale ». Con tale Piano la disponibilità complessiva di ciascun Settennio fu ripartita in base ad indici aggiornati del bisogno di alloggi fra le varie regioni, assegnando poi a ciascuna la differenza fra la quota così ottenuta e quella già assegnata in precedenza.

Riportiamo ora con la massima precisione possibile i criteri seguiti per la ripartizione dei fondi, scia-

¹ Legge 28 febbraio 1949, n. 43, art. 10; D.P.R. 4 luglio 1949, n. 436, art. 1; Legge 26 novembre 1955, n. 1148, art. 1, punto 1; D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, art. 4.

² D.P.R. 4 luglio 1949, n. 436, art. 30.

³ D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, art. 1.

⁴ Legge 28 febbraio 1949, n. 43, art. 4.

⁵ D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, art. 3; D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, art. 4.

⁶ Legge 26 novembre 1955, n. 1148, art. 8.

⁷ Legge 28 febbraio 1949, n. 43, art. 10.

⁸ Legge 26 novembre 1955, n. 1148, art. 1.

⁹ Legge 24 gennaio 1958, n. 19, art. 2.
